



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 211-2022

EMPENHO: 854 / 2023

Data do Empenho: 19/09/2023

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

### FORNECEDOR

Nome: 5398 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI  
 Endereço: TV SAO JOSE II, 55  
 Bairro: TIMBO  
 CNPJ: 21.450.165/0001-35 Insc. Estadual:  
 Conta Corrente: 39294-4 Agência: 3679

Cidade: ESPLANADA  
 CPF:  
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Tipo Pessoa: Jurídica  
 Complemento: GALPAO04  
 Estado: BA  
 RG:

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI	Nº Lic.: 007-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 267-2022	505.683,04	61.989,31	443.693,73
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO N°007-2022RDC, CONTRATO N°267-2022, REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO - 03, PERÍODO 01/08/2023 A 31/08/2023. NFS-e.N°130.

Data do Empenho: 19/09/2023

Data da Liquidação: 19/09/2023

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	743,87
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	1.859,68
2.1.8.8.3.01.02.00.00.123	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 90	4.091,29
## Cinquenta e cinco mil e duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos ##		Valor Retido
		6.694,84
		Valor Líquido
		55.294,47

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	14/09/2023	130	UN			61.989,31

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	61.989,31

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/09/2023.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/09/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Contador(a)  
Matrícula: 6408

3248379



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 211-2022

EMPENHO: 854 / 2023

Data do Empenho: 19/09/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

### FORNECEDOR

Nome: **5398 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**  
 Endereço: TV SAO JOSE II, 55  
 Bairro: TIMBO  
 CNPJ: 21.450.165/0001-35 Insc. Estadual:  
 Conta Corrente: 39294-4 Agência: 3679  
 Cidade: ESPLANADA  
 CPF:  
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
 Tipo Pessoa: Jurídica  
 Complemento: GALPA004  
 Estado: BA  
 RG:

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI	Nº Lic.: 007-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 267-2022	505.683,04	<b>61.989,31</b>	443.693,73
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº007-2022RDC, CONTRATO Nº267-2022.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	61.989,31	61.989,31

## Sixty and one thousand and nine hundred and eighty nine reais and thirty and one cents ##

61.989,31

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 19/09/2023.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 19/09/2023

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Diretor Contábil  
Matrícula: 6408

3248379

**Prefeitura Municipal de Esplanada**Praça Monsenhor Zacarias Luz, S/N  
Centro - Esplanada - BA CEP: 48370-000  
CNPJ: 13.885.231/0001-71**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**Número da Nota  
**00000130**Data e Hora de Emissão  
**14/09/2023 10:53:09**Data do Fato Gerador  
**14/09/2023**Código de Verificação  
**AAASEKCK-AUAEGH****Dados do(s) Serviço(s)**Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação  
**Exigível**Local da Prestação  
**SANTALUZ/BA - BRASIL**Local da Incidência  
**SANTALUZ/BA****Prestador do(s) Serviço(s)**Nome/Razão Social: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**  
Nome Fantasia: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS**  
Endereço: **TRV SÃO JOSE II, 316 GALPÃO 04  
TIMBO ESPLANADA - BA CEP: 48370-000**  
CPF/CNPJ: **21.450.165/0001-35** Insc. Municipal: **2721**  
Telefone: **(71) 9.9642-1002** E-mail: **STARTSOLUCOESINTEGRADAS@GMAIL.COM****Tomador do(s) Serviço(s)**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SANTALUZ**  
Nome Fantasia:  
Endereço: **PRAÇA CORONEL JOSE LEITAO, 05 TERREO  
CENTRO SANTALUZ - BA CEP: 48880-000**  
CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19** Insc. Municipal:  
Telefone: E-mail:**Discriminação do(s) Serviço(s)**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICIPIO DE SANTALUZ.

OBRA Nº 055/2022  
RDC Nº007/2022  
CONTRATO Nº 267/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 211/2022  
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 03 / PERÍODO - 01/08/2023 A 31/08/2023VALOR TOTAL= R\$ 61.989,31  
MÃO DE OBRA 60% R\$ 37.193,59  
MATERIAL 40% R\$ 24.795,72BASE DE CÁLCULO DO INSS 11% X R\$ 37.193,59 = R\$ 4.091,29  
VALOR DO ISS 5% X R\$ = R\$ 1.859,68  
BASE DE CALCULO IR 1.2% = R\$ 743,87

BRADESCO AG:3679 / Cc:39.294-4

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)  
EM 14/09/2023 Tony Felix Andrade  
Assinatura**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

**07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c**  
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)**4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente**

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
<b>61.989,31</b>	<b>24.795,72</b>	<b>0,00</b>	<b>37.193,59</b>
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Retenções Federais</b>			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
<b>743,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		INSS	Outras Retenções
		<b>4.091,29</b>	<b>0,00</b>

**Total**

Total do(s) Serviço(s)

**61.989,31**

Total Líquido

**55.294,47****Outras Informações**O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (MUNICIPIO DE SANTALUZ) através de substituição tributária  
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)  
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 11.437,03 - (18,45%) - Fonte: IBPT

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 363101		CONTRIBUINTE 31069 - START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI			INSCRIÇÃO:		
TIPO / NOME LOGRADOURO: SÃO JOSÉ II, 316 GALPÃO 04					NÚMERO: 04		
COMPLEMENTO:		BAIRRO: TIMBO		MUNICÍPIO: ESPLANADA		UF: BA	
DOCUMENTOS							
C.N.P.J. / CPF: 21.450.165/0001-35			R.G.:		ORGÃO		
TOMADOR							
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO							
Base Cálculo:	Alíquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:			
61.989,31	3,000	1.859,68		1.859,68			
DADOS PARA PAGAMENTO							
DATA LANÇAMENTO: 30/09/2023		MÊS REFERÊNCIA: Setembro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 21/09/2023 03:12:07	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2023		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NFS-e Nº 130 - DATA DE EMISSÃO: 14/09/2023				(-) VALOR DEVIDO - R\$		1.859,68	
				(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
				(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
				(+ ) MULTA DE MORA - R\$			
				(+ ) JUROS DE MORA - R\$			
				(=) VALOR A PAGAR - R\$		1.859,68	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8175000018 . 4	59683906202 . 0	30930010500 . 9	00036310112 . 2
----------------	-----------------	-----------------	-----------------

### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO

VIA CONTRIBUINTE



8175000018 . 4	59683906202 . 0	30930010500 . 9	00036310112 . 2
----------------	-----------------	-----------------	-----------------

**ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
 13.807.870/0001-19  
 PRAÇA DO TANQUE GRANDE

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Setembro	Nº DAM: 363101	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 21/09/2023 03:12:07	DATA VENCIMENTO: 30/09/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.859,68
START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.859,68



Versão: Jasper 2,0,1,C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO

Nº DAM: 363102		CONTRIBUINTE 31069 - START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI		INSCRIÇÃO: 31069	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Tv SÃO JOSÉ II, 316 GALPÃO 04				NÚMERO: 04	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: TIMBO		MUNICÍPIO: ESPLANADA	
C.P.F.:		R.G.:		ORGÃO	
				C.N.P.J.: 21,450,165/0001-35	
DOCUMENTOS					
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433		ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 743,87		Quantidade/Alíquota (%): 1,000		Valor UFFM: 1,000	
				Valor R\$: 743,87	
				Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 743,87	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 21/09/2023		PARCELA: 1/1		EXERCÍCIO 2023	
				DATA EMISSÃO: 21/09/2023 03:13:54	
				DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2023	
Composição do Imposto/Lançamentos		Valor do Tributo: 743,87		Vr. Devido sem Desconto (VD): 743,87	
Taxa de Expediente:		Vr. do Desconto: 0,00		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Valor de Base Cálculo: 743,87		Vr. Devido com Desconto: 743,87		(+/-) VALOR A PAGAR - R\$	
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento; 4) NFS-e Nº 0130 - Data de emissão: 14/09/2023.				(+/-) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
				(+/-) MULTA DE MORA - R\$	
				(+/-) JUROS DE MORA - R\$	
				(+/-) VALOR A PAGAR - R\$ 743,87	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8176000007 . 6    43873906202 . 6    30930010100 . 8    00036310207 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO

VIA CONTRIBUINTE



8176000007 . 6    43873906202 . 6    30930010100 . 8    00036310207 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2023



PARCELA: 1/1		Nº DAM: 363102		EXERCÍCIO 2023	
				DATA EMISSÃO: 21/09/2023 03:13:54	
				DATA VENCIMENTO: 30/09/2023	
INSCRIÇÃO: 31069				(-) VALOR DEVIDO - R\$ 743,87	
START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI				(-) VALOR A PAGAR - R\$ 743,87	





Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE

OBRA Nº 055/2022  
RDC Nº 007/2022  
Nº DO CONTRATO: 267/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 211/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/10/2022 a 31/03/2023  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA  
EMPRESA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI  
CNPJ: 21.450.165/0001-35  
VALOR DA 3ª MEDIÇÃO R\$ 61.989,31

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 03		ACUMULADO	PREÇO TOTAL	SALDO	%
						QUANT.	PREÇO TOTAL				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Piçca de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	6,00	R\$ 425,54	R\$ 2.553,24	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 2.553,24	0,00	0,39%
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	17,80	R\$ 55,60	R\$ 989,68	0,00	R\$ 0,00	17,80	R\$ 989,68	0,00	0,15%
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3X(KM)). AF_07/2020	M3XKM	178,00	R\$ 7,62	R\$ 1.356,36	0,00	R\$ 0,00	178,00	R\$ 1.356,36	0,00	0,21%
1.4	Demolição de alvenaria de pedra	M³	0,50	R\$ 76,42	R\$ 38,21	0,00	R\$ 0,00	0,50	R\$ 38,21	0,00	0,01%
2.0	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	47,92	R\$ 7,43	R\$ 356,04	0,00	R\$ 0,00	47,92	R\$ 356,04	0,00	0,05%
2.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	47,92	R\$ 3,45	R\$ 165,32	0,00	R\$ 0,00	47,92	R\$ 165,32	0,00	0,03%
2.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M²	984,70	R\$ 3,07	R\$ 3.023,02	0,00	R\$ 0,00	984,70	R\$ 3.023,02	0,00	0,46%
2.2	sub total				R\$ 8.481,87						
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	R\$ 151,69	R\$ 9.705,16	16,00	R\$ 2.427,04	40,00	R\$ 6.967,60	3640,56	1,48%
3.0	sub total				R\$ 9.705,16						
	SISTEMA DE VEDAÇÃO										
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	581,69	R\$ 57,33	R\$ 33.882,03	0,00	R\$ 0,00	581,69	R\$ 33.882,03	0,00	5,16%
3.2	Pingadeira de concreto pré-moldado	M	115,15	R\$ 60,27	R\$ 6.940,09	0,00	R\$ 0,00	115,15	R\$ 6.940,09	0,00	1,06%
3.3	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	M²	12,24	R\$ 104,76	R\$ 1.282,26	0,00	R\$ 0,00	12,24	R\$ 1.282,26	0,00	0,20%
	sub total				R\$ 42.104,38						
4.0	ESQUADRIAS										
	PORTAS										
4.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 943,01	R\$ 1.886,02	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 1.886,02	0,00	0,29%

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.0659.617.8

IAGO R S BORBA  
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

4.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	R\$ 850,89	R\$ 7.658,91	4,00	R\$ 3.403,96	9,00	R\$ 7.658,91	0,00	1,17%
	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 825,03	R\$ 825,03	1,00	R\$ 825,03	1,00	R\$ 825,03	0,00	0,13%
4.3	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALZAR. AF_12/2019	MF	31,34	R\$ 518,63	R\$ 16.253,86	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	16253,86	2,47%
4.4	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	MF	13,68	R\$ 639,91	R\$ 7.385,96	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	7385,96	1,12%
	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	R\$ 167,95	R\$ 2.015,40	5,00	R\$ 839,75	12,00	R\$ 2.015,40	0,00	0,31%
	Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular - Rev.03	UN	24,00	R\$ 5,00	R\$ 120,00	0,00	R\$ 0,00	14,00	R\$ 70,00	50,00	0,02%
5.0	Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2")	UN	12,00	R\$ 44,32	R\$ 531,84	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	531,84	0,08%
5.1	sub total				R\$ 36.677,02						
	JANELAS										
5.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	MF	34,46	R\$ 248,56	R\$ 8.565,37	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	8565,37	1,30%
5.3	sub total				R\$ 8.565,37						
	SOLEIRAS, VERGAS E CONTRA VERGAS										
5.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	79,64	R\$ 38,38	R\$ 3.056,58	0,00	R\$ 0,00	79,64	R\$ 3.056,58	0,00	0,47%
5.5	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	79,64	R\$ 46,90	R\$ 3.735,11	0,00	R\$ 0,00	79,64	R\$ 3.735,11	0,00	0,57%
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,67	R\$ 50,37	R\$ 537,44	0,00	R\$ 0,00	10,67	R\$ 537,44	0,00	0,08%
5.6	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	19,60	R\$ 73,90	R\$ 1.448,44	19,60	R\$ 1.448,44	19,60	R\$ 1.448,44	0,00	0,22%
5.7	sub total				R\$ 6.777,57						
	GRADIL										
5.8	GRADIL TIPO MORLAN	m²	41,80	R\$ 336,53	R\$ 14.066,95	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	14066,95	2,14%
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	83,60	R\$ 23,94	R\$ 2.001,38	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2001,38	0,30%
5.9	PORTÃO PARA GRADIL TIPO MORLAN	m²	4,46	R\$ 541,96	R\$ 2.394,25	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2394,25	0,36%
	sub total				R\$ 18.452,55						

Tony Félix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8





7.1	PISOS INTERNO E EXTERNO																			
	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	M²	115,00	R\$ 45,10		R\$ 5.186,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	5186,50	0,79%								
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	412,85	R\$ 70,94		R\$ 29.287,57	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	29287,57	4,48%								
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	55,00	R\$ 42,57		R\$ 2.341,35	55,00	R\$ 2.341,35	55,00	R\$ 2.341,35	0,00	0,36%								
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMI E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M²	109,66	R\$ 44,44		R\$ 4.873,29	109,66	R\$ 4.873,29	109,66	R\$ 4.873,29	0,00	0,74%								
	Greilha em barras de ferro de 1/2", cruzadas, espaçamento 5cm	M²	25,70	R\$ 747,02		R\$ 19.198,41	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	19198,41	2,92%								
	<b>sub total</b>					<b>R\$ 68.887,12</b>														
	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>																			
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M³	3,14	R\$ 129,90		R\$ 407,88	0,00	R\$ 0,00	3,14	R\$ 407,88	0,00	0,06%								
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M³	4,48	R\$ 98,12		R\$ 444,05	0,00	R\$ 0,00	4,48	R\$ 444,05	0,00	0,07%								
	ÂTERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	196,80	R\$ 102,63		R\$ 20.197,58	0,00	R\$ 0,00	196,80	R\$ 20.197,58	0,00	3,07%								
	<b>sub total</b>					<b>R\$ 21.049,51</b>														
	<b>ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO</b>																			
	<b>INFRAESTRUTURA</b>																			
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	4,00	R\$ 405,87		R\$ 1.623,48	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 1.623,48	0,00	0,25%								
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	4,74	R\$ 2.531,34		R\$ 11.988,55	0,00	R\$ 0,00	4,74	R\$ 11.988,55	0,00	1,83%								
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	72,38	R\$ 48,24		R\$ 3.481,61	0,00	R\$ 0,00	72,38	R\$ 3.481,61	0,00	0,53%								
	<b>sub total</b>					<b>R\$ 17.113,64</b>														
	<b>SUPERESTRUTURA</b>																			
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	8,97	R\$ 2.531,34		R\$ 22.706,11	0,00	R\$ 0,00	8,97	R\$ 22.706,11	0,00	3,45%								
	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	M²	17,85	R\$ 137,57		R\$ 2.455,62	0,00	R\$ 0,00	17,85	R\$ 2.455,62	0,00	0,37%								
	<b>sub total</b>					<b>R\$ 25.161,73</b>														
	<b>PINTURA</b>																			
	Preparo de superfície com livramento de paredes e tetos	M²	974,07	R\$ 3,68		R\$ 3.584,57	600,00	R\$ 2.208,00	1.031,24	R\$ 3.794,96	-210,39	0,55%								

**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	MP	754,07	R\$ 3,32	R\$ 2.503,51	500,00	R\$ 1.660,00	930,00	R\$ 3.087,60	-584,08	0,38%
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	MP	754,07	R\$ 12,15	R\$ 9.161,95	500,00	R\$ 6.075,00	800,00	R\$ 9.720,00	-558,05	1,39%
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	MP	974,07	R\$ 15,31	R\$ 14.913,01	250,00	R\$ 3.827,50	250,00	R\$ 3.827,50	11085,51	2,27%
sub total				R\$ 30.163,04						
<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>										
Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	UN	22,00	R\$ 123,65	R\$ 2.720,52	0,00	R\$ 0,00	22,00	R\$ 2.720,52	0,00	0,41%
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	M	10,00	R\$ 15,28	R\$ 152,80	0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 152,80	0,00	0,02%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00	R\$ 10,03	R\$ 220,66	0,00	R\$ 0,00	22,00	R\$ 220,66	0,00	0,03%
Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	UN	10,00	R\$ 5,67	R\$ 56,70	0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 56,70	0,00	0,01%
Té 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	10,00	R\$ 10,41	R\$ 104,10	0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 104,10	0,00	0,02%
sub total				R\$ 3.254,78						
<b>ESGOTO</b>										
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	11,00	R\$ 82,05	R\$ 902,66	0,00	R\$ 0,00	11,00	R\$ 902,66	0,00	0,14%
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	PT	7,00	R\$ 128,40	R\$ 898,80	0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 898,80	0,00	0,14%
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIA, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	40,00	R\$ 24,15	R\$ 966,00	0,00	R\$ 0,00	40,00	R\$ 966,00	0,00	0,15%
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 32,94	R\$ 164,70	0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 164,70	0,00	0,03%
sub total				R\$ 2.832,16						
<b>ACESSÓRIOS</b>										
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 339,94	R\$ 679,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	679,88	0,10%
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") PARA DRENO DO AR CONDICIONADO	M	95,00	R\$ 6,23	R\$ 591,85	95,00	R\$ 591,85	95,00	R\$ 591,85	0,00	0,09%
Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	MP	51,56	R\$ 532,44	R\$ 27.452,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	27452,60	4,18%
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 339,89	R\$ 679,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	679,88	0,10%
Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx. descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	UN	1,00	R\$ 423,68	R\$ 423,68	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	423,68	0,06%
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UM	2,00	R\$ 485,12	R\$ 970,24	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	970,24	0,15%
VASO SANITÁRIO INFANTIL, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 484,74	R\$ 1.938,96	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1938,96	0,30%
Pia de cozinha com barcada em aço inox, dim 1.60x0.60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	UN	1,00	R\$ 979,73	R\$ 979,73	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	979,73	0,15%

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UM	2,00	R\$ 405,14	R\$ 810,28	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 810,28	0,12%
Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	UM	2,00	R\$ 992,96	R\$ 1.787,92	2,00	R\$ 1.787,92	2,00	R\$ 1.787,92	R\$ 1.787,92	0,27%
Bancada de mármore branco	MF	1,20	R\$ 324,93	R\$ 389,91	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 389,91	0,06%
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,25x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	UN	1,00	R\$ 1.638,12	R\$ 1.638,12	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.638,12	0,25%
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 91,18	R\$ 638,26	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 638,26	0,10%
sub total				R\$ 38.381,31						
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	309,80	R\$ 3,07	R\$ 961,06	0,00	R\$ 0,00	309,80	R\$ 0,00	R\$ 961,06	0,14%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	462,00	R\$ 4,44	R\$ 2.051,28	0,00	R\$ 0,00	462,00	R\$ 0,00	R\$ 2.051,28	0,31%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	120,00	R\$ 11,95	R\$ 1.434,00	60,00	R\$ 717,00	120,00	R\$ 1.434,00	0,00	0,22%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	382,75	R\$ 7,27	R\$ 2.782,59	182,75	R\$ 1.328,59	382,75	R\$ 2.782,59	0,00	0,42%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 12,04	R\$ 24,08	2,00	R\$ 24,08	2,00	R\$ 24,08	0,00	0,00%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	R\$ 12,67	R\$ 139,37	11,00	R\$ 139,37	11,00	R\$ 139,37	0,00	0,02%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 15,38	R\$ 30,76	2,00	R\$ 30,76	2,00	R\$ 30,76	0,00	0,00%
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	UN	11,00	R\$ 89,31	R\$ 751,41	11,00	R\$ 751,41	11,00	R\$ 751,41	0,00	0,11%
Disjuntor termomagnético monopolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA	UN	1,00	R\$ 105,83	R\$ 105,83	1,00	R\$ 105,83	1,00	R\$ 105,83	0,00	0,02%
Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	UN	1,00	R\$ 222,52	R\$ 222,52	1,00	R\$ 222,52	1,00	R\$ 222,52	0,00	0,03%
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UN	1,00	R\$ 550,90	R\$ 550,90	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 550,90	0,00	0,08%
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	R\$ 39,00	R\$ 663,00	17,00	R\$ 663,00	17,00	R\$ 663,00	0,00	0,10%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	R\$ 26,06	R\$ 469,08	18,00	R\$ 469,08	18,00	R\$ 469,08	0,00	0,07%
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	R\$ 41,23	R\$ 288,61	7,00	R\$ 288,61	7,00	R\$ 288,61	0,00	0,04%
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 29,78	R\$ 89,34	3,00	R\$ 89,34	3,00	R\$ 89,34	0,00	0,01%


  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

  
 IAGO R S BORBA  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	UN	28,00	R\$ 14,17	R\$ 386,76	0,00	R\$ 0,00	28,00	R\$ 386,76	0,00	0,05%
Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa	UN	17,00	R\$ 24,20	R\$ 411,40	0,00	R\$ 0,00	17,00	R\$ 411,40	0,00	0,05%
Quadro de medição trifásica em Norli com lente para leitura	UN	1,00	R\$ 765,45	R\$ 765,45	1,00	R\$ 765,45	1,00	R\$ 765,45	0,00	0,12%
Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	UN	37,00	R\$ 103,68	R\$ 3.836,16	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3636,16	0,58%
Luminária plafonier, sobrepor, em alumínio, com difusor em vidro, p/lampada eletrônica, ref. XP-338, da Xoulux ou similar, completa	UN	3,00	R\$ 138,73	R\$ 418,19	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	418,19	0,06%
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00	R\$ 12,24	R\$ 4.284,00	0,00	R\$ 0,00	700,00	R\$ 8.568,00	-4284,00	0,65%
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 154,94	R\$ 154,94	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 154,94	0,00	0,02%
sub total										
<b>BANCOS, CANTEIROS E BRINQUEDOS</b>										
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M²	0,30	R\$ 83,42	R\$ 25,02	0,00	R\$ 0,00	0,30	R\$ 25,02	0,00	0,00%
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	1,02	R\$ 405,87	R\$ 413,98	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	413,98	0,06%
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M³	4,08	R\$ 57,33	R\$ 233,90	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	233,90	0,04%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	8,16	R\$ 9,01	R\$ 73,52	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	73,52	0,01%
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	8,16	R\$ 26,02	R\$ 212,32	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	212,32	0,03%
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	8,16	R\$ 15,31	R\$ 124,92	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	124,92	0,02%
Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	M²	15,00	R\$ 18,02	R\$ 270,30	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	270,30	0,04%
Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	UN	10,00	R\$ 20,14	R\$ 201,40	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	201,40	0,03%
Planta - Pala de vaca (bauhinia forficata), h=2,00m, fornecimento e plantio	UN	3,00	R\$ 167,74	R\$ 503,22	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	503,22	0,08%
Planta - Croton, fornecimento e plantio	UN	2,00	R\$ 6,89	R\$ 13,98	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	13,98	0,00%
Medeiramento em massaranduba/madeira de lei, serrada 2,5cm x 10cm	M	25,00	R\$ 22,99	R\$ 574,75	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	574,75	0,09%
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	M²	12,38	R\$ 89,70	R\$ 1.110,48	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1.110,48	0,17%
Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M²	123,82	R\$ 21,34	R\$ 2.642,31	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2.642,31	0,40%
sub total										

<b>RAMPA</b>										
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	17,60	R\$ 101,40	R\$ 1.764,64	17,60	R\$ 1.764,64	17,60	R\$ 1.764,64	0,00	0,27%
Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1,1/2" - Rev 02	M	21,53	R\$ 245,15	R\$ 5.278,07	0,00	R\$ 5.278,07	0,00	R\$ 5.278,07	0,00%	0,60%
<b>sub total</b>				<b>R\$ 7.062,71</b>						
<b>BRINQUEDOS</b>										
Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	UN	1,00	R\$ 12.871,18	R\$ 12.871,18	0,00	R\$ 12.871,18	0,00	R\$ 12.871,18	0,00	1,96%
Brinquedo - Gargorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	UN	1,00	R\$ 1.863,37	R\$ 1.863,37	0,00	R\$ 1.863,37	0,00	R\$ 1.863,37	0,00	0,28%
<b>sub total</b>				<b>R\$ 14.734,55</b>						
<b>RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO</b>										
RESERVATÓRIO EM POLICARBONATO DE 15000 LITROS	UN	1,00	R\$ 10.666,41	R\$ 10.666,41	1,00	R\$ 10.666,41	1,00	R\$ 10.666,41	0,00	1,62%
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÁOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M²	42,00	R\$ 124,30	R\$ 5.220,60	0,00	R\$ 5.220,60	42,00	R\$ 5.220,60	0,00	0,79%
Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	M³	1,23	R\$ 603,60	R\$ 742,42	0,73	R\$ 440,63	1,23	R\$ 742,42	0,00	0,11%
Laje pré-fabricada itelizada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M²	12,25	R\$ 204,28	R\$ 2.502,43	12,25	R\$ 2.502,43	12,25	R\$ 2.502,43	0,00	0,39%
<b>BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020</b>	UN	1,00	R\$ 827,58	R\$ 827,58	1,00	R\$ 827,58	1,00	R\$ 827,58	0,00	0,13%
<b>sub total</b>				<b>R\$ 19.959,44</b>						
<b>SERVIÇOS FINAIS</b>										
Limpeza geral	M²	921,07	R\$ 2,33	R\$ 2.146,09	0,00	R\$ 2.146,09	0,00	R\$ 2.146,09	0,00	0,33%
Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,60 m	UN	1,00	R\$ 1.848,77	R\$ 1.848,77	0,00	R\$ 1.848,77	0,00	R\$ 1.848,77	0,00	0,28%
<b>sub total</b>				<b>R\$ 3.994,86</b>						
<b>Total</b>				<b>R\$ 657.201,32</b>		<b>R\$ 671.389,31</b>		<b>R\$ 310.417,67</b>	<b>R\$ 346.783,65</b>	<b>52,77%</b>

Tony Félix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8

IAGO R S BORBA  
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.450.165/0001-35  
**Razão Social:** START SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** TV SAO JOSE II 55 GALPAO 04 / TIMBO / ESPLANADA / BA / 48370-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Certificação Número:** 2023090109571288255376

Informação obtida em 01/09/2023 12:11:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.450.165/0001-35

Certidão n°: 32390630/2023

Expedição: 04/07/2023, às 11:41:34

Validade: 31/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.450.165/0001-35, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**Prefeitura Municipal de Esplanada**

**Secretaria de Administração**

Praça Monsenhor Zacarias Luz, S/N

Centro - Esplanada - BA CEP: 48370-000

CNPJ: 13.885.231/0001-71

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000397/2023.E

Nome/Razão Social: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**  
Nome Fantasia: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS**  
Inscrição Municipal: **2721** CPF/CNPJ: **21.450.165/0001-35**  
Endereço: **TRV SÃO JOSE II, 316 GALPÃO 04**  
**TIMBO ESPLANADA - BA CEP: 48370-000**

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Esta certidão foi emitida em 18/08/2023 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **17/09/2023**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **9600008773250000399325030000397202308180**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://esplanada.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA**  
Setor de Tributos e Rendas Imobiliárias  
Praça Monsenhor Zacarias Luz S/N Centro Administrativo - Centro  
ESPLANADA - BA - CEP: 48370-000  
FONE(S): 75-3413-7500/ Ramal 7520 CNPJ/MF: 13.885.231/0001-71

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 000203/2023

Nome/Razão Social: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**  
Nome Fantasia: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS**  
Inscrição Municipal: **2721** CPF/CNPJ: **21.450.165/0001-35**  
Endereço: **TRV SÃO JOSE II, 316 GALPÃO 04 TIMBO**  
**ESPLANADA - BA - CEP: 48370-000**

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.**

Observação:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Esta Certidão foi emitida em 18/09/2023 com base no Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66.

Certidão válida até: **18/10/2023**

Código de controle da certidão: **8100076101**



Emissor: PAULO

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**  
**CNPJ: 21.450.165/0001-35**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:53:38 do dia 10/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2024.

Código de controle da certidão: **8CD0.0EB5.4B05.9E6C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20234981128**

RAZÃO SOCIAL	
<b>START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>121.094.436 - BAIXADO</b>	<b>21.450.165/0001-35</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/09/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/ OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/09/2023 16:39:11.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo K8OLHY2Ftmp00000.SFP é:

f35f62ed-c840-4f4c-9df1-460758e69fa4

Transmissor: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135

Inscrição do Transmissor: 21450165000135

Responsável: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRE

Inscrição do Responsável: 78453046549

Competência: 08/2023

NRA: K8OLHY2Ftmp00000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO DE SOUZA

Telefone: 007196421002

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	21.450.165/0001-35
<b>Nome</b>	START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
<b>Período de apuração</b>	08/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	56816185 / Reinf CP 21726195219 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 1.413,33	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 3.313,36	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 492,55	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 84,40	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 5.303,64	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	RÓDRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
<b>CPF</b>	784.530.465-49
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	14/09/2023 15:46:57
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000162809821

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	<b>CNPJ</b>	21.450.165/0001-35
<b>Período apuração</b>	08/2023	<b>Número do Recibo</b>	50000162809821
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	14/09/2023 15:46:57	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	56816185 / Reinf CP 21726195219 / eSocial

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	99-Pessoas Jurídicas em Geral
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	SAO JOSE II	<b>Número</b>	55
<b>Complemento</b>	GALPAO04	<b>Bairro/Distrito</b>	TIMBO
<b>Município</b>	Esplanada	<b>UF</b>	BA
<b>CEP</b>	48370000	<b>Telefone</b>	7196421002
<b>Correio Eletrônico</b>	STARTSOLUCOESINTEGRADAS@GMAIL.COM		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA	<b>CPF</b>	78453046549
<b>Telefone</b>	00000000		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	LIVIA SANTOS DE OLIVEIRA		
<b>CPF</b>	02497332509	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	7121323723
<b>Correio Eletrônico</b>	CONTATO@CONTARBA.COM.BR		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
<b>CNO</b>	90.012.50673/74	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2023		
<b>Débito Apurado</b>	88,25		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 88,25		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.012.50673/74	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2023		
<b>Débito Apurado</b>	35,30		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 35,30		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.012.50673/74	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2023		
<b>Débito Apurado</b>	52,95		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 52,95		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.012.50673/74	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2023		
<b>Débito Apurado</b>	7,06		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 7,06		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.012.50673/74	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2023		
<b>Débito Apurado</b>	21,18		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 21,18		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.50673/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	105,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 105,90		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.50673/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	706,03		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 706,03		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	124,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 124,06		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	49,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 49,62		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	74,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 74,44		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	9,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,92		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	29,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29,77		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	148,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 148,88		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	992,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 992,55		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	1.360,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.360,00		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2023		
<b>Débito Apurado</b>	665,33		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 59,82 Retenção Lei 9711/98: 605,51		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2023		
<b>Débito Apurado</b>	748,00		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 748,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	08/2023		
<b>Débito Apurado</b>	84,40		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 84,40		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 05/09/2023  
HORA: 16:37:27  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI  
COMPETÊNCIA: 08/2023  
CÓD REC: 150  
FPAS: 507  
INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35  
SIMPLES: 1  
-----

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES	
REMUNERAÇÃO	4.962,78
DEPÓSITO	397,02
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	397,02

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/09/2023  
HORA: 16:37:27  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI			21.450.165/0001-35	0079	2100	507
1.140,09	2.501,43	287,84	59,82	0,00	3.869,54	0,00

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI N° ARQUIVO: K80LHY2Ftmp0000-0  
 COMP: 08/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 LOGRADOURO: TV SAO JOSE 55 GALPAO 04 BAIRRO: TIMEO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: ESPILANADA UF: BA CEP: 48370-000 TELEFONE: 71-96421002 CNAE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	392,09
	Contribuintes Individuais	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
	EMPRESA						
	Empregados/Avulsos	992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	992,55
	Contribuintes Individuais	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
	RAT	148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	148,88
	RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,70
	OUTRAS ENTIDADES	287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	287,84
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	287,84
	TOTAL A RECOLHER	3.869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,54

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI N° CONTROLE: A21Qiv1e8ue0000-3 N° ARQUIVO: K80LHYZftmp0000-0  
COMP: 08/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35  
TOMADOR/OBRA: LOGRADORO: TV SAO JOSE 55 GALPAO 04 UF: BA CEP: 48370-000 BAIRRO: TIMBO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: ESPLANADA TELEFONE: 71-96421002 CNAE: 4120400  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGUERADO

Empregados/Avulsos	392,09	0,00	0,00	0,00	392,09
Contribuintes Individuais	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	992,55	0,00	0,00	0,00	992,55
Contribuintes Individuais	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
RAT	148,88	0,00	0,00	0,00	148,88
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.581,70	0,00	0,00	0,00	3.581,70
OUTRAS ENTIDADES	287,84	0,00	0,00	0,00	287,84
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	287,84	0,00	0,00	0,00	287,84
TOTAL A RECOLHER	3.869,54	0,00	0,00	0,00	3.869,54

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEFP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUTIVEL(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2023  
HORA: 16:37:27  
PÁG : 0001/0003

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000030 970201802307 907680180820 145016500012

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35 N° ARQUIVO: K80LHY2Ftmp0000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 08/2023 N° CONTROLE: A2iQiv1e8uE0000-3  
TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE SANTALUZ INSCRIÇÃO: 13.807.870/0001-19 N° CONTROLE: BEm4owtTmqe0000-7  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
PC CORONEL JOSE LEITAO 05 TERREO CENTRO SANTALUZ 48880000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 6.362,78  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 4

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 4.962,78  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 397,02  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 6.362,78  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 546,09  
VAL DEVIDO PREV SOC 2.195,54

TOTAL TRABALHADORES 4

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 4.962,78  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 397,02  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 3

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
 858700000030 970201802307 907680180820 145016500012

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35 N° ARQUIVO: K80LHY2Ftmp0000-0  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 08/2023 N° CONTROLE: AZiQiv1e8uE0000-3  
 TOMADOR/OBRA : START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35 N° CONTROLE: MexXhoWgXpU0000-3  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
 TV SAO JOSE 55 GALPAO 04 TIMBO ESPLANADA 48370000 48370000 BA

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	5.400,00	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	0,00
		DEPÓSITO 0,00
		ENCARGOS FGTS 0,00
		CONTRIB SOCIAL 0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES 0

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	5.400,00	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	594,00	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.674,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES 0

858700000030 970201802307 907680180820 145016500012

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35 N° ARQUIVO: K80LHY2Ftmp0000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 08/2023

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13° SALÁRIO	11.762,78	REM SEM 13° SALÁRIO	4.962,78
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.140,09	DEPÓSITO	397,02
VAL DEVIDO PREV SOC	3.869,54	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	397,02

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2023  
HORA: 16:37:27  
PÁG : 0001/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000030 970201802307 907680180820 145016500012

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI  
COMP: 08/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35  
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE SANTALUZ FAP: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 13.807.870/0001-19

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
									CBO	JAM
ECSON SENA MARQUES 1.332,98	0,00	160.22343.57-8	0,00		14/02/2023	01			07170	0,00
JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA SANTOS 1.400,22	0,00	203.16005.86-4	0,00		14/02/2023	01		106,64	07170	0,00
UBIRAJARA SANTOS 2.229,58	0,00	126.47432.04-1	0,00		14/02/2023	01		112,01	0,00	0,00
								178,37	07152	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2023  
HORA: 16:37:27  
PÁG : 0002/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000030 970201802307 907680180820 145016500012

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35	CBO
COMP: 08/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00	JAM
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE SANTALUZ	INSCRIÇÃO: 13.807.870/0001-19	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO
	PIS/PASEP/CI	
REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	
	BASE CÁL PREV SOCIAL	
ATANAEL ALVES DOS SANTOS	206.07910.97-0	01/05/2023 11
1.400,00	0,00	154,00
		0,00
		05174
		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	546,09	397,02	0,00
---------------------------	------	--------	--------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000030 970201802307 907680180820 145016500012

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI N° ARQUIVO: K80LHY2Ftmp0000-0  
 COMP: 08/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35  
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE SANTALUZ FAP: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 N° DE CONTROLE: BBr4OwtTmge0000-7 INSCRIÇÃO: 13.807.870/0001-19  
 LOGRADOURO: TV SAO JOSE 55 GALPAO 04 BAIRRO: TIMBO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: ESPLANADA UF: BA CEP: 48370-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.962,78	0,00	4.962,78	0,00
11	1	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
TOTALS:	4	6.362,78	0,00	6.362,78	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2023  
 HORA: 16:37:27  
 PÁG: 0004/0010

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: K80LHY2Ftmp0000-0  
 INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 INSCRIÇÃO: 13.807.870/0001-19  
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CNAE: 4120400

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 Nº DE CONTROLE: Bm4OwtTmge0000-7

LOGRADOURO: TV SAO JOSE 55 GALPAO 04 UF: BA CEP: 48370-000 BAIRO: TIMBO TELEFONE: 0071 9642 1002  
 CIDADE: ESPLANADA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.195.54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 546.09  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2023  
 HORA: 16:37:27  
 PAG: 0005/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35  
 COMP: 08/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 TOMADOR/OBRA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI FAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35

NO ME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA						
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
DOUGLAS DOS SANTOS LIMA	0,00	212.83040.79-6	0,00	0,00	01/07/2023	11			0,00	04110	0,00
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA	0,00	131.05108.08-3	0,00	0,00	07/06/1980	11			0,00	01414	0,00
					440,00						
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>	<b>0,00</b>				<b>594,00</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

DATA: 05/09/2023  
 HORA: 16:37:27  
 PÁG: 0006/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: K80LHY2Ftmp0000-0  
 INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI  
 COMP: 08/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI

FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 Nº DE CONTROLE: MexXhoWgXpU0000-3

LOGRADOURO: TV SAO JOSE 55 GALFAO 04  
 CIDADE: ESPLANADA

UF: BA CEP: 48370-000 BAIRRO: TIMBO  
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
11	2	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
TOTALS:	2	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI  
COMP: 08/2023 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI N° DE CONTROLE: MexXhoWgXpu0000-3  
LOGRADOURO: TV SAO JOSE 55 GALPAO 04 BAIRRO: TIMBO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: ESPLANADA UF: BA CEP: 48370-000 TELEFONE: 0071 9642 1002 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.674.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 594.00  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI  
 COMP: 08/2023 COD REC:150 COD GPS:2100  
 TOMADOR/OBRA: TV SAO JOSE 55 GALPAO 04

Nº DE CONTROLE: A2iQiv1e8uE0000-3  
 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: K80LHY2Ftmp0000-0  
 INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: UF: BA CEP: 48370-000 BAIRRO: TIMBO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: ESPLANADA CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.962,78	0,00	4.962,78	0,00
11	3	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
TOTALS:	6	11.762,78	0,00	11.762,78	0,00

DATA: 05/09/2023  
HORA: 16:37:27  
PÁG: 0009/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

Nº ARQUIVO: K80LHY2Ftmp0000-0  
INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: A2iQiv1e8uE0000-3  
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI  
COMP: 08/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: TV SAO JOSE 55 GALPAO 04  
CIDADE: ESPLANADA

UF: BA CEP: 48370-000  
BAIRRO: TIMBO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

4.962,78  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

3

MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

397,02

0,00

0,00

0,00

397,02



DATA: 05/09/2023  
HORA: 16:37:27  
PAG: 0010/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: K80LHYzFtmp0000-0  
INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: A2iQiv1e8uE0000-3  
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI  
COMP: 08/2023 COD REC: 150 COD GFS: 2100

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: TV SAO JOSE 55 GALPAO 04  
CIDADE: ESPLANADA

UF: BA CEP: 48370-000  
BAIRRO: TIMBO TELEFONE: 0071 9642 1002

CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:  
SALÁRIO FAMÍLIA:

3.869.54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

1.140.09

SALÁRIO MATERNIDADE:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
0.00 COM PRODUÇÃO PJ:  
0.00 COM PRODUÇÃO PF:  
0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL:  
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:  
0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:  
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00  
0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0

25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0

0.00  
0


QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO – REFORMA DA CRECHE IRMÃ DULCE, no Município de Santaluz-Ba - BA.**

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/08/2023	Santaluz-Ba	Reforma da Creche Irmã Dulce

**FOTO 01 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019**

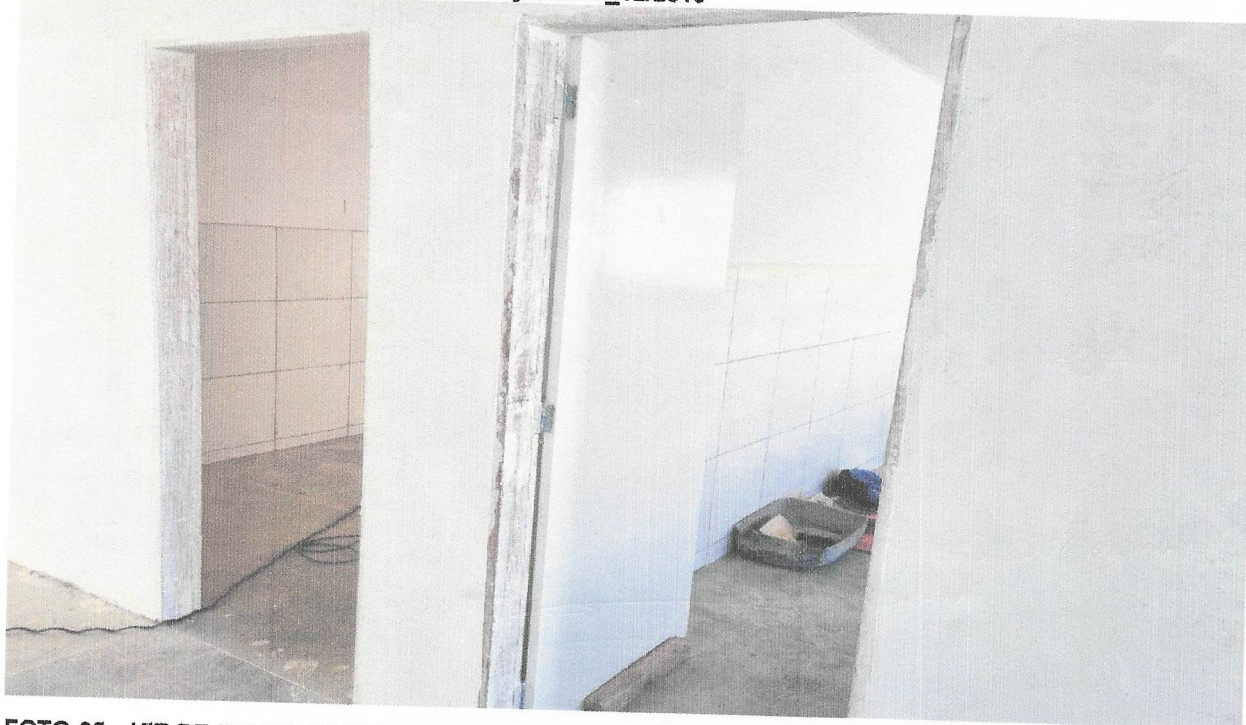

**FOTO 02 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019**



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/08/2023	Santaluz-Ba	Reforma da Creche Irmã Dulce

**FOTO 03 - FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - REV 06\_10/2021**



**FOTO 04 - FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - REV 06\_10/2021**



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/08/2023	Santaluz-Ba	Reforma da Creche Irmã Dulce

**FOTO 05 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019**



**FOTO 06 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019**



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/08/2023	Santaluz-Ba	Reforma da Creche Irmã Dulce

FOTO 07 - FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - REV 06\_10/2021



FOTO 08 - Quadro de distribuição de embutir para até 32 disjuntores padrão DIN, exclusive disjuntores



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/08/2023	Santaluz-Ba	Reforma da Creche Irmã Dulce

**FOTO 09 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**



**FOTO 10 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/08/2023	Santaluz-Ba	Reforma da Creche Irmã Dulce

**FOTO 11 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF\_11/2014**



**FOTO 12 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF\_11/2014**

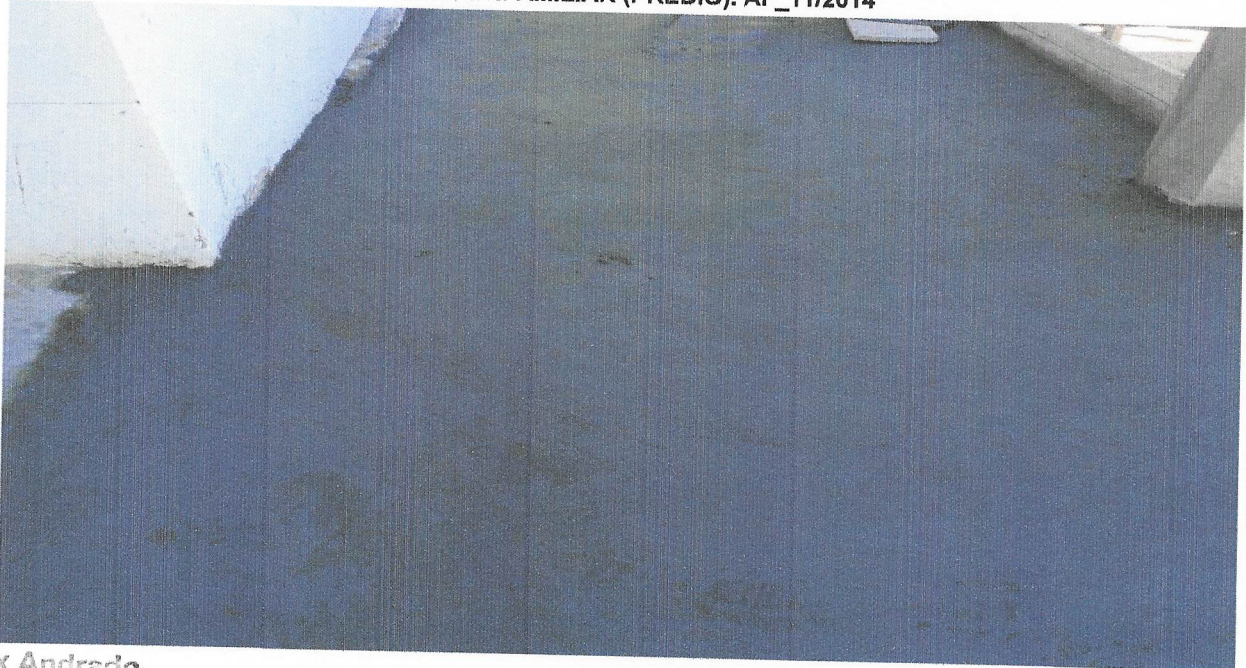

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/08/2023	Santaluz-Ba	Reforma da Creche Irmã Dulce

**FOTO 13 - PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS**




**FOTO 14 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF\_06/2014**





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/08/2023	Santaluz-Ba	Reforma da Creche Irmã Dulce

**FOTO 15 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014**

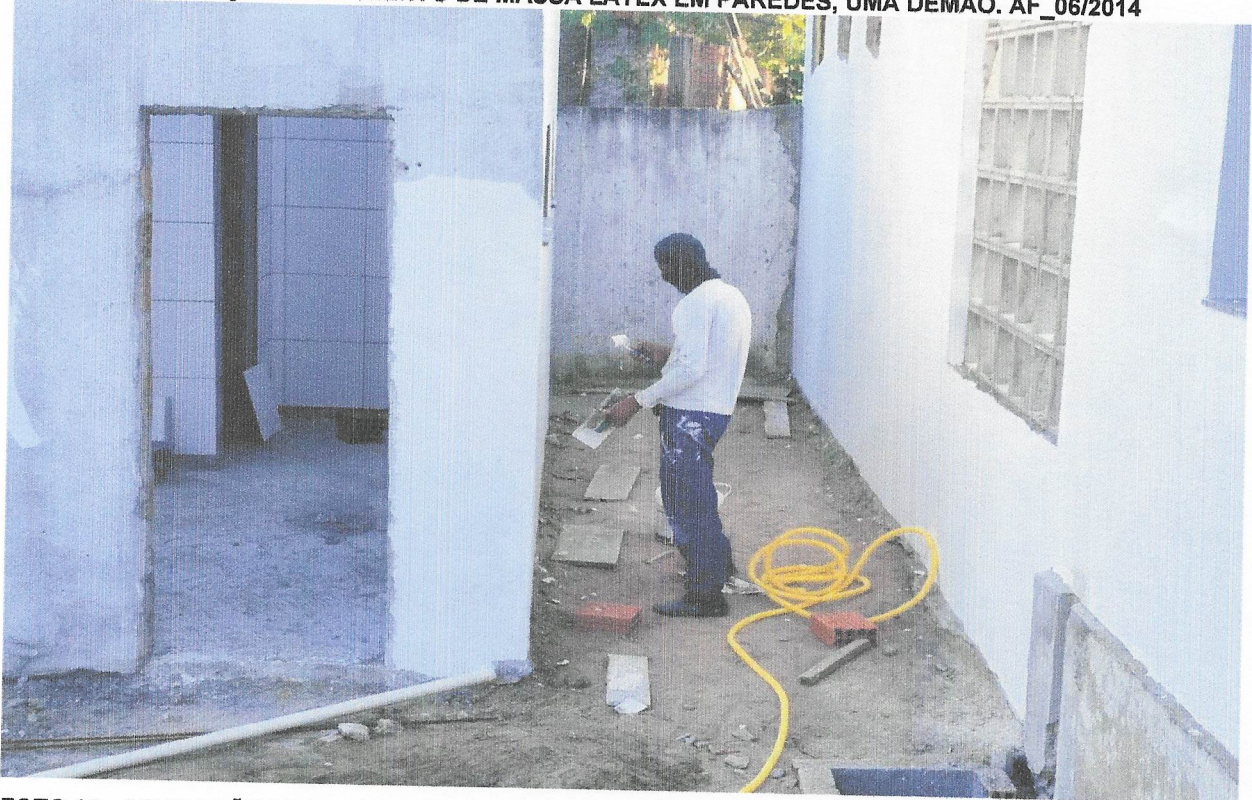


**FOTO 16 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014**



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/08/2023	Santaluz-Ba	Reforma da Creche Irmã Dulce

**FOTO 17 - CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 1000 LITROS**

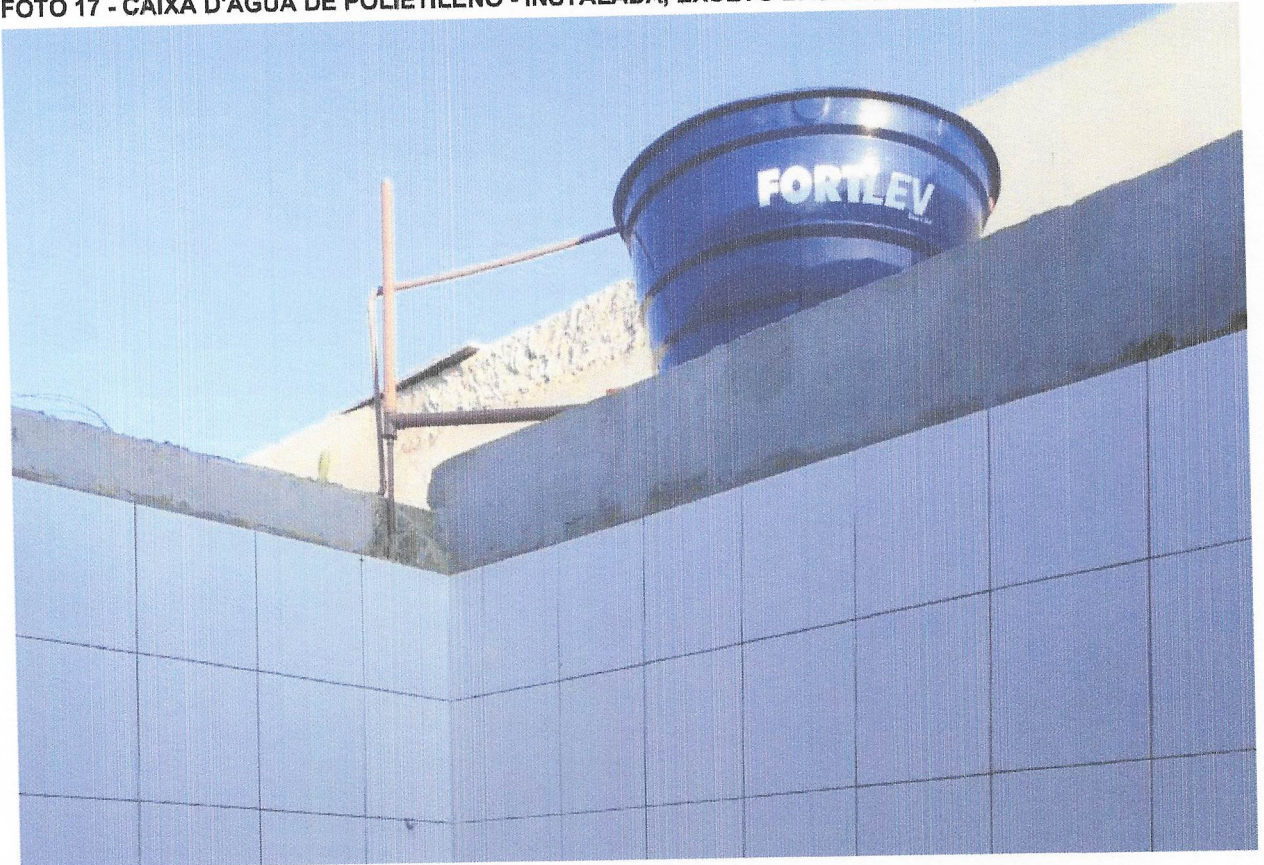


**FOTO 18 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
31/08/2023	Santaluz-Ba	Reforma da Creche Irmã Dulce

**FOTO 19 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**

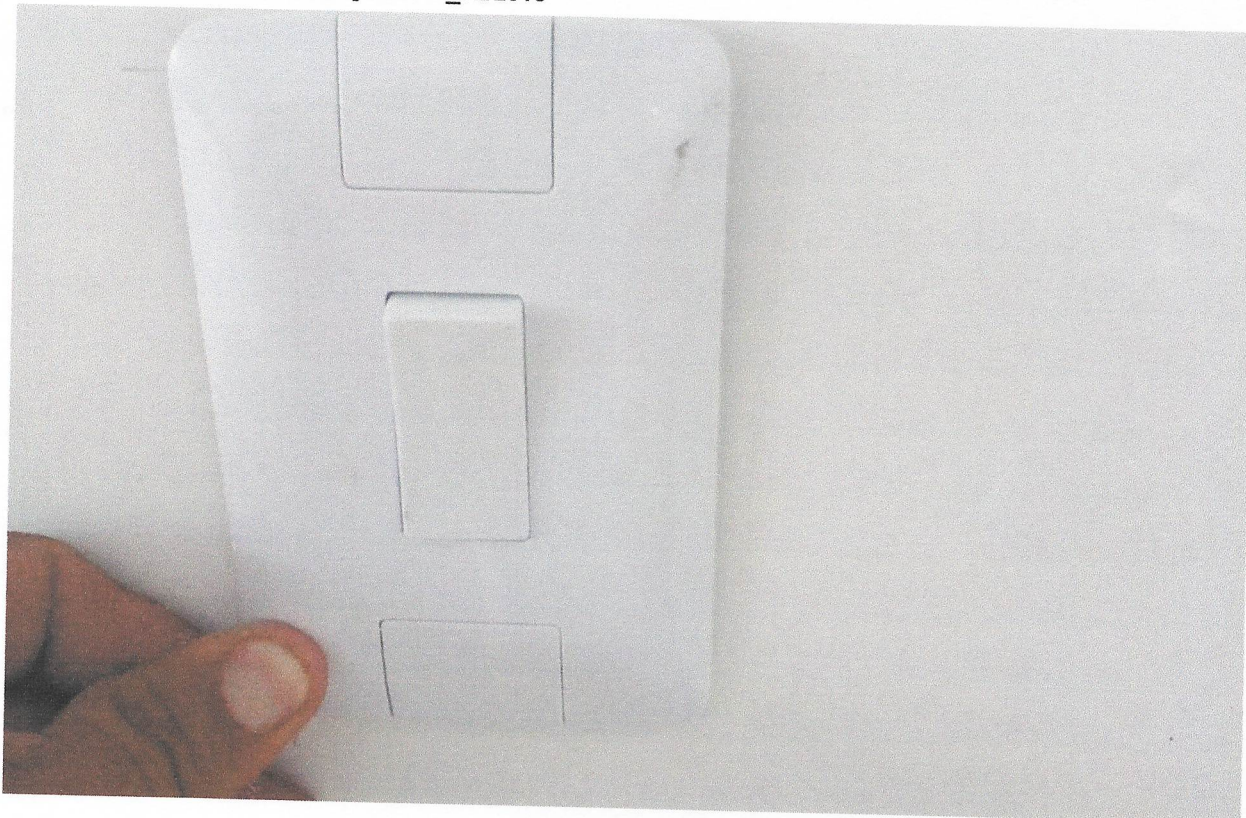

**FOTO 20 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/08/2023	Santaluz-Ba	Reforma da Creche Irmã Dulce

**FOTO 21 - CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO**



**FOTO 22 - RESERVATÓRIO EM POLICARBONATO DE 15000 LITROS**




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/08/2023	Santaluz-Ba	Reforma da Creche Irmã Dulce

**FOTO 23 - CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO**



**FOTO 24 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA COM VIGOTA DUPLA PARA PISO, INTEREIXO 38CM, H=12CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.**

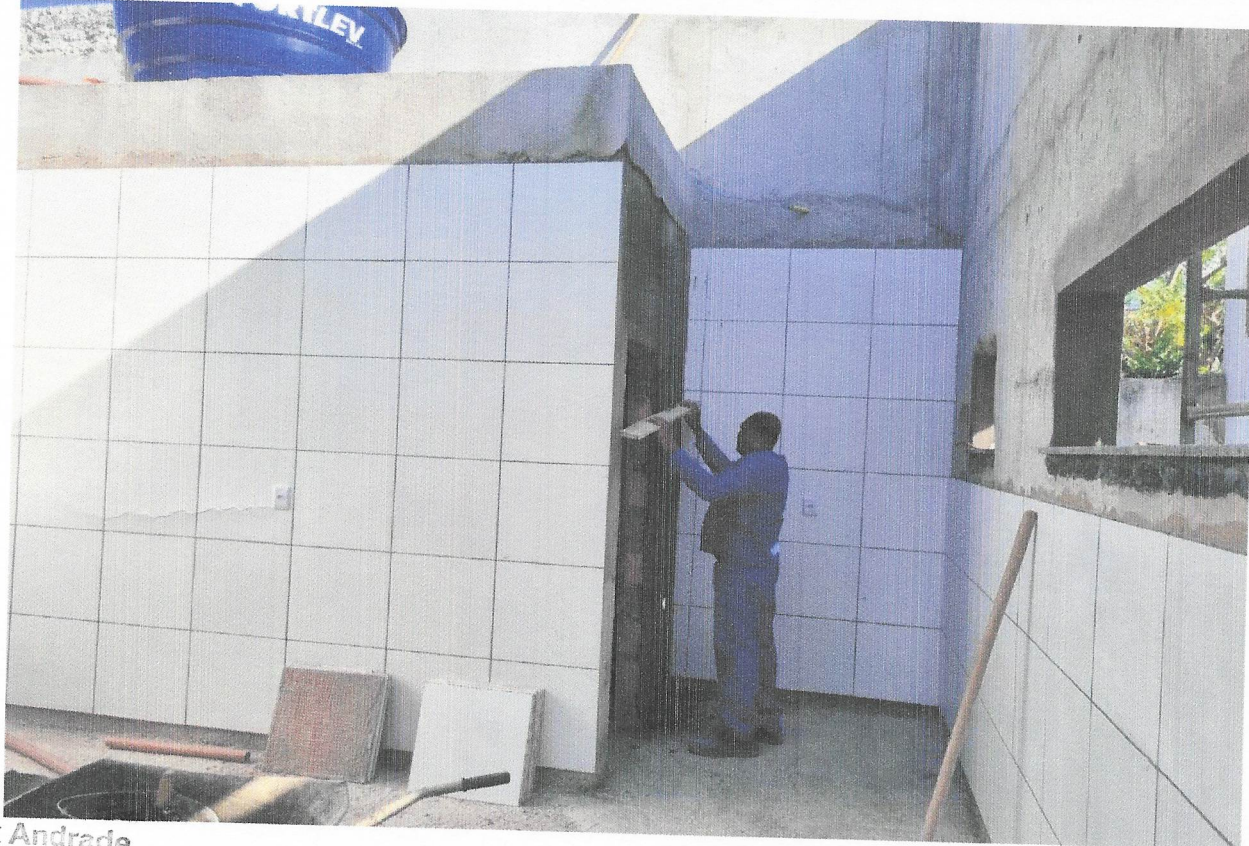

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/08/2023	Santaluz-Ba	Reforma da Creche Irmã Dulce

FOTO 25 - MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020


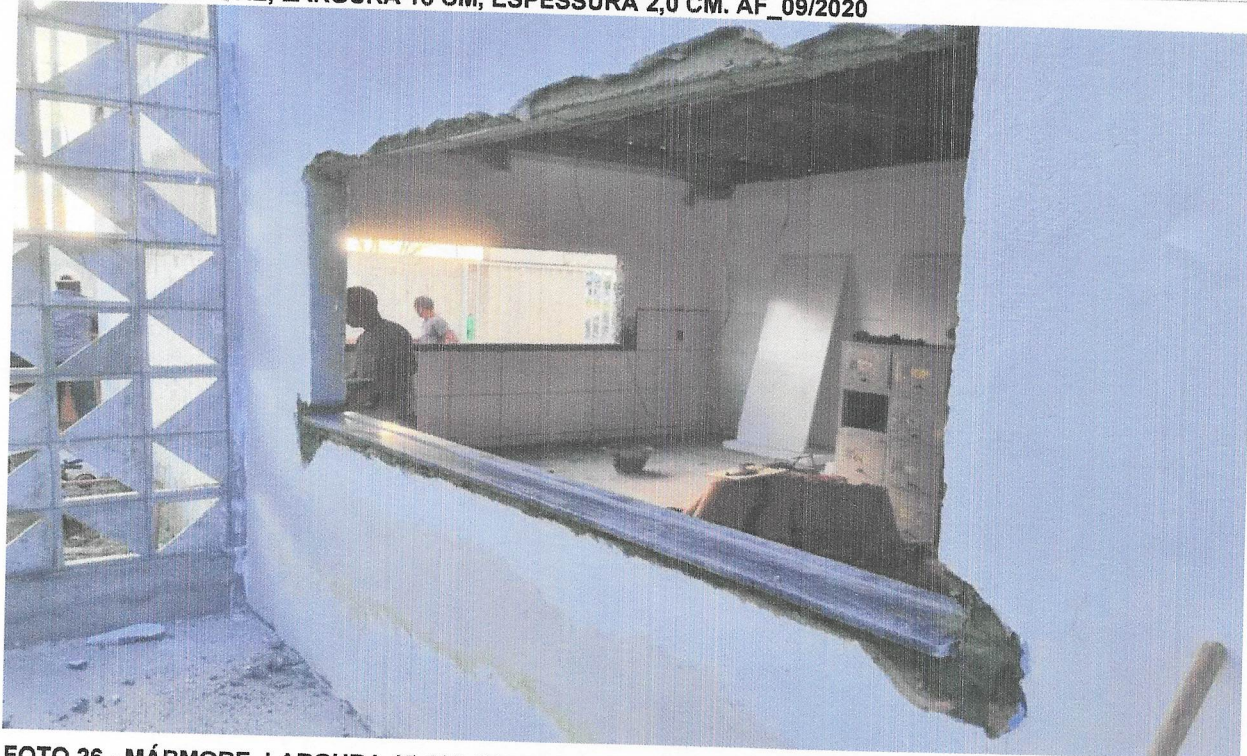


FOTO 26 - MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020

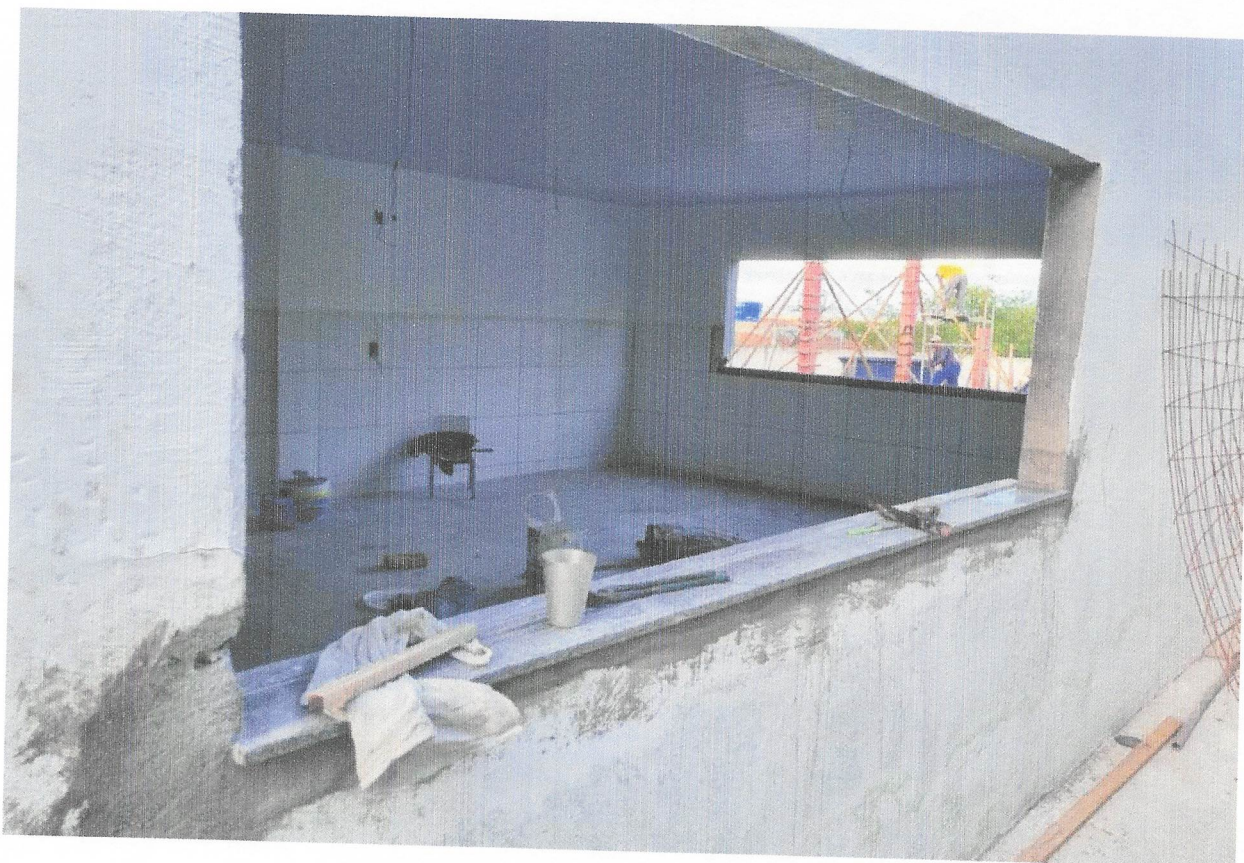

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/08/2023	Santaluz-Ba	Reforma da Creche Irmã Dulce

FOTO 27 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") PARA DRENO DO AR CONDICIONADO

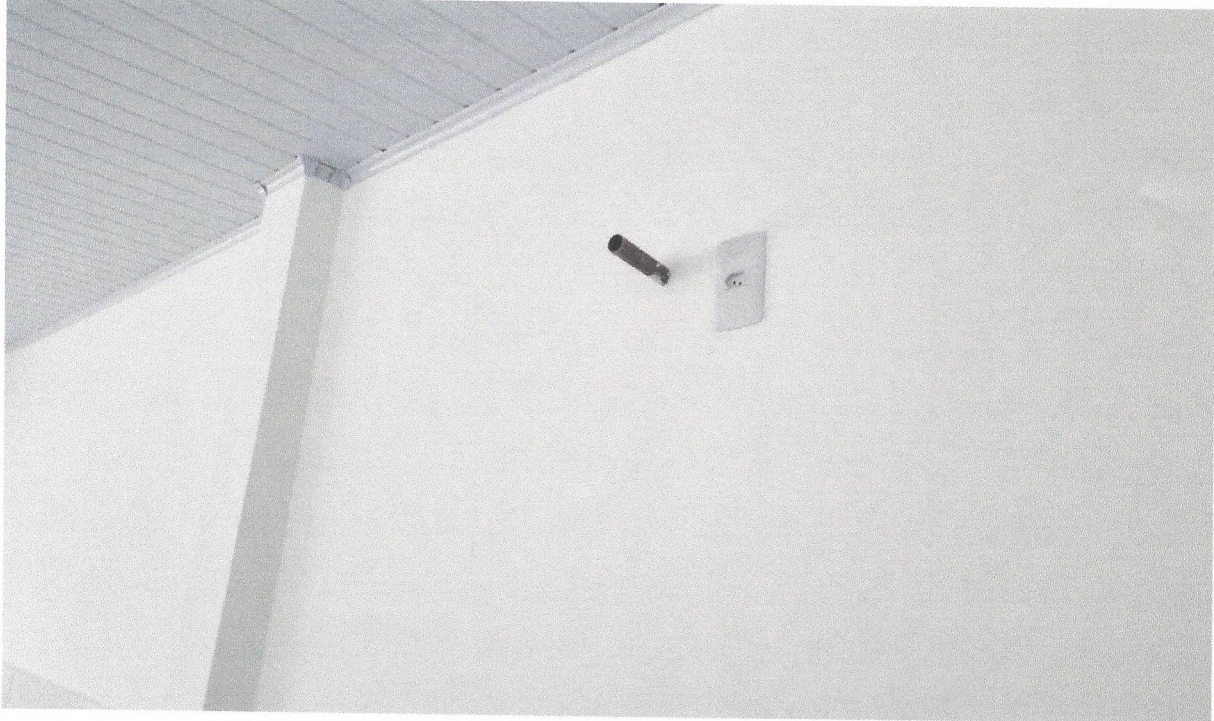


FOTO 28 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") PARA DRENO DO AR CONDICIONADO



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/08/2023	Santaluz-Ba	Reforma da Creche Irmã Dulce


**FOTO 29 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF\_06/2016.**



**FOTO 30 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF\_06/2016**







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data		S	T	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL				
	OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE						CATEGORIA		QTDE		
CONTRATO Nº 267-2022		LICITAÇÃO Nº 007-2022		RDO: 217		MÃO DE OBRA INDIRETA					
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 2 )		Noite: ( )		Gerente de Obra					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Engenheiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança					
INSTALAÇÃO KIT DE PORTAS DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA.						Aux Adm					
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO -						Mestre de obra					
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						Encarregado geral					
Forno de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC)											
EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4											
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos											
						Hh DO DIA					
						MÃO DE OBRA DIRETA					
						Topografo					
						Auxiliar de topografia					
						Pedreiro 4					
						Ajudante Geral 6					
						Calceteiro					
						Carpinteiro 1					
						Operador de Motosserra					
						Motorista					
						Montador 1					
						Montador/Eletricista					
						Eletricista					
						Operador de Patrol					
						Operador de Escavadeira					
						Operador de Pá carregadeira					
						Motorista de caçamba					
						Pintor					
						Hh DO DIA					
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO					
						EFETIVO DO DIA					
						JORNADA DE TRABALHO					
						Hh DO DIA					
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO					
						EFETIVO EQUIPAMENTOS					
						TIPO		QTDE.			
						Veículo Leve					
						Caminhão Muncie					
						Caminhão Toco					
						Escavadeira					
						Pá carregadeira					
						Caçamba					
						Patrol					
						PC 200					
						Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/07/2023				Data: 20/07/2023							

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8

IAGO R S BORBA  
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																						
				<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td> </tr> </table>													X		S	T	Q	Q	S	S	D	
										X																
S	T	Q	Q	S	S	D																				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GRECHE IRMÃ DULCE CONTRATO Nº 267-2022 LICITAÇÃO Nº 007-2022 RDO: 218 Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA																						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA																						
INSTALAÇÃO KIT DE PORTAS DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA. FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador 1 Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA																						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória																						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																						
Data: 21/07/2023				Data: 21/07/2023																						

  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

  
 IAGO R.S. BORBA  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Data											X
	S	T	Q	Q	S	S	D				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÁ DULCE

CONTRATO Nº 267-2022

LICITAÇÃO Nº 007-2022

RDO: 219

Condições Climáticas:

Manhã: ( )

1

Tarde: ( )

1

Noite: ( )

1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

SIMBOLOGIA

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

SEM EXPEDIENTE

**EFETIVO PESSOAL**

CATEGORIA

QTDE

**MÃO DE OBRA INDIRETA**

Gerente de Obra

Engenheiro

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

**MÃO DE OBRA DIRETA**

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

4

Ajudante Geral

6

Calceteiro

Carpinteiro

1

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

1

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Hh DO DIA

**RESUMO DO EFETIVO**

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

**EFETIVO EQUIPAMENTOS**

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:


Data: 22/07/2023

Data:


22/07/2023

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

**IAGO R S BORBA**  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																								
				<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td> </tr> <tr> <td>s</td><td>t</td><td>q</td><td>q</td><td>s</td><td>s</td><td>s</td><td>d</td><td></td> </tr> </table>															x	s	t	q	q	s	s	s	d	
												x																
s	t	q	q	s	s	s	d																					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE CONTRATO Nº 267-2022      LICITAÇÃO Nº 007-2022      RDO: 220 Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA      QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA																								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab. SIMBOLOGIA      SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral  Hh DO DIA																								
SEM EXPEDIENTE				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro      4 Ajudante Geral      6 Calceteiro Carpinteiro      1 Operador de Motosserra Motorista Montador      1 Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor  Hh DO DIA																								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO      QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória																								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																								
Data: 23/07/2023				Data: 23/07/2023																								

  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

  
**IAGO R S BORBA**  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Data	x								
	S	T	Q	Q	S	S	D		



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE

CONTRATO Nº 267-2022 LICITAÇÃO Nº 007-2022 RDO: 221

Tarde: ( 1 ) Noite: ( )

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Condições Climáticas: Manhã: ( 2 ) 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.

SIMBOLOGIA

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

INSTALAÇÃO KIT DE PORTAS DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA.  
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019

Ferro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC)

EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos

SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

AF\_09/2020

TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") PARA DRENO DO AR

CONDICIONADO

Gerente de Obra

Engenheiro

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

4

Ajudante Geral

6

Calceteiro

Carpinteiro

1

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

1

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Muncck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 24/07/2023

Data: 24/07/2023

*Tony Felix Andrade*  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8

*IAGO R S BORBA*  
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

Data		X						
	S	T	Q	Q	S	S	D	



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE  
 CONTRATO Nº 267-2022 LICITAÇÃO Nº 007-2022 RDO: 222

**EFETIVO PESSOAL**

CATEGORIA	QTDE
-----------	------

Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )  
 SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

**MÃO DE OBRA INDIRETA**

**SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS**

INSTALAÇÃO KIT DE PORTAS DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA.  
 Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC)  
 EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4  
 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos  
 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.  
 AF\_09/2020  
 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") PARA DRENO DO AR  
 CONDICIONADO

Gerente de Obra  
 Engenheiro  
 Tec. de Segurança  
 Aux Adm  
 Mestre de obra  
 Encarregado geral

---

Hh DO DIA

**MÃO DE OBRA DIRETA**

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	4
Ajudante Geral	6
Calceteiro	
Carpinteiro	1
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	1
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	

---

Hh DO DIA

**CONSIDERAÇÕES**

**RESUMO DO EFETIVO**

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

**OBSERVAÇÕES**

**EFETIVO EQUIPAMENTOS**

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA: \_\_\_\_\_ FISCALIZAÇÃO: \_\_\_\_\_  
 Data: 25/07/2023 Data: 25/07/2023


**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.059.677.8


**IAGO R S BORBA**  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	X	Q	Q	S	S	D
OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 267-2022		LICITAÇÃO Nº 007-2022		RDO: 223		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança							
INSTALAÇÃO KIT DE PORTAS DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA.				Aux Adm							
Ferro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC)				Mestre de obra							
EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4				Encarregado geral							
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos											
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") PARA DRËNO DO AR											
CONDICIONADO				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 4							
				Ajudante Geral 6							
				Calceteiro							
				Carpinteiro 1							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador 1							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 26/07/2023				Data: 26/07/2023							

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.059.677.8


IAGO R S BORBA  
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	x	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
	OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE											
CONTRATO Nº 267-2022		LICITAÇÃO Nº 007-2022		RDO: 224	CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )					MÃO DE OBRA INDIRETA							
<b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> INSTALAÇÃO KIT DE PORTAS DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA. Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos					<b>Hh DO DIA</b>							
					<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>							
					Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador 1 Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
					<b>Hh DO DIA</b>							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>					<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>					<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/07/2023					Data: 27/07/2023							


  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8


  
**IAGO R S BORBA**  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE CONTRATO N° 267-2022 LICITAÇÃO N° 007-2022 RDO: 225						S T Q Q S S D X									
						Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 2 ) Noite: ( )						EFETIVO PESSOAL			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO KIT DE PORTAS DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA. Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos						Gerente de Obra									
						Engenheiro									
						Tec. de Segurança									
						Aux Adm									
						Mestre de obra									
						Encarregado geral									
						Hh DO DIA									
						MÃO DE OBRA DIRETA									
						Topografo									
						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro							4		
						Ajudante Geral							6		
						Calceteiro									
						Carpinteiro							1		
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador							1		
						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Patrol									
						Operador de Escavadeira									
						Operador de Pá carregadeira									
						Motorista de caçamba									
						Pintor							1		
						Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO				QTDE.					
						Veículo Leve									
						Caminhão Muncck									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 28/07/2023						Data: 28/07/2023									


  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

  
**IAGO R S BORBA**  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data														
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE CONTRATO Nº 267-2022 LICITAÇÃO Nº 007-2022 RDO: 226				<table border="1"> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td>X</td> </tr> </table>							S	T	Q	Q	S	S	D	X
				S	T	Q	Q	S	S	D	X							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 2 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA														
SEM EXPEDIENTE				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral														
				Hh DO DIA														
				MÃO DE OBRA DIRETA														
				Topografo														
				Auxiliar de topografia														
				Pedreiro 4														
				Ajudante Geral 6														
				Calceteiro														
				Carpinteiro 1														
				Operador de Motoserra														
Motorista																		
Montador 1																		
Montador/Eletricista																		
Eletricista																		
Operador de Patrol																		
Operador de Escavadeira																		
Operador de Pá carregadeira																		
Motorista de caçamba																		
Pintor 1																		
Hh DO DIA																		
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO														
				EFETIVO DO DIA														
				JORNADA DE TRABALHO														
				Hh DO DIA														
				Hh ACUMULADO														
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS														
				TIPO QTDE.														
				Veículo Leve														
				Caminhão Munck														
				Caminhão Toco														
				Escavadeira														
				Pá carregadeira														
				Caçamba														
				Patrol														
PC 200																		
Placa Vibratória																		
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:														
Data: 29/07/2023				Data: 29/07/2023														


  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

  
 IAGO R'S BORBA  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE				S T Q Q S S D						
				CONTRATO Nº 267-2022 LICITAÇÃO Nº 007-2022 RDO: 227				EFETIVO PESSOAL		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA						
SEM EXPEDIENTE				MÃO DE OBRA DIRETA						
CONSIDERAÇÕES				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador 1 Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1						
				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 30/07/2023				Data: 30/07/2023						


  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

  
**IAGO R S BORBA**  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE CONTRATO N° 267-2022 LICITAÇÃO N° 007-2022 RDO: 228 Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					x S T Q Q S S D							
					EFETIVO PESSOAL					CATEGORIA		QTDE
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA							
Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.					Gerente de Obra							
					Engenheiro							
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							
					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topografo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro							4
					Ajudante Geral							6
					Calceteiro							
					Carpinteiro							1
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador							1
					Montador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol							
					Operador de Escavadeira							
					Operador de Pá carregadeira							
					Motorista de caçamba							
					Pintor							1
					Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO							QTDE.
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 31/07/2023					Data: 31/07/2023							


  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

  
**IAGO R S BORBA**  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																						
				<table border="1"> <tr> <td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td> </tr> </table>								X							S	T	Q	Q	S	S	D	
					X																					
S	T	Q	Q	S	S	D																				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE CONTRATO N° 267-2022      LICITAÇÃO N° 007-2022      RDO: 229				EFETIVO PESSOAL																						
Condições Climáticas: Manhã: ( 2 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) SIMBOLOGIA      1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE																		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, Inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.				MÃO DE OBRA INDIRETA																						
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral																						
				Hh DO DIA																						
				MÃO DE OBRA DIRETA																						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro      4 Ajudante Geral      6 Calceteiro Carpinteiro      1 Operador de Motosserra Motorista Montador      1 Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor      1																						
				Hh DO DIA																						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																						
				TIPO      QTDE. Veiculo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória																						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																						
Data: 01/08/2023				Data: 01/08/2023																						


  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

  
 IAGO R'S BORBA  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
 <b>Start</b> <small>CONSTRUTORA</small>	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	x	Q	S	S	D	
	OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE										
CONTRATO Nº 267-2022		LICITAÇÃO Nº 007-2022		RDO: 230		CATEGORIA		QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 2 ) Tarde: ( 2 ) Noite: ( )			MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA			1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Engenheiro								
			Téc. de Segurança								
Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado. Inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.			Aux Adm								
			Mestre de obra								
			Encarregado geral								
			Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES			MÃO DE OBRA DIRETA								
			Topografo								
			Auxiliar de topografia								
			Pedreiro 4								
			Ajudante Geral 6								
			Calçeteiro								
			Carpinteiro 1								
			Operador de Motosserra								
			Motorista								
			Montador 1								
			Montador/Eletricista								
			Eletricista								
			Operador de Patrol								
			Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor 1											
Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO								
			EFETIVO DO DIA								
			JORNADA DE TRABALHO								
			Hh DO DIA								
Hh ACUMULADO											
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:								
Data: 02/08/2023			Data: 02/08/2023								


  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

  
**IAGO R S BORBA**  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
	OBJET: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE									
	CONTRATO N° 267-2022	LICITAÇÃO N° 007-2022	RDO: 231	CATEGORIA				QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )	1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA	SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra						
Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC)				Engenheiro						
EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4				Tec. de Segurança						
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos				Aux Adm						
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.				Mestre de obra						
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 4						
				Ajudante Geral 6						
				Calceteiro						
				Carpinteiro 1						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador 1						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor 1						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 03/08/2023				Data: 03/08/2023						

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8


IAGO R S BORBA  
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	X	S	D
	OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE			EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 267-2022		LICITAÇÃO N° 007-2022		RDO: 232		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 2 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC)				Tec. de Segurança						
EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4				Aux Adm						
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos				Mestre de obra						
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.				Encarregado geral						
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.										
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 4						
				Ajudante Geral 6						
				Calceteiro						
				Carpinteiro 1						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador 1						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor 1						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/08/2023				Data: 04/08/2023						

  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

  
**IAGO R'S BORBA**  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data											
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE CONTRATO Nº 267-2022 LICITAÇÃO Nº 007-2022 RDO: 233					EFETIVO PESSOAL											
					CATEGORIA				QTDE							
MÃO DE OBRA INDIRETA					Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral											
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 2 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Hh DO DIA											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA DIRETA											
SEM EXPEDIENTE					Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador 1 Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1											
					Hh DO DIA											
					RESUMO DO EFETIVO											
					EFETIVO DO DIA											
					JORNADA DE TRABALHO											
					Hh DO DIA											
					Hh ACUMULADO											
					CONSIDERAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					OBSERVAÇÕES					TIPO						
										Veículo Leve						
										Caminhão Munck						
										Caminhão Toco						
										Escavadeira						
										Pá carregadeira						
										Caçamba						
Patrol																
PC 200																
Placa Vibratória																
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:											
Data: 05/08/2023					Data: 05/08/2023											

  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8


  
**IAGO R S BORBA**  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0






 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE CONTRATO Nº 267-2022      LICITAÇÃO Nº 007-2022      RDO: 236				<b>EFETIVO PESSOAL</b>						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 2 )      Noite: ( )										
<b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, Inclui estrutura para fixação (perfis em PVC) EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.				Hh DO DIA						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro      4 Ajudante Geral      6 Calceteiro Carpinteiro      1 Operador de Motosserra Motorista Montador      1 Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor      1						
				Hh DO DIA						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
				<b>TIPO</b>			<b>QTDE.</b>			
				Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 08/08/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 08/08/2023						

  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

  
 IAGO R S BORBA  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	X	Q	Q	S	S	D	
OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 267-2022		LICITAÇÃO Nº 007-2022		RDO: 237		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 2 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA DIRETA								
<p>Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, Inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC)</p> <p>EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4</p> <p>Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos</p> <p>APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.</p> <p>APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.</p>				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra				
								Engenheiro				
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro				4				
				Ajudante Geral				6				
				Calceteiro								
				Carpinteiro				1				
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador				1				
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor				1				
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 09/08/2023				Data: 09/08/2023								

  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8


  
**IAGO R S BORBA**  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D
OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 267-2022		LICITAÇÃO N° 007-2022		RDO: 238		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 2 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA DIRETA						
<p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p> <p>Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC)</p> <p>EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4</p> <p>Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos</p> <p>APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.</p> <p>APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.</p>				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
<p>CONSIDERAÇÕES</p>				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				Hh DO DIA						
<p>OBSERVAÇÕES</p>				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/08/2023				Data: 10/08/2023						


Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.089.677.8

IAGO R'S BORBA  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0




 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>			Data						
			S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE CONTRATO N° 267-2022      LICITAÇÃO N° 007-2022      RDO: 240			<b>EFETIVO PESSOAL</b>  <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )									
<b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.			<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
<b>SEM EXPEDIENTE</b>  SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
			<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro      4 Ajudante Geral      6 Calceteiro Carpinteiro      1 Operador de Motoserra Motorista Montador      1 Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor      1						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>			<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>			<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO      QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 12/08/2023			<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 12/08/2023						


  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8


  
**IAGO R'S BORBA**  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE CONTRATO Nº 267-2022 LICITAÇÃO Nº 007-2022 RDO: 241		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: ( 2 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SEM EXPEDIENTE		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							Gerente de Obra			
									Engenheiro			
									Tec. de Segurança			
									Aux Adm			
									Mestre de obra			
									Encarregado geral			
									Hh DO DIA			
		CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA								
											Topografo	
							Auxiliar de topografia					
							Pedreiro 4					
							Ajudante Geral 6					
							Calceteiro					
							Carpinteiro 1					
							Operador de Motoserra					
							Motorista					
							Montador 1					
							Montador/Eletricista					
							Eletricista					
							Operador de Patrol					
							Operador de Escavadeira					
							Operador de Pá carregadeira					
							Motorista de caçamba					
							Pintor 1					
							Hh DO DIA					
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
									EFETIVO DO DIA			
									JORNADA DE TRABALHO			
									Hh DO DIA			
									Hh ACUMULADO			
		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
									TIPO			
									QTDE.			
									Veículo Leve			
									Caminhão Munck			
									Caminhão Toco			
									Escavadeira			
									Pá carregadeira			
									Caçamba			
									Patrol			
							PC 200					
							Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 13/08/2023		Data: 13/08/2023										


  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.013.677.8

  
 IAGO R S BORBA  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJE: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE CONTRATO Nº 267-2022 LICITAÇÃO Nº 007-2022 RDO: 242				x							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
				EFETIVO PESSOAL							
				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") PARA DRENO DO AR CONDICIONADO INSTALAÇÃO DE Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 4							
				Ajudante Geral 6							
				Calceteiro							
				Carpinteiro 1							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador 1							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor 1							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/08/2023				Data: 14/08/2023							


Tony Ferraz Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.059.677.8


IAGO R S BORBA  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE CONTRATO Nº 267-2022      LICITAÇÃO Nº 007-2022      RDO: 243				<b>EFETIVO PESSOAL</b>						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 2 )      Noite: ( )										
<b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") PARA DRENO DO AR CONDICIONADO				Hh DO DIA						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro      4 Ajudante Geral      6 Calceteiro Carpinteiro      1 Operador de Motoserra Motorista Montador      1 Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor      1						
				Hh DO DIA						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
				<b>TIPO</b>			<b>QTDE.</b>			
				Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 15/08/2023				Data: 15/08/2023						

  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro CIVIL  
 CREA-BA: 052.069.677.8


  
**IAGO R'S BORBA**  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
	OBJET: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE									
	CONTRATO N° 267-2022	LICITAÇÃO N° 007-2022	RDO: 244	CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva cf/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") PARA DRENO DO AR CONDICIONADO				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 4						
				Ajudante Geral 6						
				Calceteiro						
				Carpinteiro 1						
				Operador de Motoserra						
				Motorista						
				Montador 1						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor 1						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 16/08/2023				Data: 16/08/2023						

  
 Tony Felix Arruda  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.000.577.8


  
 IAGO R S BORBA  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																								
				<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td><td></td> </tr> </table>													x			S	T	Q	Q	S	S	D		
										x																		
S	T	Q	Q	S	S	D																						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE CONTRATO Nº 267-2022      LICITAÇÃO Nº 007-2022      RDO: 246				EFETIVO PESSOAL																								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )				CATEGORIA			QTDE																					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA																								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") PARA DRENO DO AR CONDICIONADO				Gerente de Obra																								
				Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral																								
				Hh DO DIA																								
				MÃO DE OBRA DIRETA																								
				Topografo																								
				Auxiliar de topografia																								
				Pedreiro 4																								
				Ajudante Geral 6																								
				Calceteiro																								
				Carpinteiro 1																								
				Operador de Motoserra																								
				Motorista																								
				Montador 1																								
				Montador/Eletricista																								
				Eletricista																								
				Operador de Patrol																								
				Operador de Escavadeira																								
				Operador de Pá carregadeira																								
				Motorista de caçamba																								
				Pintor 1																								
				Hh DO DIA																								
				RESUMO DO EFETIVO																								
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA																								
				JORNADA DE TRABALHO																								
				Hh DO DIA																								
				Hh ACUMULADO																								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																								
				TIPO																								
				QTDE.																								
				Veículo Leve																								
				Caminhão Munck																								
				Caminhão Toco																								
				Escavadeira																								
				Pá carregadeira																								
				Caçamba																								
Patrol																												
PC 200																												
Placa Vibratória																												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																								
Data: 18/08/2023				Data: 18/08/2023																								

  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.063.677.8

  
 IAGO R S BORBA  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE										
CONTRATO N° 267-2022		LICITAÇÃO N° 007-2022		RDO: 247		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 2 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra			
SEM EXPEDIENTE		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro			
								Tec. de Segurança			
								Aux Adm			
								Mestre de obra			
								Encarregado geral			
								Hh DO DIA			
								MÃO DE OBRA DIRETA			
								Topografo			
								Auxiliar de topografia			
								Pedreiro 4			
								Ajudante Geral 6			
								Calceteiro			
								Carpinteiro 1			
								Operador de Motoserra			
								Motorista			
								Montador 1			
								Montador/Eletricista			
								Eletricista			
								Operador de Patrol			
								Operador de Escavadeira			
								Operador de Pá carregadeira			
								Motorista de caçamba			
								Pintor 1			
								Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO			
								EFETIVO DO DIA			
								JORNADA DE TRABALHO			
								Hh DO DIA			
								Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS			
								TIPO			
								QTDE.			
								Veículo Leve			
								Caminhão Munck			
								Caminhão Toco			
								Escavadeira			
								Pá carregadeira			
								Caçamba			
								Patrol			
								PC 200			
								Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/08/2023				Data: 19/08/2023							

Tony  Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.059.677.8

  
IAGO R S BORBA  
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE				CATEGORIA			QTDE					
CONTRATO N° 267-2022		LICITAÇÃO N° 007-2022		RDO: 249		MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				Gerente de Obra								
SIMBOLOGIA				Engenheiro								
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Tec. de Segurança								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Aux Adm								
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 4								
				Ajudante Geral 6								
				Calceteiro								
				Carpinteiro 1								
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador 1												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor 1												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO			QTDE.					
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 21/08/2023				Data: 21/08/2023								


  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

  
 IAGO R S BORBA  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
					x					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 267-2022		LICITAÇÃO Nº 007-2022		RDO: 250		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: ( 2 ) Tarde: ( 2 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
Preparo de superfície com fixamento de paredes e tetos				Tec. de Segurança						
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.				Aux Adm						
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.				Mestre de obra						
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO				Encarregado geral						
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO										
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A										
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A										
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 4						
				Ajudante Geral 6						
				Calceteiro						
				Carpinteiro 1						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador 1						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor 1						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/08/2023				Data: 22/08/2023						

Tony *Andrade*  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8


*Iago R S Borba*  
IAGO R S BORBA  
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data						
					S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
	OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE										
CONTRATO Nº 267-2022		LICITAÇÃO Nº 007-2022		RDO: 251	CATEGORIA				QTDE		
Manhã: ( 2 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )	MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas:	1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA					Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Tec. de Segurança						
					Aux Adm						
					Mestre de obra						
					Encarregado geral						
					Hh DO DIA						
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A					MÃO DE OBRA DIRETA						
					Topografo						
					Auxiliar de topografia						
					Pedreiro 4						
					Ajudante Geral 6						
					Calceteiro						
					Carpinteiro 1						
					Operador de Motoserra						
					Motorista						
					Montador 1						
					Montador/Eletricista						
					Eletricista						
					Operador de Patrol						
					Operador de Escavadeira						
					Operador de Pá carregadeira						
Motorista de caçamba											
Pintor 1											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO						
					QTDE.						
					Veiculo Leve						
					Caminhão Munck						
					Caminhão Toco						
					Escavadeira						
					Pá carregadeira						
					Caçamba						
					Patrol						
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/08/2023					Data: 23/08/2023						


Tony *Andrade*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.059.677.8


*R*  
 IAGO R S BORBA  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE CONTRATO Nº 267-2022 LICITAÇÃO Nº 007-2022 RDO: 253				S T Q Q S S D						
				Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 2 ) Noite: ( )				EFETIVO PESSOAL		
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. Disjuntor termomagnético monopolar 90 A, padrão NEMA Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores RESERVATÓRIO EM POLICARBONATO DE 15000 LITROS APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 4						
				Ajudante Geral 6						
				Calceteiro						
				Carpinteiro 1						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador 1						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor 1										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/08/2023				Data: 25/08/2023						


  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.039.677.8

  
 IAGO R S BORBA  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE CONTRATO N° 267-2022 LICITAÇÃO N° 007-2022 RDO: 254 Manhã: ( 2 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.	EFETIVO PESSOAL			S	T	Q	Q	S	S	D
	CATEGORIA		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: ( 2 ) SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM EXPEDIENTE	Gerente de Obra									
	Engenheiro									
	Tec. de Segurança									
	Aux Adm									
	Mestre de obra									
	Encarregado geral									
	Hh DO DIA									
	MÃO DE OBRA DIRETA									
	Topografo									
	Auxiliar de topografia									
Pedreiro		4								
Ajudante Geral		6								
Calceteiro										
Carpinteiro		1								
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador		1								
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor		1								
Hh DO DIA										
RESUMO DO EFETIVO										
EFETIVO DO DIA										
JORNADA DE TRABALHO										
Hh DO DIA										
Hh ACUMULADO										
EFETIVO EQUIPAMENTOS										
TIPO		QTDE.								
Veiculo Leve										
Caminhão Muncck										
Caminhão Toco										
Escavadeira										
Pá carregadeira										
Caçamba										
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 26/08/2023		Data: 26/08/2023								

  
 Tony Flávio Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.877.8

  
 IAGO R S BORBA  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE				S T Q Q S S D						
				CONTRATO N° 267-2022 LICITAÇÃO N° 007-2022 RDO: 255				EFETIVO PESSOAL		
Condições Climáticas: Manhã: ( 2 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SEM EXPEDIENTE				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 4						
				Ajudante Geral 6						
				Calceteiro						
				Carpinteiro 1						
				Operador de Motosserra						
Motorista										
Montador 1										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor 1										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 27/08/2023				Data: 27/08/2023						

  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.058.677.8

  
 IAGO R S BORBA  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																										
				S	T	Q	Q	S	S	D																				
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL																										
	OBJET: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE																													
CONTRATO Nº 267-2022		LICITAÇÃO Nº 007-2022		RDO:	257			CATEGORIA		QTDE																				
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA																										
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																										
<p>Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos</p> <p>APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.</p> <p>APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.</p> <p>Disjuntor termomagnético monopolar 90 A, padrão NEMA</p> <p>Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores</p> <p>RESERVATÓRIO EM POLICARBONATO DE 15000 LITROS</p> <p>APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS</p> <p>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS</p>				<p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro</p> <p>Tec. de Segurança</p> <p>Aux Adm</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Encarregado geral</p> <p>Hh DO DIA</p>																										
				MÃO DE OBRA DIRETA																										
				<p>Topografo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro 4</p> <p>Ajudante Geral 6</p> <p>Calçeteiro</p> <p>Carpinteiro 1</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motorista</p> <p>Montador 1</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Patrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pá carregadeira</p> <p>Motorista de caçamba</p> <p>Pintor 1</p> <p>Hh DO DIA</p>																										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																										
				<p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>Hh ACUMULADO</p>																										
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																													
Veículo Leve																														
Caminhão Munck																														
Caminhão Toco																														
Escavadeira																														
Pá carregadeira																														
Caçamba																														
Patrol																														
PC 200																														
Placa Vibratória																														
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																										
Data: 29/08/2023				Data: 29/08/2023																										


Tony Feit Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8

IAGO R S BORBA  
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	x	S	S	D	
	OBJET REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE			RDO:	259							
CONTRATO N° 267-2022		LICITAÇÃO N° 007-2022		CATEGORIA								
Manhã: ( 2 )		Tarde: ( 1 )		MÃO DE OBRA INDIRETA				QTDE				
Noite: ( )		Condições Climáticas: Manhã: ( 2 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. Disjuntor termomagnético monopolar 90 A, padrão NEMA Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores RESERVATÓRIO EM POLICARBONATO DE 15000 LITROS APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS				Gerente de Obra								
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								4
				Ajudante Geral								6
				Calceteiro								
				Carpinteiro								1
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								1
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor								1				
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								QTDE.
				Veiculo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 31/08/2023				Data: 31/08/2023								

  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.000.677.8

  
 IAGO R S BORBA  
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0
