



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 214-2022

EMPENHO: 926 / 2023

Data do Empenho: 11/10/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

### FORNECEDOR

Nome: **5473 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: RUA JOSE CLEMENTE, 292 Complemento:  
 Bairro: CENTRO Cidade:  
 CNPJ: 21.763.372/0001-40 Insc. Estadual: Agência: 4171-8 CPF: RG: Estado:  
 Conta Corrente: 10495-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenhari	Nº Lic.: 002-2022CP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 072-2023	378.701,47	<b>307.717,97</b>	70.983,50
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO Nº072/2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/2022, NFS-e.Nº333, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 01/10/2023 A 09/10/2023.

Data do Empenho: 11/10/2023 Data do Liquidação: 11/10/2023

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	20.309,39
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	3.692,62
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	9.231,54
## Duzentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos ##		<b>33.233,55</b>
		<b>Valor Retido</b>
		<b>Valor Líquido</b>
		<b>274.484,42</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	11/10/2023	333	UN			307.717,97


DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	307.717,97

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 11/10/2023.



ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 11/10/2023, podendo efetuar o pagamento.



NAIARA DA CUNHA CARMO  
 Contador(a)  
 Matrícula: 6408



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 214-2022

EMPENHO: 926 / 2023

Data do Empenho: 11/10/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

### FORNECEDOR

Nome: 5473 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
Endereço: RUA JOSE CLEMENTE, 292 Tipo Pessoa: Jurídica  
Bairro: CENTRO Complemento:  
Cidade: Estado:  
CNPJ: 21.763.372/0001-40 Insc. Estadual: CPF: RG:  
Conta Corrente: 10495-7 Agência: 4171-8 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Função: 15 - Urbanismo  
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 002-2022CP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 072-2023	378.701,47	307.717,97	70.983,50
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO 072/2023, CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2022.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	307.717,97	307.717,97


## Trezentos e sete mil e setecentos e dezessete reais e noventa e sete centavos ##



307.717,97

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 11/10/2023.

  
ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 11/10/2023

  
NAIARA DA CUNHA CARMO  
Diretor Contábil  
Matrícula: 6408

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA</b> <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b> <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b> Município: TEOFILÂNDIA Código: 2931509 UF: BA Código: 29		Nº da Nota: 333 Data/Hora: 11/10/2023 08:19:09 10/2023 Ass. Digital: 222264999720811/10/2023 Forma de Pagamento: A vista																														
	<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b> Nome/Razão Social: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: RIBEIRO E ANJOS ENGENHARIA Endereço: RUA JOSÉ CLEMENTE, 292 Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: TEOFILÂNDIA Fone: - Email: ribeiroanjos.engenharia@gmail.com CNPJ/CPF: 21.763.372/0001-40 I.M.: 000.001.065/001-24 I.E./RG: 145.741.972-PP ISS: EXIGÍVEL Aliq.: Variável CEP: 4877000																																
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ Endereço: PRAÇA CORONEL LEITÃO CEP: 0000-000 Bairro: CENTRO Cidade: SANTALUZ - COD.MUNIC.: 2928000 UF: BA Fone: 0 Email: sem CNPJ/CPF: 13.807.870/0001-19 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal:																																	
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b> Medição 01 referente à Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na pavimentação de ruas da sede do município de Santaluz - BA. In tegram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2022, com seus Anexos E CONTRATO 072/2023. 60% MATERIAL: R\$ 184.630,78 40% MÃO DE OBRA: R\$ 123.087,19 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4171-8 CONTA CORRENTE 10.495-7 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <b>DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s) EM 11/10/23 Tony Felix Andrade Assinatura Tony Felix Andrade Engenheiro Civil CREA-BA: 052.069.677.8																																	
<b>OBSERVAÇÃO:</b> - EM SUBSTITUIÇÃO DA NF Nº 332 EMITIDA EM: 09/10/2023 09:40:06																																	
Local da Prestação do Serviço: SANTALUZ-BA Incidência do Imposto: SANTALUZ-BA <b>Retenções Federais R\$</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>23.694,28</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <b>Valores R\$</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>307.717,97</td> <td>184.630,78</td> <td>0,00</td> <td>123.087,19</td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> <td>2.461,74</td> <td>0,00</td> <td>281.561,95</td> </tr> </tbody> </table> CNAE: 4120-4/00 construção de edifícios				IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	23.694,28	0,00	Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	307.717,97	184.630,78	0,00	123.087,19	2,00	0,00	2.461,74	0,00	281.561,95
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções																												
0,00	0,00	0,00	0,00	23.694,28	0,00																												
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido																									
307.717,97	184.630,78	0,00	123.087,19	2,00	0,00	2.461,74	0,00	281.561,95																									
<b>Item de serviço:</b> 07.02 - Execução; por administração; empreitada ou subempreitada; de obras de construção civil; hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes; inclusive sondagem; perfuração de poços; escavação; drenagem e irrigação; terraplanagem; pavimentação; concretagem e a instalação e montagem de produtos; peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços; que fica sujeito ao ICMS).																																	
	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 65/2022 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$2.461,74 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 23.694,28 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional																																
	Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="https://www.teofilandia.ba.gov.br">https://www.teofilandia.ba.gov.br</a>																																



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 363377		CONTRIBUINTE 21041 - Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: José Clemente					NÚMERO: 292	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: TEOFILÂNDIA	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 21.763.372/0001-40			R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 184.630,78	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 9.231,54	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 9.231,54		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 31/10/2023	MÊS REFERÊNCIA: Outubro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 16/10/2023 02:49:09	DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2023		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NFS-e Nº 333 - DATA DE EMISSÃO: 11/10/2023			(=) VALOR DEVIDO - R\$	9.231,54		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	9.231,54		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81750000092 . 9

31543906202 . 9

31031010500 . 5

00036337712 . 8

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81750000092 . 9

31543906202 . 9

31031010500 . 5

00036337712 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Outubro	Nº DAM: 363377	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 16/10/2023 02:49:09	DATA VENCIMENTO: 31/10/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	9.231,54
Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda			(=) VALOR A PAGAR - R\$	9.231,54





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2023

I.R.R.F

Nº DAM: 363378	CONTRIBUINTE 21041 - Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda	INSCRIÇÃO: 21041
TIPO / NOME LOGRADOURO: Rua José Clemente		NÚMERO: 292
COMPLEMENTO:	BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: TEOFILÂNDIA UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
		C.N.P.J.: 21.763.372/0001-40
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 3.692,62	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000
		Valor R\$ 3.692,62
		Taxa Expediente R\$:
		Valor Total R\$: 3.692,62
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 16/10/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023
		DATA EMISSÃO: 16/10/2023 02:50:38
		DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2023
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo:	3.692,62	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 3.692,62
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto: 0,00
Valor de Base Calculo:	3.692,62	Vlr. Devido com Desconto 3.692,62
INSTRUÇÕES:		
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 3.692,62
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
4) NFS-e Nº 333 - Data de emissão: 11/10/2023.		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 3.692,62



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81720000036 . 9

92623906202 . 5

31031010100 . 4

00036337807 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81720000036 . 9

92623906202 . 5

31031010100 . 4

00036337807 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2023



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 363378	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 16/10/2023 02:50:38	DATA VENCIMENTO: 31/10/2023
INSCRIÇÃO: 21041			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.692,62
Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.692,62





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2023

VALOR DA 1ª MEDIÇÃO: R\$ 307.717,97  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/10/2023 A 09/10/2023

Devido ao sistema SIGA o período da medição precisa ser necessariamente dentro do mês atual, porém os serviços estão sendo medidos desde o dia 12/09/2023.

OBJETO: contratação de empresa para execução de pavimentação na sede do município de Santaluz-BA

EMPRESA: RIBEIRO E ANTONIOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 21.763372/0001-40

Nº CONTRATO: 077/2023

OBRA Nº 089/2023

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	QUANTIDADE		VALORES		SALDO	SALDO QUANTIDADE	%
								PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
<b>BAIRRO PLANALTO LUZENSE</b>														
<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO 01</b>														
1								total						
1.1	51	ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES Placa de obra em chapas aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	394,01	478,13							0,00%
2														
2.1	90778	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,058300	120,34	146,09	80,00	440,00	11,862,40	89.954,48	89.954,48	816,00	58,33%
3														
3.1	101169	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS; REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO DE AREIA) AF_06/2016	m²	267748,21	81,28	98,83	2,513,91	15,043,31	247,948,94	1,151,495,36	1,151,495,36	11,674,90	43,70%
3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEDIDO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CANTO PRE- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X33X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS USO VARIADO, AF_06/2016	M	9,838,82	45,55	56,28	869,91	5,849,61	48,086,62	323,366,44	220,578,80	3,990,21	40,55%
4														
4.1	4249	ORSE	SINALIZAÇÃO VERTICAL Confeccção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapas de aço galvanizado nº 18 (80x80 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvne ou similar), 02 demãos de esmalte e instalação em película reflexiva, auto adesiva	Un	114,00	122,50	148,65						114,00	100,00%
4.2	73916002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM	UN	76,00	105,60	128,14						76,00	100,00%
						<b>Total Geral</b>				<b>R\$ 307.717,97</b>	<b>R\$ 1.874.210,09</b>	<b>R\$ 1.488.713,40</b>		<b>44,27%</b>

**FYLLIPE DE OLIVEIRA**  
Assinado de forma digital por FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.10.09 10:08:53 -03'00'

**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8



**MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA**  
**FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**

Data Impressão: 13/09/2023

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Nº 00000165/2023

Emissão: 13/09/2023

Validade: 12/12/2023

**RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA LTDA**

**CGA: 000.001.065/001-24**

**CPF/CNPJ: 21.763.372/0001-40**

**CNAE: 4120-4/00**

**RUA JOSÉ CLEMENTE,292**

**CENTRO**

**4877000 - TEOFILÂNDIA - BA**

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:



00220230000016500000097991

Emissor: VIA WEB



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20235362362**

RAZÃO SOCIAL	
<b>RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>145.741.972 - BAIXADO</b>	<b>21.763.372/0001-40</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 21/09/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 21.763.372/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:02:03 do dia 12/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2023.

Código de controle da certidão: **D86A.3E10.3888.9375**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.763.372/0001-40

Certidão nº: 45928808/2023

Expedição: 04/09/2023, às 09:46:15

Validade: 02/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.763.372/0001-40, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.763.372/0001-40  
**Razão Social:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** RUA JOSE CLEMENTE 292 A / CENTRO / TEOFILANDIA / BA / 48770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/09/2023 a 26/10/2023

**Certificação Número:** 2023092711004521987931

Informação obtida em 02/10/2023 14:10:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/10/2023 11:02:57.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GQBY4aX4dZ800007.SFP é:

028a0c64-3835-4495-99aa-ccb358969b0d

Transmissor: DENILSON CONTABILIDADE E NEGOCIOS EIRELI:11459018000172

Inscrição do Transmissor: 11459018000172

Responsável: FORTREK EMPREENDIMENTOS

Inscrição do Responsável: 00242774520

Competência: 09/2023

NRA: GQBY4aX4dZ800007

Base de Processamento: Teofilândia / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: DENILSON OLIVEIRA DE

Telefone: 007532610256





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858700000375 737401802314 007681180827 176337200013

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH N° ARQUIVO: GQBY4aX4dZ800000-7  
 COMP: 09/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPA5: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40  
 TOMADOR/OBRA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH N° DE CONTROLE: Ph0D0bLYM3I0000-7 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40  
 LOGRADOURO: R JOSE CLEMENTE 292 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: TEOFILANDIA UF: BA CEP: 48770-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	26	46.280,02	0,00	46.280,02	0,00
TOTAIS:	26	46.280,02	0,00	46.280,02	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023  
HORA: 11:01:58  
PÁG : 0004/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDENCIA

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH  
COMP: 09/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40  
TOMADOR/OBRA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH Nº DE CONTROLE: PhODOBLYM310000-7 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH  
EMPREGADO: RYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO  
RECEITA: 3.000,00  
RENTU: 0,00  
INSCRIÇÃO: 206.11230.56-3  
DATA: 01/07/2020  
CATEGORIA: 11  
RAT: 0,00  
CBO: 01421

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.000,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023  
 HORA: 11:01:58  
 PÁG : 0005/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH  
 COMP: 09/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH Nº DE CONTROLE: PH0DOB1YM310000-7  
 LOGRADOURO: R JOSE CLEMENTE 292 UF: BA CEP: 48770-000 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: TEOFILANDIA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
11	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALS:	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Nº ARQUIVO: G0BY4aX4dZ80000-7  
 INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40  
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CNAE: 4120400

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH  
 COMP: 09/2023 COD REG:150 COD GPs: 2003 FPAAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH Nº DE CONTROLE: PH0DOBLYM310000-7  
 INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40  
 LOGRADOURO: R JOSE CLEMENTE 292  
 CIDADE: TEOFILANDIA UF: BA CEP: 48770-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 TELEFONE: 0075 9997 5258 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.106.47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.106.47  
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PT: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: VALOR PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

REFERÊNCIA (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
O2 :	0	O3 :	0	O4 :	0	O5 :	0	O6 :	0	O7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023  
HORA: 11:01:58  
PÁG: 0007/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000375 737401802314 007681180827 176337200013

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH  
COMP: 09/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: STMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40  
TOMADOR/OBRA: CONST INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIV INSCRIÇÃO: 900112100971 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
GENTIVALDO DE JESUS	891,83	0,00	161.89939.86-5	0,00	01/07/2022	01	66,88			71,34		07152	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 891,83 0,00 0,00 66,88 71,34 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023  
 HORA: 11:01:58  
 PÁG : 0008/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 8587000000375 737401802314 007681180827 176337200013

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH  
 COMP: 09/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: CONST INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIV N° DE CONTROLE: FDOEFL1F122W00000-8  
 INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO: 900112100971  
 LOGRADOURO: R JOSE CLEMENTE 292 UF: BA CEP: 48770-000 BATRO: CENTRO  
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: TEOFILANDIA CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	891,83	0,00	891,83	0,00
TOTALS:	1	891,83	0,00	891,83	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH  
 COMP: 09/2023 COD REC:150 COD GRS: 2003 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: CONST INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIV N° DE CONTROLE: FDOEPLF122W0000-8  
 LOGRADOURO: R JOSE CLEMENTE 292 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: TEOFILANDIA UF: BA CEP: 48770-000 TELEFONE: 0075 9997 5258 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 66.88 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNTO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023  
HORA: 11:01:58  
PÁG : 0010/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700000375 737401802314 007681180827 176337200013

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH  
COMP: 09/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GXVB0at97d60000-8  
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2

RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: G0BY4aX4dz80000-7  
INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R JOSE CLEMENTE 292  
CIDADE: TEOFILANDIA

UF: BA

CEP: 48770-000

BATIRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	27	47.171,85	0,00	47.171,85	0,00
11	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	28	50.171,85	0,00	50.171,85	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023  
HORA: 11:01:58  
PÁG : 0011/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858700000375 737401802314 007681180827 176337200013

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH  
COMP: 09/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GXVD0at97d60000-8  
PPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2

Nº ARQUIVO: GQBY4aX4dz80000-7  
INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R JOSE CLEMENTE 292  
CIDADE: TEOFILANDIA

UF: BA CEP: 48770-000

BARRIO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	47.171,85
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	27

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	3.773,74





RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000375 737401802314 007681180827 176337200013

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40 N° ARQUIVO: GQBY4aX4dz80000-7  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: GXvb0at97d60000-8  
TOMADOR/OBRA : RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40 N° CONTROLE: Ph0DOB1yM3I00000-7  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE N° CONTROL: Ph0DOB1yM3I00000-7  
R JOSE CLEMENTE 292 CENTRO TEOFILANDIA CEP UF  
48770000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	46.280,02	REM SEM 13° SALÁRIO	46.280,02
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	3.702,40
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	26	TOTAL TRABALHADORES	26

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.000,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
858700000375 737401802314 007681180827 176337200013

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 09/2023  
TOMADOR/OBRA : RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E  
LOGRADOURO INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40 N° ARQUIVO: GQBY4aX4dz80000-7  
R JOSE CLEMENTE 292 BAIRRO INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40 N° CONTROLE: Ph0DOB1ym310000-7  
CENTRO CIDADE CEP UF  
TEOFILANDIA 48770000 BA

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDENCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	49.280,02	REM SEM 13° SALÁRIO	46.280,02
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.106,47	DEPÓSITO	3.702,40
VAL DEVIDO PREV SOC	4.106,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	27	TOTAL TRABALHADORES	26

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000375 737401802314 007681180827 176337200013

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40 N° ARQUIVO: GQBY4aX4dz80000-7  
 FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 09/2023 N° CONTROLE: GXvb0at97d60000-8  
 TOMADOR/OBRA : CONST INSTALACOES ESPORTIVAS E INSCRIÇÃO: 900112100971 N° CONTROLE: FDEr1lF1z2w0000-8  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
 PRACA JOAO SOARES MOURA 103 CENTRO NORDESTINA 48870000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	891,83	REM SEM 13° SALÁRIO	891,83
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	71,34
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	891,83	REM SEM 13° SALÁRIO	891,83
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	66,88	DEPÓSITO	71,34
VAL DEVIDO PREV SOC	66,88	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000375 737401802314 007681180827 176337200013

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40 N° ARQUIVO: G0BY4aX4dz80000-7  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 09/2023  
N° CONTROLE: GXvb0at97d60000-8

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 50.171,85	REM SEM 13° SALÁRIO 47.171,85
REM BASE CALC 13° SAL 0,00	REM 13° SALÁRIO 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 4.173,35	DEPÓSITO 3.773,74
VAL DEVIDO PREV SOC 4.173,35	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 28	TOTAL TRABALHADORES 27

TOTAL A RECOLHER 3.773,74

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EPAS EMPRESA

EMPRESA: RIBEIRO E ANOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH Nº CONTROLE: GXVD0at97460000-8 N° ARQUIVO: GQB44x4d4z80000-7  
 COMP: 09/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 EPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40  
 FOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADURO: R JOSE CLEMENTE 292 CEP: 48770-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: TEofilândia UF: BA TELEFONE: 0075-99975258 CNAE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGUERADO		EMPREGADOS/AVULSOS		EMPRESA		TOTAL	
Empregados/Avulsos	3.843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,35	0,00
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,35	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,35	0,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 5.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH			21.763.372/0001-40		2003	507
4.173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,35	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 03/10/2023  
HORA: 11:01:58  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENH  
COMPETÊNCIA: 09/2023 CÔD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 21.763.372/0001-40  
SIMPLES: 2

-----  
FGTS - 8%  
QTDDE TRABALHADORES 27  
REMUNERAÇÃO 47.171,85  
DEPÓSITO 3.773,74  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL A RECOLHER 3.773,74  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



CNPJ  
**21.763.372/0001-40**

Razão Social  
**RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Setembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/10/2023**

Número do Documento  
**07.16.23276.7739451-0**

Pagar este documento até  
**20/10/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000166555333**

Valor Total do Documento  
**293,82**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	293,82			293,82
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	<b>Totais</b>	<b>293,82</b>			<b>293,82</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 93820385232 4 93071623276 5 77394510000 0



CNPJ: 21.763.372/0001-40  
Número: 07.16.23276.7739451-0  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 293,82

Pague com o PIX

QR Code  
Indisponível  
Utilize o Código  
de Barras

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	21.763.372/0001-40
Nome	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	09/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	57277043 / Reinf CP 21938550132 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.125,82	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 205,11	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 293,82	R\$ 293,82
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.624,75	R\$ 293,82

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF	041.804.115-63
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	03/10/2023 11:11:28
Nº do recibo de entrega	0000050000166555333

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	CNPJ	21.763.372/0001-40
Período apuração	09/2023	Número do Recibo	50000166555333
Data/Hora da Transmissão	03/10/2023 11:11:28	Identificação da Apuração de Débitos	57277043 / Reinf CP 21938550132 / eSocial

**Dados Iniciais**

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

**Endereço**

Logradouro	JOSE CLEMENTE	Número	292
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	Teofilândia	UF	BA
CEP	48770000	Telefone	7599752587
Correio Eletrônico	RIBEIROEANJOS.ENGENHARIA@GMAIL.COM		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

Representante	FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	CPF	04180411563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO		
CPF	04180411563	CRC	-
UF	-	Telefone	7532610256
Correio Eletrônico	FOR_FYLLIPE@HOTMAIL.COM		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.21009/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	26,75		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 26,75		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.21009/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	178,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 178,36		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	3.795,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.795,82		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	330,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 330,00		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	293,82		
Saldo a Pagar	293,82		

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 21.763.372/0001-40

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2023

Código: 14  
 Nome do Funcionário: ADAGILSON RODRIGUES DOS SANTOS  
 PEDREIRO

CBO: 715210  
 Admissão: 03/08/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.229,58	180,86
998	I.N.S.S.	8,11		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.229,58	180,86
			<b>Valor Líquido</b> →	2.048,72
<b>Salário Base</b>			<b>Salário Líquido</b>	<b>Valor a Pagar</b>
2.229,58			2.048,72	0,00

24/09/2023  
 Adagilson R.D.S.

PIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
 C.J.: 21.763.372/0001-40

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2023

Nome do Funcionario: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO DE JESUS PEDREIRO  
 CBO: 715210  
 Admissão: 03/09/2022  
 Departamento: 1  
 PNU: 1

Seq	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.229,58	180,86
998	I.M.S.S.	8,11		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.229,58	180,86
			<b>Valor Líquido</b> →	2.048,72
<b>Salário Base</b>			<b>Salário Base</b>	<b>Salário Base</b>
2.229,58			2.229,58	178,36
			<b>Outros Vencimentos</b>	<b>Outros Vencimentos</b>
			2.048,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/12/2023

Data

*Antonio Carlos do Nascimento de Jesus*  
 Assinatura do Funcionário

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 21.763.372/0001-40

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2023

Código: 15  
 Nome do Funcionario: RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS  
 Servente Comum

CPF: 717020  
 Admissão: 03/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 098	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220:00 7,51	1.332,98	100,16
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.332,98	100,16
			Valor Líquido	1.232,82
			Salário Base	1.332,98
			Sal. Contrib. INSS	106,63
			Base Calc. FGTS	1.332,98
			FGTS 40 Mes	106,63
			Base Calc. IRRF	1.232,82
			IRRFA 10%	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/10/2023

Data

Ronaldo Rodrigues dos Santos  
 Assinatura do Funcionário

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 21.763.372/0001-40

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2023

Código: 7 Nome do Funcionário: HELOISA LAYANE RODRIGUES MARIANO  
 CBO: 214205 Departamento: 1 Filial: 1  
 Admissão: 01/10/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.500,00	205,20
998	I.N.S.S.	8,21		13,71
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
Total da Vencimentos 2.500,00			Total de Descontos 218,91	
Valor Líquido ⇨			2.281,09	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.294,80	7,50

\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE SETEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Data: 04.10.2023  
 Assinatura do Funcionário: 

IBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
 NPJ: 21.763.372/0001-40

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2023

Código: 21 Nome do Funcionário: ISABELA DE JESUS MARQUES SANTOS  
 CBO: 312105 Departamento: 1  
 Admissão: 01/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	29:20	176,00	
3	HORAS FERIAS	190:40	1.144,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	381,33	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.405,22
812	INSS FERIAS	7,88		120,11
998	I.N.S.S.	7,50		13,20
Total de Vencimentos			1.701,33	1.538,53
Valor Líquido			⇒ 162,80	

Salário Base: 1.320,00 Sal. Contr. INSS: 1.701,33 Base Calc. FGTS: 1.701,33 FGTS do Mês: 136,10 Base Calc. IRRF: 162,80 Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/10/2023

Isabela de J. M. Santos

Data

Assinatura do Funcionário



RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 21.763.372/0001-40

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2023

Código: 22 Nome do Funcionário: KEYNE PRISCILLA DA SILVA  
Auxiliar Administrativo  
CBO: 411010 Departamento: 1 Fim: 1  
Admissão: 01/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220:00 7,50	1.320,00	99,00
Salário Base			1.320,00	
Sal. Contrib. INSS			1.320,00	
Base Calc. FGTS			1.320,00	
FGTS do Mês			105,60	
Base Calc. IRPF			1.221,00	
Faixa IRPF				0,00
Valor Líquido			1.221,00	
Total de Vencimentos			1.320,00	
Total de Descostos				99,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

09/10/2023

Data

Keyne Priscilla da Silva  
Assinatura do Funcionário

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 21.763.372/0001-40

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2023

Código 23 Nome do Funcionário LAZARO SOUZA CONCEIÇÃO  
MEIO OFICIAL DE PINTURA

CB0 716610 Departamento 1  
Admissão: 01/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.550,00	
998	I.N.S.S.	7,72		119,70
Total de Vencimentos			1.550,00	119,70
Valor Líquido			1.430,30	
Salário Base			1.550,00	
Sal. Contr. INSS			1.550,00	
Base Calc. FORTS			1.550,00	
FGTS do Mês			124,00	
Base Calc. IRRF			1.430,30	
Faixa IRRF				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

09/10/2023

Data

*Lazaro S. Conceição*

Assinatura do Funcionário

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 21.763.372/0001-40

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2023

Código 33 Nome do Funcionário LUCIANO DE JESUS SANTOS  
 SERVENTE COMUM

CGO 717020 Departamento 1 Filial 1  
 Admissão: 23/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.332,98	
998	I.N.S.S.	7,51		100,16
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.332,98	100,16
			<b>Valor Líquido</b> ⇨	1.232,82
<b>Salário Base</b>			<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>
1.332,98			1.332,98	1.332,98
			<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>
			106,63	1.232,82
				<b>Faixa IRRF</b>
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Luciano de Jesus Santos*  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 21.763.372/0001-40

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário  
 32 MAX DOS SANTOS NUNES  
 PEDREIRO

CBO Departamento Fonei  
 715210 1 1  
 Admissão: 05/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.229,58	
998	I.N.S.S.	8,11		180,86
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.229,58	180,86
			Valor Líquido	2.048,72
			⇒	
Salário Base			Sal. Contr. INSS	Base Calc. IRRF
2.229,58			2.229,58	0,00
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			2.229,58	178,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

09/10/2023

Data

*Max dos Santos Nunes*  
 Assinatura do Funcionário

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 21.763.372/0001-40

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2023

Código: 29  
 Nome do Funcionário: VANDERSON DE JESUS SILVA  
 PEDREIRO

CBO: 715210  
 Departamento: 1  
 Admissão: 17/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220:00 8,11	2.229,58	180,86
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>
			2.229,58	180,86
			<b>Valor Líquido</b> ⇨	2.048,72
			<b>Salário Base</b>	<b>Faixa IRPF</b>
			2.229,58	0,00
			<b>Sal. Contr. INSS</b>	
			2.229,58	
			<b>Base Calc. FGTS</b>	
			2.229,58	
			<b>FGTS do Mês</b>	
			178,36	
			<b>Base Calc. IRPF</b>	
			1.479,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/10/2023

Data

Vanderson Silva

Assinatura do Funcionário

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 21.763.372/0001-40

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2023

Código 31 Nome do Funcionário VICTOR EMANOEL RODRIGUES MARIANO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Cargo 411010 Departamento 1 Filial 1  
Admissão: 17/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220:00 7,50	1.320,00	99,00

Total de Vencimentos	1.320,00	Total de Descontos	99,00
Valor Líquido	⇒ 1.221,00		

Salário Base 1.320,00  
Sal. Contrib. INSS 1.320,00  
Base Calc. FGTS 1.320,00  
FGTS do Mês 105,60  
Base Calc. IRRF 1.221,00  
Folha IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Victor Emanuel Rodrigues Mariano*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO N° 072-2023 LICITAÇÃO N° 002-2022 RDO: 154				S	X							
					T	Q	Q	S	S	D		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL								
SIMBOLOGIA: COLOCAÇÃO DE MEIO FIO ESPALHAMENTO DE PARALELOS ASSENTAMENTO DE PARALELOS				CATEGORIA					QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra					1			
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral					1			
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro					1			
				Ajudante Geral					2			
				Calceteiro					4			
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Monitor/Eletricista								
				Electricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO					QTDE.			
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 12/09/2023				Data: 12/09/2023								

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Assinado de forma digital por  
 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.10.16 10:05:32 -03'00'

  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO N° 072-2023 LICITAÇÃO N° 002-2022 RDO: 155		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		MAO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA: ESPALHAMENTO DE PARALELOS ASSENTAMENTO DE PARALELOS				Garante de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1				
SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências				Hh DO DIA				
				MAO DE OBRA DIRETA				
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceteiro 4 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro				
				Hh DO DIA				
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO				
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS				
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória				
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/09/2023		Data: 13/09/2023						

FYLLIPE DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por  
 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.10.16 10:06:04 -03'00'

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 156		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MAO DE OBRA INDIRETA							
ESPALHAMENTO DE PARALELOS ASSENTAMENTO DE PARALELOS		Gerente de Obra						1	
		Engenheiro							
		Tec. de Segurança							
		Aux. Adm.							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral						1	
		Hh DO DIA							
		MAO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
Pedreiro						1			
Ajudante Geral						2			
Calceiteiro						4			
Carpinteiro									
Operador de Motosserra									
Motorista									
Montador									
Montador/Eletricista									
Electricista									
Operador de Patrol									
Operador de Escavadeira									
Operador de Pá carregadeira									
Motorista de caçamba									
Pintor									
Serralheiro									
Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO							
		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO					QTDE.		
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/09/2023		Data: 14/09/2023							

FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO:04180411563  
 Assinado de forma digital por FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.10.16 10:06:20 -03'00'

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDC: 157			S	T	Q	Q	X	S	S	D
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva al/cond. Trab. 3- Chuva al/cond. Trab.			EFETIVO PESSOAL							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			CATEGORIA				QTDE			
ASSENTAMENTO DE PARALELOS REJUNTAMENTO DE PEDRAS			MÃO DE OBRA INDIRETA							
			Gerente de Obra							1
			Engenheiro							
			MÃO DE OBRA DIRETA							
			Topografo							
			Auxiliar de topografia							
			Pedreiro							1
			Ajudante Geral							2
			Caloteiro							4
			Carpinteiro							
			Operador de Motosserra							
			Motorista							
			Montador							
			Montador/Eletricista							
			Eletricista							
			Operador de Patrol							
			Operador de Escavadeira							
			Operador de Pá carregadeira							
			Motorista de caçamba							
			Pintor							
			Serralheiro							
			Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO							
			EFETIVO DO DIA							
			JORNADA DE TRABALHO							
			Hh DO DIA							
			Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
			TIPO				QTDE.			
			Veículo Leve							
			Caminhão Munck							
			Caminhão Toco							
			Escavadeira							
			Pá carregadeira							
			Caçamba							
			Patrol							
			PC 200							
			Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/09/2023			Data: 15/09/2023							

FYLLIPE DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por  
 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.10.16 10:06:36 -03'00'

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.089.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 158						S	T	Q	Q	S	X	S	D	
						EFETIVO PESSOAL							CATEGORIA	
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA								
SEM SERVIÇO						Gerente de Obra								
						Engenheiro								
						Téc. de Segurança								
						Aux. Adm.								
						Mestre de obra								
						Elicarregado geral								
						Hh DO DIA								
												MÃO DE OBRA DIRETA		
Topógrafo														
Auxiliar de topografia														
Pedreiro														
Ajudante Geral														
Caldeiro														
Carpinteiro														
Operador de Motosserra														
Motorista														
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor														
Serralheiro														
Hh DO DIA														
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
Hh ACUMULADO														
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO							QTDE.	
						Veículo Leve								
						Caminhão Munck								
						Caminhão Toco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
						Placa Vibratória								
						GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:		
Data: 16/09/2023						Data: 16/09/2023								

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Assinado de forma digital por  
 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.10.16 10:06:52 -03'00'

  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 158		S	T	Q	Q	S	S	X
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.	CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MAO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra						
		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		MAO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calçeteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
OBSERVAÇÕES		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
GERENTE DE OBRA:		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
FISCALIZAÇÃO:		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE						
Data: 17/09/2023		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
Data: 17/09/2023		Data: 17/09/2023						

FYLLIPE DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por  
RIBEIRO:0418041156 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
3 Dados: 2023.10.16 10:07:10 -03'00'

  
**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO N° 072-2023 LICITAÇÃO N° 002-2022 RDO: 160						S	X	T	q	q	S	S	D
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )						EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ contd. Trab. 3- Chuva s/ contd. Trab.						CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
ASSENTAMENTO DE PARALELOS REJUNTAMENTO DE PEDRAS						Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA							
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceiteiro 4 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/09/2023						Data: 18/09/2023							

**FYLLIPE DE OLIVEIRA** Assinado de forma digital por  
**RIBEIRO:04180411563** FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 3 Dados: 2023.10.16 10:07:50 -03'00'

  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	X							
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO N° 072-2023 LICITAÇÃO N° 002-2022 RDO: 164				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE				
ASSENTAMENTO DE PARALELOS REJUNTAMENTO DE PEDRAS				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra				1				
				Engenheiro				1				
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral				1				
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro				1				
				Ajudante Geral				2				
				Calçeteiro				4				
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 19/09/2023				Data: 19/09/2023								

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Assinado de forma digital por  
 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.10.16 10:08:11 -03'00'

  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069-877.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 162				S	T	x	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA		QTDE				
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
ASSENTAMENTO DE PARALELOS REJUNTAMENTO DE PEDRAS				Garante de Obra		1				
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia		1				
				Pedreiro		2				
				Ajudante Geral		4				
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Petrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Manck						
				Caminhão Topo						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Petrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 20/09/2023				Data: 20/09/2023						

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:0418041156  
 3

Assinado de forma digital por  
 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.10.16 10:08:43 -03'00'

  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.000-077,8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 183						S	T	Q	Q	X	S	S	D
						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA	Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		CATEGORIA		QTDE				
	1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  ASSENTAMENTO DE PARALELOS REJUNTAMENTO DE PEDRAS ATERRÇO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO						Garante de Obra							
						Engenheiro							
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Elicarregado geral		1					
						Hh DO DIA							
												MAO DE OBRA DIRETA	
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro		1					
						Ajudante Geral		2					
						Calceteiro		4					
						Carpinteiro							
						Operador de Motoserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO		QTDE.					
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
Patrol													
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/09/2023						Data: 21/09/2023							

**FYLLIPE DE OLIVEIRA**  
**RIBEIRO:04180411563**

Assinado de forma digital por  
 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.10.16 10:09:10 -03'00'

  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.000.000-77.8





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data													
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 185						S	T	Q	Q	S	X	S	D						
						EFETIVO PESSOAL													
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )						CATEGORIA													
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA													
SEM SERVIÇO						Gerente de Obra													
						Engenheiro													
						Tec. de Segurança													
						Aux. Adm.													
						Mestre de obra													
						Encarregado geral													
													Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA													
						Topógrafo													
						Auxiliar de topografia													
						Pedreiro													
						Ajudante Geral													
						Calçateiro													
						Carpinteiro													
						Operador de Motosserra													
						Motorista													
						Montador/Eletricista													
						Eletricista													
						Operador de Patrol													
						Operador de Escavadeira													
						Operador de Pá carregadeira													
						Motorista de caçamba													
						Pintor													
						Serralheiro													
													Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO													
						EFETIVO DO DIA													
						JORNADA DE TRABALHO													
						Hh DO DIA													
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO													
						EFETIVO EQUIPAMENTOS													
						TIPO							QTDE.						
						Veículo Leve													
						Caminhão Munck													
						Caminhão Toco													
						Escavadeira													
						Pá carregadeira													
						Caçamba													
						Patrol													
						PC 200													
Placa Vibratória																			
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:													
Data: 23/09/2023						Data: 23/09/2023													

FYLLIPE DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por  
 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.10.16 10:10:04 -03'00'

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.059.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
		EFETIVO PESSOAL						
		CATEGORIA			QTDE			
		MAO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS		Garante da Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral  Hh DO DIA						
SEM SERVIÇO		MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro  Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPC QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/09/2023		Data: 24/09/2023						

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.10.16 10:10:29 -03'00'

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data																								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 167					<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>T</td> <td>Q</td> <td>Q</td> <td>S</td> <td>S</td> <td>D</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							X									S	T	Q	Q	S	S	D		
					X																								
S	T	Q	Q	S	S	D																							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.					EFETIVO PESSOAL																								
					CATEGORIA							QTDE																	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO COLOCAÇÃO DE MEIO FIO					MÃO DE OBRA INDIRETA																								
					Gerente de Obra							1																	
					Engenheiro																								
					Tec. de Segurança																								
					Aux Adm																								
					Mestre de obra																								
					Encarregado geral							1																	
					Hh DO DIA																								
					MÃO DE OBRA DIRETA																								
					Topografo																								
					Auxiliar de topografia																								
					Pedreiro							1																	
					Ajudante Geral							2																	
					Caloteiro							4																	
					Carpinteiro																								
					Operador de Motosserra																								
					Motorista																								
					Montador																								
					Montador/Eletricista																								
					Eletricista																								
					Operador de Patrol																								
					Operador de Escavadeira																								
					Operador de Pá carregadeira																								
					Motorista de caçamba																								
					Pinter																								
					Serralheiro																								
					Hh DO DIA																								
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO																								
					EFETIVO DO DIA																								
					JORNADA DE TRABALHO																								
					Hh DO DIA																								
					Hh ACUMULADO																								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS																								
					TIPO							QTDE.																	
					Veículo Leve																								
					Caminhão Munck																								
					Caminhão Toco																								
					Escavadeira																								
					Pá carregadeira																								
					Caçamba																								
					Patrol																								
					PC 200																								
					Placa Vibratória																								
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:																								
Data: 25/09/2023					Data: 25/09/2023																								

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Assinado de forma digital por  
 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.10.16 10:10:51 -03'00'

  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.066/677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	X							
					T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				CATEGORIA								
CONTRATO N° 072-2023				QTDE								
LICITAÇÃO N° 002-2022				MÃO DE OBRA INDIRETA								
RDO: 168				MÃO DE OBRA DIRETA								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )												
SÍMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO COLOCAÇÃO DE MEIO FIO ESPALHAMENTO DE PARALELO				Engenheiro								
				Téc. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
								Topógrafo				
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Calçeteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTDE.								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 26/09/2023				Data: 26/09/2023								

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Assinado de forma digital por  
 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.10.16 10:11:15 -03'00'

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677-8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO N° 072-2023 LICITAÇÃO N° 002-2022 RDO: 189		S	T	X	Q	S	S	D
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA		CATEGORIA						
1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra						
COLOCAÇÃO DE MEIO FIO ESPALHAMENTO DE PARALELO		Engenheiro 1						
		Tec. de Segurança						
		Aux. Adm.						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro 1						
		Ajudante Geral 2						
		Calceiteiro 4						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletrocista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
Pintor								
Serralheiro								
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		QTDE.						
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
Patrol								
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 27/09/2023		Data: 27/09/2023						

FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO:04180411563  
 Assinado de forma digital por FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.10.16 10:11:41 -03'00'

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro CREA-BA: 052.065.177.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 170				S	T	Q	X		S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA							QTDE
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  COLOCAÇÃO DE MEIO FIO ESPALHAMENTO DE PARALELO ASSENTAMENTO DE PARALELO				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Garante de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Caloteiro 4 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							QTDE.
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/09/2023				Data: 28/09/2023							

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.10.16 10:12:20 -03'00'

  
Tony Fyllix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.099.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 171				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA		QTDE					
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
COLOCAÇÃO DE MEIO FIO ESPALHAMENTO DE PARALELO ASSENTAMENTO DE PARALELO				Engenheiro 1							
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
				Ajudante Geral 2							
				Calefiteiro 4							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
Pintor											
Serra-fleto											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leva							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toca							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
Patrol											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 29/09/2023				Data: 29/09/2023							

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.10.16 10:12:52 -03'00'

  
Tony Felix Andrade  
Engenheiro C-11  
CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO N° 072-2023 LICITAÇÃO N° 002-2022 RDO: 172				S	T	Q	Q	S	X	D		
				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				QTDE		
SEM SERVIÇO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
								Hh DO DIA				
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO				
								EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS				
								TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncie Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória				
GERENTE DE OBRA:								FISCALIZAÇÃO:				
Data: 30/09/2023				Data: 30/09/2023								

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.10.16 10:13:25 -03'00'

  
Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.049.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 173				S	T	Q	Q	S	S	X
										D
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL		CATEGORIA		QTDE		
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro Tac. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 01/10/2023				Data: 01/10/2023						

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563


Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.10.16 10:13:58 -03'00'

  
Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.059.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 174					X								
					S	T	Q	Q	S	S	D		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					EFETIVO PESSOAL								
SIMBOLOGIA					CATEGORIA			QTDE					
COLOCAÇÃO DE MEIO FIO ESPALHAMENTO DE PARALELO ASSENTAMENTO DE PARALELO					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceiteiro 4 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
OBSERVAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
GERENTE DE OBRA:					EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
Data: 02/10/2023					Data: 02/10/2023								


FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.10.16 10:14:31 -03'00'

  
Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 175				S	X								
					T	Q	Q	S	S	D			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				EFETIVO PESSOAL									
SIMBOLOGIA				CATEGORIA									
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA									
COLOCAÇÃO DE MEIO FIO ASSENTAMENTO DE PARALELO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
				Gerente de Obra									1
				Engenheiro									
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral									1
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro									1
				Ajudante Geral									2
				Calceteiro									4
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Serralheiro													
Hh DO DIA													
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
Hh ACUMULADO													
GERENTE DE OBRA: Data: 03/10/2023				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO									QTDE.
				Veículo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
Placa Vibratória													
FISCALIZAÇÃO: Data: 03/10/2023													


**FYLLIPE DE OLIVEIRA** Assinado de forma digital por  
**RIBEIRO:0418041156** FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 3 Dados: 2023.10.16 10:15:04 -03'00'

  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.033.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 176		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE				
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
REJUNTAMENTO DE PARALELO		Gerente de Obra		1				
ASSENTAMENTO DE PARALELO		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral		1				
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro		1				
		Ajudante Geral		2				
		Calçeteiro		4				
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Monitorador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/10/2023		Data: 04/10/2023						

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.10.16 10:15:46 -03'00'

  
Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.066.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO N° 072-2023 LICITAÇÃO N° 002-2022 RDO: 177		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
REJUNTAMENTO DE PARALELO ASSENTAMENTO DE PARALELO		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calçeteiro 4 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO				QTDE.		
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toso Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 05/10/2023		Data: 05/10/2023						

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.10.16 10:17:59 -03'00'

  
Tony Felix Andrade  
Engenheiro CREA  
CREA-BA: 052.019.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 178				S	T	Q	Q	X	S	S	D	
				EFETIVO PESSOAL							QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA								
SIMBOLOGIA				MAO DE OBRA INDIRETA								
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
REJUNTAMENTO DE PARALELO ASSENTAMENTO DE PARALELO				Gerente de Obra								
				Engenheiro							1	
				Tec. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral							1	
				Hh DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro							1	
				Ajudante Geral								
				Calceiteiro							4	
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTDE.	
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
Patrol												
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 06/10/2023				Data: 06/10/2023								


FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.10.16 10:21:03 -03'00'

  
Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.010.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO N° 072-2023 LICITAÇÃO N° 002-2022 RDO: 179				S	T	Q	Q	S	X	S	D
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE			
SEM SERVIÇO				MAO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Caloteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motoeira							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 07/10/2023				Data: 07/10/2023							

FYLLIPE DE OLIVEIRA Assina do de forma digital por  
 RIBEIRO:04180411563 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.10.16 10:26:37 -03'00'

  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.089.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO N° 072-2023 LICITAÇÃO N° 002-2022 RDO: 180				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ contd. Trab. 3- Chuva s/ contd. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				Garante de Obra Engenheiro Tco. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/10/2023				Data: 08/10/2023						

**FYLLIPE DE OLIVEIRA**  
 RIBEIRO:04180411563  
 Assinado de forma digital por  
 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
 RIBEIRO:04180411563  
 Dados: 2023.10.16 10:27:49 -03'00'

  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.049.877.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 181				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA		QTDE		
REJUNTAMENTO DE PARALELO				MAO DE OBRA INDIRETA								
ASSENTAMENTO DE PARALELO				Gerente de Obra						1		
				Engenheiro								
				Téc. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral						1		
				Hh DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro						1		
				Ajudante Geral						2		
				Calçateiro						4		
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eleticista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 09/10/2023				Data: 09/10/2023								

FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.10.16 10:29:19 -03'00'

Tony F. Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.035.877.8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 [www.santaluz.ba.gov.br](http://www.santaluz.ba.gov.br)



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – Pavimentação de Ruas no Bairro Planalto Luzense no município de Santaluz -BA, Conforme Obra nº 089/2023 e Contrato nº 072-2023.

Data	Município	Empresa
05/10/2023	Santaluz – Ba	Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia LTDA:21.763.372/0001-40

IMAGEM 01



Execução de Pavimentação da Cantinho da saude Rua 01

IMAGEM 02



Execução de Pavimentação da Cantinho da saude Rua 02

**Tony Félix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8

**FYLLIPE DE OLIVEIRA**  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.10.16 10:36:42 -03'00'



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.


Telefone: 75 3265-2843 [www.santaluz.ba.gov.br](http://www.santaluz.ba.gov.br)



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – Pavimentação de Ruas no Bairro Planalto Luzense no município de Santaluz -BA, Conforme Obra nº 089/2023 e Contrato nº 072-2023.**

Data	Município	Empresa
05/10/2023	Santaluz – Ba	Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia LTDA:21.763.372/0001-40

IMAGEM 03

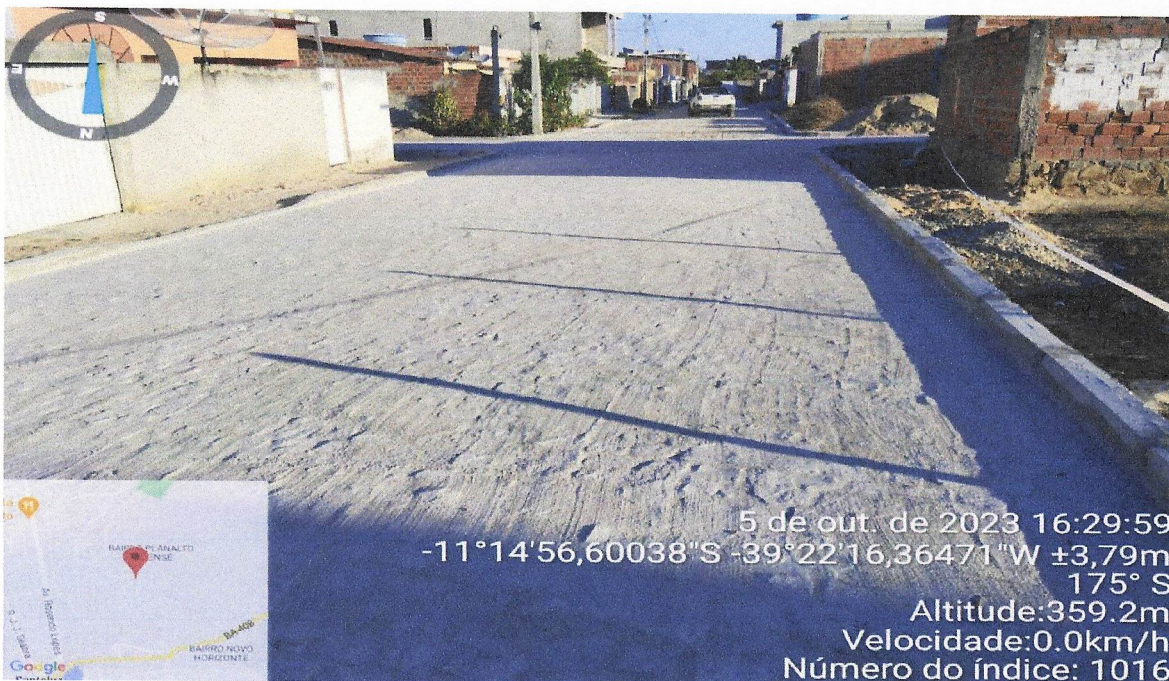

Execução de Pavimentação da Cantinho da saude Rua 03



Execução de Pavimentação da Cantinho da saude Rua 03

**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.059.677.8

IMAGEM 04

**FYLLIPE DE OLIVEIRA**  
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.10.16 10:37:00 -03'00'




# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 [www.santaluz.ba.gov.br](http://www.santaluz.ba.gov.br)




## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – Pavimentação de Ruas no Bairro Planalto Luzense no município de Santaluz -BA, Conforme Obra nº 089/2023 e Contrato nº 072-2023.

Data	Município	Empresa
05/10/2023	Santaluz – Ba	Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia LTDA:21.763.372/0001-40

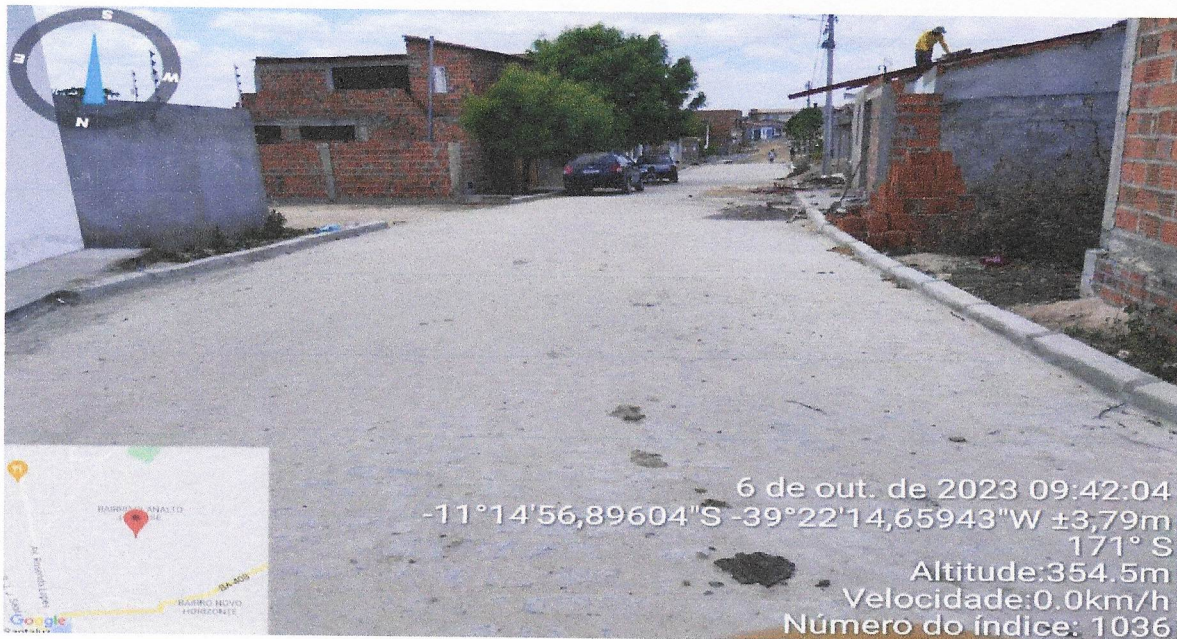

Execução de Pavimentação do Cantinho da saude Rua 04

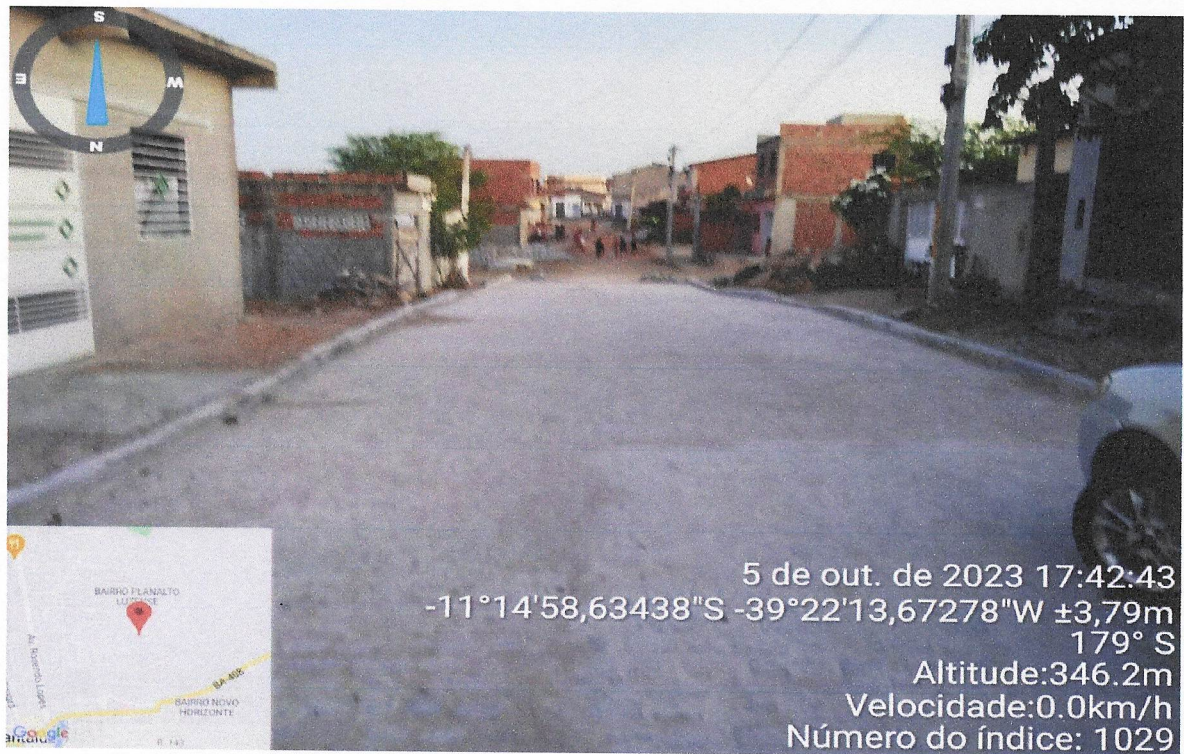

Execução de Pavimentação do Cantinho da saude Rua 04

  
**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8

IMAGEM 05

**FYLLIPE DE OLIVEIRA**  
Assinado de forma digital por  
FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.10.16 10:37:31 -03'00'



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 [www.santaluz.ba.gov.br](http://www.santaluz.ba.gov.br)



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – Pavimentação de Ruas no Bairro Planalto Luzense no município de Santaluz -BA, Conforme Obra nº 089/2023 e Contrato nº 072-2023.**

Data	Município	Empresa
05/10/2023	Santaluz – Ba	Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia LTDA:21.763.372/0001-40



Execução de Pavimentação do Cantinho da saude Rua 07



Execução de Pavimentação do Cantinho da saude Rua 07

  
**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8

**FYLLIPE DE OLIVEIRA** Assinado de forma digital por  
RIBEIRO:04180411563 FYLLIPE DE OLIVEIRA  
RIBEIRO:04180411563  
Dados: 2023.10.16 10:37:52 -03'00"
