



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LETTAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 230-2022

EMPENHO: 1039 / 2023

Data do Empenho: 16/11/2023

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome:	5398 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI		Tipo Pessoa:	Jurídica	
Endereço:	TV SAO JOSE II, 55		Complemento:	GALPAO04	
Bairro:	TIMBO	Cidade:	ESPLANADA	Estado:	BA
CNPJ:	21.450.165/0001-35	Insc. Estadual:	CPF:	RG:	
Conta Corrente:	39294-4	Agência:	3679	Banco:	237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	1007.4451.90	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função:	15 - Urbanismo	
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade:	Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI	Nº Lic.:	009-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	-	Contrato:	284-2022	205.757,65	110.904,64	94.853,01
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA, NO POVOADO DE SISLÂNDIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº009-2022, CONTRATO Nº284-2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº05, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/10/2023 A 31/10/2023, NFS-e.Nº140.

Data do Empenho:	16/11/2023	Data do Liquidação:	16/11/2023
------------------	------------	---------------------	------------



RETENÇÕES			
Código	Descrição	Valor	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	7.319,71	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	1.330,86	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	3.327,14	
## Noventa e oito mil e novecentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos ##		Valor Retido	11.977,71
		Valor Líquido	98.926,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	09/11/2023	140	UN			110.904,64

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	110.904,64

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/11/2023.</p>  <p>ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/11/2023, podendo efetuar o pagamento.</p>  <p>WALDSON LOPES DE GÓES FILHO Contador(a) CPF: 024.127.355-22</p>
---	---

3273298

**Prefeitura Municipal de Esplanada**Praça Monsenhor Zacarias Luz, S/N
Centro - Esplanada - BA CEP: 48370-000
CNPJ: 13.885.231/0001-71**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**Número da Nota
00000140Data e Hora de Emissão
09/11/2023 18:17:07Data do Fato Gerador
09/11/2023Código de Verificação
AAAREKCU-AUAEGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível	Local da Prestação SANTALUZ/BA - BRASIL	Local da Incidência SANTALUZ/BA
---	--	------------------------------------

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**
 Nome Fantasia: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS**
 Endereço: **TRV SÃO JOSE II, 316 GALPÃO 04
 TIMBO ESPLANADA - BA CEP: 48370-000**
 CPF/CNPJ: **21.450.165/0001-35** Insc. Municipal: **2721**
 Telefone: **(71) 9.9642-1002** E-mail: **STARTSOLUCOESINTEGRADAS@GMAIL.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SANTALUZ**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **PRAÇA CORONEL JOSE LEITAO, 05 TERREO
 CENTRO SANTALUZ - BA CEP: 48880-000**
 CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19** Insc. Municipal:
 Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICIPIO DE SANTALUZ.

OBRA 054/2022
 RDC N°009/2022
 CONTRATO N° 284 /2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 230/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 05
 PERÍODO 01/10/2023 A 31/10/2023
 VALOR TOTAL= R\$ 110.904,64
 MATERIAL 40% R\$ 44.361,86
 MÃO DE OBRA 60% R\$ 66.542,78

BASE DE CÁLCULO DO INSS 11% - R\$ 66.542,78 x 11% = R\$ 7.319,71
 VALOR DO ISS 5% - R\$ 66.542,78 x 5% = R\$ 3.327,14
 BASE DE CÁLCULO DO IR 1.2% R\$ 110.904,64 = R\$ 1.330,86

Página 1 de 2

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outrasClassificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

Valor do(s) Serviço(s) 110.904,64	Valor Dedução 44.361,86	Desconto Incondicionado 0,00	Base de Cálculo ISS 66.542,78
Alíquota ISS (%) 5,00	Valor do ISS 0,00	Valor ISS Retido 3.327,14	Desconto Condicionado 0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda 1.330,86	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 7.319,71	Outras Retenções 0,00
-------------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------------

Total

Total do(s) Serviço(s) 110.904,64	Total Líquido 98.926,93
---	-----------------------------------

Outras Informações

O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (MUNICIPIO DE SANTALUZ) através de substituição tributária
 O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 20.461,91 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetivada(s)

EM **16/11/23** Assinatura

**Prefeitura Municipal de Esplanada**Praça Monsenhor Zacarias Luz, S/N
Centro - Esplanada - BA CEP: 48370-000
CNPJ: 13.885.231/0001-71**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**Número da Nota **00000140**
Data e Hora de Emissão **09/11/2023 18:17:07**
Data do Fato Gerador **09/11/2023**
Código de Verificação **AAAREKCU-AUAEGH****Dados do(s) Serviço(s)**Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **SANTALUZ/BA - BRASIL** Local da Incidência **SANTALUZ/BA****Prestador do(s) Serviço(s)**Nome/Razão Social: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**
Nome Fantasia: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS**
Endereço: **TRV SÃO JOSE II, 316 GALPÃO 04
TIMBO ESPLANADA - BA CEP: 48370-000**
CPF/CNPJ: **21.450.165/0001-35** Insc. Municipal: **2721**
Telefone: **(71) 9.9642-1002** E-mail: **STARTSOLUCOESINTEGRADAS@GMAIL.COM****Tomador do(s) Serviço(s)**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SANTALUZ**
Nome Fantasia:
Endereço: **PRAÇA CORONEL JOSE LEITAO, 05 TERREO
CENTRO SANTALUZ - BA CEP: 48880-000**
CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:**Discriminação do(s) Serviço(s)**

DADOS BANCARIOS BRADESCO - AG:3679 / Cc:39.294-4

Página 2 de 2

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
110.904,64	44.361,86	0,00	66.542,78
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
5,00	0,00	3.327,14	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
1.330,86	0,00	0,00	0,00	7.319,71	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
110.904,64	98.926,93

Outras InformaçõesO ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (MUNICIPIO DE SANTALUZ) através de substituição tributária
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 20.461,91 - (18,45%) - Fonte: IBPT**Evaldo Almeida Moraes**
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM ___/___/___	Assinatura

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://esplanada.saatri.com.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2023

I.R.R.F

Nº DAM: 363852	CONTRIBUINTE 31069 - START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	INSCRIÇÃO: 31069
TIPO / NOME LOGRADOURO: Tv SÃO JOSÉ II, 316 GALPÃO 04		NÚMERO: 04
COMPLEMENTO:	BAIRRO: TIMBO	MUNICÍPIO: ESPLANADA UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO C.N.P.J.: 21.450.165/0001-35
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 1.330,86	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000 Valor R\$ 1.330,86 Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 1.330,86
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 17/11/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023 DATA EMISSÃO: 17/11/2023 10:09:01 DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2023
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.330,86
Valor do Tributo: 1.330,86	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 1.330,86	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
Valor de Base Cálculo: 1.330,86	Vlr. Devido com Desconto: 1.330,86	(+) MULTA DE MORA - R\$
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento; 4) NF-e N° 140 - Data de emissão: 09/11/2023.		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 1.330,86



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8170000013 . 0 30863906202 . 2 31130010100 . 4 00036385207 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000013 . 0 30863906202 . 2 31130010100 . 4 00036385207 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2023

I.R.R.F



PARCELA: 1/1	Nº DAM: 363852	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 17/11/2023 10:09:01	DATA VENCIMENTO: 30/11/2023
INSCRIÇÃO: 31069			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.330,86
START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.330,86





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 363855		CONTRIBUINTE 31069 - START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SÃO JOSÉ II, 316 GALPÃO 04					NÚMERO: 04	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: TIMBO	MUNICÍPIO: ESPLANADA	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 21.450.165/0001-35			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 110.904,64	Alíquota (%): 3,000	Valor R\$: 3.327,14	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 3.327,14		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 30/11/2023	MÊS REFERÊNCIA: Novembro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 17/11/2023 10:11:31	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2023		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 140 - DATA DE EMISSÃO: 09/11/2023			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.327,14		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.327,14		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8177000033 . 1

27143906202 . 4

31130010500 . 5

00036385512 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8177000033 . 1

27143906202 . 4

31130010500 . 5

00036385512 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Novembro	Nº DAM: 363855	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 17/11/2023 10:11:31	DATA VENCIMENTO: 30/11/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.327,14
START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.327,14





Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PROJETO DE REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

OBRA Nº 054/2022
RDC Nº 009/2022
Nº DO CONTRATO: 284/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 230/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/10/2023 a 31/10/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA
EMPRESA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS ERIELI
CNPJ: 21.450.165/0001-35
VALOR DA 8ª MEDIÇÃO: R\$ 110.994,84

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UMD	QDE	P:UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 05		ACUMULADO		SALDO	EXECUTADO
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 456,76	R\$ 2.740,56	0,00	R\$ 0,00	6,00	2.740,56	R\$ 0,00	100%
1.2	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m²	126,72	R\$ 117,54	R\$ 14.894,67	50,00	R\$ 5.877,00	76,72	9.017,66	R\$ 5.877,00	61%
1.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	400,25	R\$ 19,27	R\$ 7.712,82	0,00	R\$ 0,00	400,25	7.712,81	R\$ -	100%
1.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	400,25	R\$ 19,08	R\$ 7.636,77	0,00	R\$ 0,00	400,25	7.636,77	R\$ -	100%
1.5	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	400,25	R\$ 23,99	R\$ 9.602,00	0,00	R\$ 0,00	400,25	9.601,99	R\$ -	100%
1.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	374,46	R\$ 2,28	R\$ 853,77	0,00	R\$ 0,00	374,46	853,76	R\$ -	100%
1.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	37,34	R\$ 9,95	R\$ 371,53	0,00	R\$ 0,00	37,34	371,53	R\$ -	100%
1.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,58	R\$ 37,44	R\$ 620,76	0,00	R\$ 0,00	16,58	620,75	R\$ -	100%
1.9	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,93	R\$ 294,84	R\$ 569,04	0,00	R\$ 0,00	1,93	569,04	R\$ -	100%
1.10	Remoção de calha de zinco	m	63,44	R\$ 10,71	R\$ 679,44	0,00	R\$ 0,00	66,88	716,28	R\$ 716,28	100%
1.11	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	405,82	R\$ 59,66	R\$ 24.211,22	0,00	R\$ 0,00	405,82	24.211,22	R\$ -	100%
1.12	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	63,15	R\$ 24,25	R\$ 1.531,39	0,00	R\$ 0,00	63,15	1.531,38	R\$ -	100%
1.13	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	217,15	R\$ 119,59	R\$ 25.968,97	0,00	R\$ 0,00	217,15	25.968,96	R\$ -	100%
1.14	Demolição de piso de alta resistência	m²	188,42	R\$ 20,49	R\$ 3.860,73	0,00	R\$ 0,00	188,42	3.860,72	R\$ -	100%
1.15	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	160,50	R\$ 12,27	R\$ 1.969,34	40,50	R\$ 496,93	160,50	1.969,33	R\$ -	100%
1.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	100,25	R\$ 3,34	R\$ 334,84	0,00	R\$ 0,00	100,25	334,83	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 103.557,83						
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

IAGO R S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 152,17	R\$ 6.086,80	0,00	R\$ 0,00	40,00	6.086,80	R\$	-	100%
	sub total				R\$ 6.086,80							
3.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO											
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	602,76	R\$ 89,93	R\$ 54.206,21	100,00	R\$ 8.993,00	602,76	54.206,20	R\$	-	100%
3.2	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	3,66	R\$ 617,03	R\$ 2.258,33	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	2.258,33	0%
3.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1.6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	28,50	R\$ 110,53	R\$ 3.150,11	28,50	R\$ 3.150,10	28,50	3.150,10	R\$	-	100%
3.4	Soleira cimentado traço 1:1, l = 15 cm, e = 2 cm	m	82,89	R\$ 20,17	R\$ 1.671,89	82,89	R\$ 1.671,89	82,89	1.671,89	R\$	-	100%
3.5	Bancada de mármore branco	m²	0,70	R\$ 348,66	R\$ 244,06	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	244,06	0%
	sub total				R\$ 61.530,59							
4.0	ESQUADRIAS											
4.1	PORTAS											
4.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 1.145,24	R\$ 9.161,92	8,00	R\$ 9.161,92	8,00	9.161,92	R\$	-	100%
4.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 1.059,47	R\$ 8.475,76	8,00	R\$ 8.475,76	8,00	8.475,76	R\$	-	100%
4.1.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,24	R\$ 739,48	R\$ 2.395,92	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	2.395,92	0%
4.1.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	15,75	R\$ 571,40	R\$ 8.999,55	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	8.999,55	0%
4.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 1.021,60	R\$ 2.043,20	2,00	R\$ 2.043,20	2,00	2.043,20	R\$	-	100%
	sub total				R\$ 31.076,35							
4.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS											
4.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 124,46	R\$ 373,38	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	373,38	0%
4.2.2	TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM PVC, BRANCA OU VERDE H=1,80	m²	24,01	R\$ 136,14	R\$ 3.268,72	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	3.268,72	0%
4.2.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00	R\$ 180,23	R\$ 3.244,14	18,00	R\$ 3.244,14	18,00	3.244,14	R\$	-	100%
4.2.4	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	2,40	R\$ 779,20	R\$ 1.870,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	1.870,08	0%
4.2.5	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	R\$ 4.417,55	R\$ 4.417,55	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	4.417,55	0%
4.2.6	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	R\$ 2.333,38	R\$ 2.333,38	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	2.333,38	0%
4.2.7	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	R\$ 1.999,99	R\$ 3.998,98	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	3.998,98	0%
4.2.8	Letra em aço inox escovado/polido 10 x 10cm - instalado	un	25,00	R\$ 60,08	R\$ 1.502,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	1.502,00	0%

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

IAGO R S BORBA
ENGR. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


4.2.9	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	un	33,00	R\$ 220,88	R\$ 7.289,04	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.289,04	0%
4.2.10	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,85	R\$ 536,32	R\$ 992,19	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 992,19	0%
4.2.11	CERCA EM MORÕES DE MADEIRA TRATADA	M	32,00	R\$ 38,22	R\$ 1.223,04	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.223,04	0%
	sub total				R\$ 30.512,50						
4.3	JANELAS										
4.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	14,25	R\$ 533,66	R\$ 7.604,66	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.604,66	0%
4.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	8,45	R\$ 204,48	R\$ 1.727,86	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.727,86	0%
	sub total				R\$ 9.332,51						
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
5.1	ÁGUA FRIA										
5.1.1	PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	m²	80,84	R\$ 34,87	R\$ 2.818,89	0,00	R\$ 0,00	80,84	2.818,89	R\$ -	100%
5.1.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R\$ 1.091,94	R\$ 2.183,88	0,00	R\$ 0,00	2,00	2.183,88	R\$ -	100%
5.1.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	25,00	R\$ 165,43	R\$ 4.135,75	0,00	R\$ 0,00	25,00	4.135,75	R\$ -	100%
5.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	102,91	R\$ 25,52	R\$ 2.626,26	0,00	R\$ 0,00	95,82	2.445,32	R\$ 180,94	93%
5.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	59,00	R\$ 10,32	R\$ 608,88	0,00	R\$ 0,00	79,00	815,28	-R\$ 206,40	100%
5.1.6	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 1/4") D FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 625,60	R\$ 625,60	0,00	R\$ 0,00	1,00	625,60	R\$ -	100%
5.1.7	Tê 90° de pvc rígido soldável marrom diâm = 25mm	un	20,00	R\$ 11,21	R\$ 224,20	0,00	R\$ 0,00	30,00	336,30	R\$ 224,20	100%
5.1.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	R\$ 45,27	R\$ 316,89	0,00	R\$ 0,00	7,00	316,89	R\$ -	100%
5.1.9	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 102,27	R\$ 102,27	0,00	R\$ 0,00	1,00	102,27	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 13.642,62						
5.2	ESGOTO										
5.2.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	7,00	R\$ 138,20	R\$ 967,40	0,00	R\$ 0,00	6,00	829,20	R\$ 138,20	86%
5.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,93	R\$ 67,26	R\$ 4.098,15	0,00	R\$ 0,00	51,86	3.488,10	R\$ 610,05	85%
5.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 22,39	R\$ 291,07	0,00	R\$ 0,00	13,00	291,07	R\$ -	100%
5.2.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	23,00	R\$ 88,20	R\$ 2.028,60	0,00	R\$ 0,00	10,00	882,00	R\$ 1.146,60	43%


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

IAGO R S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

5.2.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 48,69	R\$ 292,14	0,00	R\$ 0,00	3,00	146,07	R\$	146,07	50%
5.2.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,37	R\$ 23,15	R\$ 1.027,17	0,00	R\$ 0,00	34,37	795,66	R\$	231,50	77%
5.2.7	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	5,00	R\$ 171,52	R\$ 857,80	0,00	R\$ 0,00	5,00	857,60	R\$	-	100%
5.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36,00	R\$ 12,05	R\$ 433,80	0,00	R\$ 0,00	20,00	241,00	R\$	192,80	56%
5.2.9	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 208,02	R\$ 208,02	0,00	R\$ 0,00	1,00	208,02	R\$	-	100%
5.2.10	Tê 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	9,00	R\$ 14,13	R\$ 127,17	0,00	R\$ 0,00	4,00	56,52	R\$	70,65	44%
5.2.11	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 15,82	R\$ 142,38	0,00	R\$ 0,00	9,00	142,38	R\$	-	100%
	sub total				R\$ 10.473,50							
5.3	METAIS E ACESSÓRIOS HIDRAULICO											
5.3.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	R\$ 312,86	R\$ 1.564,30	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	1.564,30	0%
5.3.2	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx. descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	2,00	R\$ 455,73	R\$ 911,46	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	911,46	0%
5.3.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35 5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 457,27	R\$ 457,27	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	457,27	0%
5.3.4	Plia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	R\$ 997,84	R\$ 997,84	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	997,84	0%
5.3.5	MICTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE AGUA EMBUTIDA D PADRÃO ALTO D FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 940,17	R\$ 1.880,34	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	1.880,34	0%
5.3.6	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 648,22	R\$ 6.482,20	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	6.482,20	0%
5.3.7	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 414,62	R\$ 829,24	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	829,24	0%
	sub total				R\$ 13.122,65			0,00				
5.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
	QUADROS											
5.4.1	PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO	m²	625,79	R\$ 15,89	R\$ 9.943,80	0,00	R\$ 0,00	625,79	9.943,80	R\$	-	100%
5.4.2	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 103,60	R\$ 103,60	0,00	R\$ 0,00	1,00	103,60	R\$	-	100%
5.4.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 675,59	R\$ 1.351,18	0,00	R\$ 0,00	2,00	1.351,18	R\$	-	100%
5.4.4	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2	un	1,00	R\$ 502,74	R\$ 502,74	0,00	R\$ 0,00	1,00	502,74	R\$	-	100%
	sub total				R\$ 11.901,32							


5.5 FISJUNTORES												
5.5.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 13,26	R\$ 53,04	0,00	R\$ 0,00	4,00	53,04	R\$	-	100%
5.5.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 13,93	R\$ 55,72	0,00	R\$ 0,00	4,00	55,72	R\$	-	100%
5.5.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	R\$ 15,24	R\$ 213,36	0,00	R\$ 0,00	14,00	213,36	R\$	-	100%
5.5.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 149,75	R\$ 299,50	0,00	R\$ 0,00	2,00	299,50	R\$	-	100%
5.5.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 658,52	R\$ 658,52	0,00	R\$ 0,00	1,00	658,52	R\$	-	100%
5.5.6	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	2,00	R\$ 159,07	R\$ 318,14	0,00	R\$ 0,00	2,00	318,14	R\$	-	100%
5.5.7	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00	R\$ 266,61	R\$ 266,61	0,00	R\$ 0,00	1,00	266,61	R\$	-	100%
5.5.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	9,00	R\$ 135,30	R\$ 1.217,70	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	1.217,70	0%
sub total					R\$ 3.082,59							
5.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS												
5.6.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	349,00	R\$ 10,32	R\$ 3.601,68	0,00	R\$ 0,00	349,00	3.601,68	R\$	-	100%
5.6.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,00	R\$ 19,14	R\$ 803,88	0,00	R\$ 0,00	42,00	803,88	R\$	-	100%
5.6.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	73,00	R\$ 16,18	R\$ 1.181,14	0,00	R\$ 0,00	50,00	809,00	R\$	372,14	68%
sub total					R\$ 5.586,70							
5.7 CABOS												
5.7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	578,00	R\$ 3,21	R\$ 1.855,38	0,00	R\$ 0,00	400,00	1.284,00	R\$	571,38	69%
5.7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	620,00	R\$ 4,66	R\$ 2.889,20	0,00	R\$ 0,00	450,00	2.097,00	R\$	792,20	73%
5.7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	518,00	R\$ 7,61	R\$ 3.941,98	0,00	R\$ 0,00	350,00	2.663,50	R\$	1.278,48	68%
5.7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	R\$ 26,21	R\$ 3.145,20	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	3.145,20	0%
sub total					R\$ 11.831,76							
5.8 ILUMINAÇÃO E TOMADA												
5.8.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00	R\$ 27,96	R\$ 1.342,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	1.342,08	0%
5.8.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 31,95	R\$ 63,90	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	63,90	0%
5.8.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 29,95	R\$ 59,90	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	59,90	0%


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

5.8.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R\$ 26,54	R\$ 238,86	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	238,86	0%
5.8.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	R\$ 62,52	R\$ 812,76	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	812,76	0%
5.8.6	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	74,00	R\$ 76,21	R\$ 5.639,54	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	5.639,54	0%
5.8.7	Luminária c/02 pétalas, c/ alojam. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epoxi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro/temp., incl. suporte p/fixação em poste reto c/02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar, completa	un	3,00	R\$ 2.115,17	R\$ 6.345,51	3,00	R\$ 6.345,51	3,00	6.345,51	R\$	-	100%
5.8.8	Projeto Lumini, ref PL-2124/150 C/ filtro ambar, inclusive lâmpada vapor metálico HQI-TS 150W e reator	Un	6,00	R\$ 1.621,54	R\$ 9.729,24	6,00	R\$ 9.729,24	6,00	9.729,24	R\$	-	100%
sub total					R\$ 24.231,79							
5.9 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO												
5.9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	58,00	R\$ 15,85	R\$ 919,30	0,00	R\$ 0,00	58,00	919,30	R\$	-	100%
5.9.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	R\$ 6,59	R\$ 72,49	0,00	R\$ 0,00	11,00	72,49	R\$	-	100%
5.9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 6,02	R\$ 84,28	0,00	R\$ 0,00	14,00	84,28	R\$	-	100%
5.9.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 9,69	R\$ 38,76	0,00	R\$ 0,00	4,00	38,76	R\$	-	100%
sub total					R\$ 1.114,83							
6.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO												
6.1 INFRAESTRUTURA												
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,40	R\$ 108,63	R\$ 255,91	0,00	R\$ 0,00	2,40	255,91	R\$	-	100%
6.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	4,08	R\$ 139,39	R\$ 568,71	0,00	R\$ 0,00	4,08	568,71	R\$	-	100%
6.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATA, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	22,58	R\$ 22,45	R\$ 506,92	0,00	R\$ 0,00	22,58	506,92	R\$	-	100%
6.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (sapata isolada).	m³	2,40	R\$ 4.153,90	R\$ 9.969,36	0,00	R\$ 0,00	2,40	9.969,36	R\$	-	100%
6.1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (viga baldrame).	m³	4,08	R\$ 4.153,90	R\$ 16.947,91	0,00	R\$ 0,00	4,08	16.864,83	R\$	83,08	100%
6.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	102,46	R\$ 54,24	R\$ 5.557,43	0,00	R\$ 0,00	102,46	5.557,43	R\$	-	100%
sub total					R\$ 33.806,25							
6.2 SUPERESTRUTURA												
6.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (pilares).	m³	4,50	R\$ 4.153,90	R\$ 18.692,55	0,00	R\$ 0,00	4,50	18.692,55	R\$	-	100%
6.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (vigas).	m³	4,08	R\$ 4.153,90	R\$ 16.947,91	0,00	R\$ 0,00	4,08	16.947,91	R\$	-	100%


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

6.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 (laje).	m³	6,00	R\$ 4.153,90	R\$ 24.923,40	0,00	R\$ 0,00	6,00	24.923,40	R\$	-	100%
6.2.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24,80	R\$ 111,54	R\$ 2.766,19	0,00	R\$ 0,00	24,80	2.766,19	R\$	-	100%
6.2.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	38,10	R\$ 64,29	R\$ 2.449,45	0,00	R\$ 0,00	33,10	2.127,99	R\$	321,45	87%
6.2.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	38,10	R\$ 115,60	R\$ 4.404,36	0,00	R\$ 0,00	33,10	3.826,36	R\$	578,00	87%
6.2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (laje).	m²	40,10	R\$ 54,24	R\$ 2.175,02	40,10	R\$ 2.175,02	40,10	2.175,02	R\$	-	100%
	sub total				R\$ 72.358,89							
7.0	REVESTIMENTO											
7.1	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS											
7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.133,50	R\$ 5,06	R\$ 5.735,51	0,00	R\$ 0,00	1333,50	6.747,51	R\$	5.735,51	100%
7.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.133,50	R\$ 29,25	R\$ 33.154,88	33,00	R\$ 965,25	1133,50	33.154,86	R\$	-	100%
7.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	350,24	R\$ 71,76	R\$ 25.133,22	50,24	R\$ 3.605,22	50,24	3.605,22	R\$	21.528,00	14%
7.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 (cor laranja).	m²	57,53	R\$ 228,30	R\$ 13.134,10	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	13.134,10	0%
7.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 (cor amarelo).	m²	48,15	R\$ 228,30	R\$ 10.992,65	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	10.992,65	0%
7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 (cor azul).	m²	124,62	R\$ 228,30	R\$ 28.450,75	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	28.450,75	0%
7.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 (cor verde).	m²	43,32	R\$ 228,30	R\$ 9.889,96	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	9.889,96	0%
7.1.8	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref. Niquel - B-2104, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	527,70	R\$ 200,70	R\$ 105.909,39	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	105.909,39	0%
	sub total				R\$ 232.400,44							
7.2	PISOS INTERNOS											
7.2.1	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	7,53	R\$ 21,58	R\$ 162,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	162,50	0%
7.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	66,40	R\$ 56,08	R\$ 3.723,71	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	3.723,71	0%
7.2.3	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	330,73	R\$ 54,53	R\$ 18.034,71	0,00	R\$ 0,00	165,36	9.017,08	R\$	9.017,63	50%
7.2.4	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	148,26	R\$ 24,31	R\$ 3.604,20	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$	3.604,20	0%
	sub total				R\$ 25.525,12							

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

IAGO R S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051998251-0


7.3	PISOS EXTERNOS										
7.3.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	42,03	R\$ 107,50	R\$ 4.518,23	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.518,23	0%
7.3.2	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	114,71	R\$ 25,05	R\$ 2.873,49	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.873,49	0%
7.3.3	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	60,00	R\$ 70,31	R\$ 4.218,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.218,60	0%
7.3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (cor laranja).	m²	117,09	R\$ 78,44	R\$ 9.184,54	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.184,54	0%
7.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (cor amarelo).	m²	73,68	R\$ 78,44	R\$ 5.779,46	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.779,46	0%
7.3.6	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	86,10	R\$ 84,14	R\$ 7.244,45	0,00	R\$ 0,00	66,19	5.561,65	R\$ 1.682,80	77%
7.3.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (cor azul).	m²	120,05	R\$ 78,44	R\$ 9.416,72	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.416,72	0%
7.3.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (cor verde).	m²	80,53	R\$ 78,44	R\$ 6.316,77	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.316,77	0%
7.3.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (cor natural).	m²	72,33	R\$ 78,44	R\$ 5.673,57	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.673,57	0%
	sub total				R\$ 55.225,82						
8.0	COBERTURA										
8.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	174,28	R\$ 49,15	R\$ 8.565,86	174,28	R\$ 8.565,86	174,28	8.565,86	R\$ -	100%
8.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	174,28	R\$ 110,77	R\$ 19.305,00	174,28	R\$ 19.304,99	174,28	19.304,99	R\$ -	100%
8.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	102,03	R\$ 119,46	R\$ 12.188,50	50,00	R\$ 5.973,00	50,00	5.973,00	R\$ 6.215,50	49%
8.4	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	45,84	R\$ 47,40	R\$ 2.172,82	45,84	R\$ 2.172,81	45,84	2.172,81	R\$ -	100%
8.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	538,12	R\$ 43,86	R\$ 23.601,94	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 23.601,94	0%
	sub total				R\$ 65.834,12						
9.0	PINTURA										
9.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	1.013,19	R\$ 3,96	R\$ 4.012,23	500,00	R\$ 1.980,00	500,00	1.980,00	R\$ 2.032,23	49%
9.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.013,19	R\$ 13,05	R\$ 13.222,13	500,00	R\$ 6.525,00	500,00	6.525,00	R\$ 6.697,13	49%
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.013,19	R\$ 16,62	R\$ 16.839,22	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 16.839,22	0%
9.4	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m²	34,86	R\$ 22,44	R\$ 782,26	20,00	R\$ 448,80	20,00	448,80	R\$ 333,46	57%
9.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m²	13,01	R\$ 21,40	R\$ 278,41	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 278,41	0%
	sub total				R\$ 35.134,25						
10.0	PAISAGISMO										
10.1	Planta - Croton, fornecimento e plantio	un	8,00	R\$ 7,77	R\$ 62,16	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 62,16	0%


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


10.2	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	un	6,00	R\$ 1.025,25	R\$ 6.151,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.151,50	0%
10.3	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	2,00	R\$ 163,07	R\$ 326,14	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 326,14	0%
	sub total				R\$ 6.539,80						
11.0	CANTEIRO E BANCOS										
11.1	INFRAESTRUTURA										
11.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,07	R\$ 139,39	R\$ 288,54	0,00	R\$ 0,00	3,04	423,73	-R\$ 135,21	100%
11.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	13,88	R\$ 22,45	R\$ 311,61	0,00	R\$ 0,00	13,88	311,60	R\$ 0,00	100%
11.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,07	R\$ 4.153,90	R\$ 8.598,57	0,00	R\$ 0,00	2,87	11.921,69	R\$ 8.598,57	100%
11.1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	41,64	R\$ 54,24	R\$ 2.258,55	0,00	R\$ 0,00	41,64	2.258,55	R\$ -	100%
	SUB TOTAL				R\$ 11.457,27						
11.2	ALVENARIA										
11.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	63,69	R\$ 62,68	R\$ 3.992,09	0,00	R\$ 0,00	63,69	3.992,08	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 3.992,09						
11.3	REVESTIMENTO										
11.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	127,38	R\$ 5,06	R\$ 644,54	0,00	R\$ 0,00	154,76	783,08	R\$ 644,54	100%
11.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	127,38	R\$ 29,25	R\$ 3.725,87	0,00	R\$ 0,00	127,38	3.725,88	R\$ 3.725,87	100%
11.3.3	Soleira em granito verde ubatuba, l = 22 cm, e = 2 cm	m	106,78	R\$ 126,91	R\$ 13.551,45	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 13.551,45	0%
	sub total				R\$ 17.921,86						
11.4	PINTURA										
11.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	32,46	R\$ 16,62	R\$ 539,49	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 539,49	0%
11.4.2	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvilín ou similar)	m²	32,46	R\$ 22,44	R\$ 728,40	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 728,40	0%
	sub total				R\$ 1.267,89						
11.5	MADEIRA										
11.5.1	MADEIRAMENTO EM MASSARAMDUBA MADEIRA DE LEI	m²	32,46	R\$ 58,00	R\$ 1.882,68	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.882,68	0%
	sub total				R\$ 1.882,68						
12.0	QUADRA ESPORTIVA										
12.1	MANUTENÇÃO										
12.1.1	MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO DE QUADRAS ESPORTIVAS	M²	485,34	R\$ 32,15	R\$ 15.603,68	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 15.603,68	0%
12.1.2	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	24,27	R\$ 241,53	R\$ 5.861,93	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.861,93	0%
	sub total				R\$ 21.465,61						
12.2	PINTURA										


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



IAGO R.S. BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

12.2.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	154,62	R\$ 14,68	R\$ 2.269,82	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.269,82	0%
12.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	154,62	R\$ 16,62	R\$ 2.569,78	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.569,78	0%
12.2.3	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47	R\$ 18,67	R\$ 3.518,73	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.518,73	0%
12.2.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde)	m²	152,32	R\$ 18,67	R\$ 2.843,81	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.843,81	0%
12.2.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25	R\$ 18,67	R\$ 2.375,76	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.375,76	0%
12.2.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branca)	m²	29,18	R\$ 18,67	R\$ 544,79	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 544,79	0%
12.2.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1 (Alambrados, postes e traves)	m²	845,13	R\$ 21,40	R\$ 18.085,78	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 18.085,78	0%
SUBTOTAL					R\$ 32.208,49						
13.0	CAIXA D'ÁGUA 15.000 L										
13.1	MOVIMENTO DE TERRA										
13.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,65	R\$ 89,51	R\$ 326,71	0,00	R\$ 0,00	1,00	89,51	R\$ 237,20	27%
13.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	4,84	R\$ 8,03	R\$ 38,87	0,00	R\$ 0,00	1,00	8,03	R\$ 30,84	21%
SUB TOTAL					R\$ 365,58						
13.2	FUNDAÇÕES										
13.2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	35,00	R\$ 87,47	R\$ 3.061,45	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.061,45	0%
13.2.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5,00	R\$ 22,00	R\$ 110,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 110,00	0%
13.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	4,84	R\$ 35,97	R\$ 174,09	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 174,09	0%
13.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,40	R\$ 91,34	R\$ 401,90	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 401,90	0%
13.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,61	R\$ 17,64	R\$ 2.057,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.057,00	0%
13.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,78	R\$ 14,87	R\$ 1.245,81	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.245,81	0%
13.2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,86	R\$ 15,36	R\$ 212,95	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 212,95	0%
13.2.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,08	R\$ 22,31	R\$ 291,81	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 291,81	0%


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

13.2.9	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA D LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	2,42	R\$ 744,99	R\$ 1.802,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.802,88	0%
	SUB TOTAL				R\$ 9.357,89						
13.3	RESERVATORIO										
13.3.1	Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto	UN	1,00	R\$ 50.310,61	R\$ 50.310,61	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 50.310,61	0%
13.3.2	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	4,00	R\$ 140,94	R\$ 563,76	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 563,76	0%
	SUB TOTAL				R\$ 50.874,37						
14.0	SERVIÇOS FINAIS										
14.1	Limpeza geral	m²	1.856,09	R\$ 2,49	R\$ 4.621,66	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.621,66	0%
	SUB TOTAL				R\$ 4.621,66						
	Total				R\$ 1.019.324,43		R\$ 110.904,64		R\$ 481.443,76	R\$ 537.880,67	53%


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


IAGO R S BORBA
 ENGR. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



Prefeitura Municipal de Esplanada

Secretaria de Administração

Praça Monsenhor Zacarias Luz, S/N

Centro - Esplanada - BA CEP: 48370-000

CNPJ: 13.885.231/0001-71

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000487/2023.E

Nome/Razão Social: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**
Nome Fantasia: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS**
Inscrição Municipal: **2721** CPF/CNPJ: **21.450.165/0001-35**
Endereço: **TRV SÃO JOSE II, 316 GALPÃO 04**
TIMBO ESPLANADA - BA CEP: 48370-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 20/10/2023 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **19/11/2023**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **9600008974640000399325030000487202310200**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://esplanada.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20235953013

RAZÃO SOCIAL	
START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
121.094.436 - BAIXADO	21.450.165/0001-35

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/11/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.450.165/0001-35
Razão Social: START SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Endereço: TV SAO JOSE II 55 GALPAO 04 / TIMBO / ESPLANADA / BA / 48370-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/10/2023 a 26/11/2023

Certificação Número: 2023102803263075767930

Informação obtida em 01/11/2023 11:46:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 21.450.165/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:53:38 do dia 10/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2024.

Código de controle da certidão: **8CD0.0EB5.4B05.9E6C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.450.165/0001-35
Certidão n°: 32390630/2023
Expedição: 04/07/2023, às 11:41:34
Validade: 31/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.450.165/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000019 120101802316 107682180827 145016500012

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35 N° ARQUIVO: LgHlr7HJ7YY0000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 10/2023
N° CONTROLE: PAYtyehFQqU0000-8

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE SANTALUZ INSCRIÇÃO: 13.807.870/0001-19 N° CONTROLE: CKVA0zpYdBK0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
PC CORONEL JOSE LEITAO 05 TERREO CENTRO SANTALUZ 48880000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.800,22	REM SEM 13° SALÁRIO	1.400,22
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	112,01
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.800,22	REM SEM 13° SALÁRIO	1.400,22
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	261,83	DEPÓSITO	112,01
VAL DEVIDO PREV SOC	945,08	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000019 120101802316 107682180827 145016500012

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35 N° ARQUIVO: LgHlr7HJ7YY0000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 10/2023
N° CONTROLE: PAYtyehFQqU0000-8

TOMADOR/OBRA : START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35 N° CONTROLE: BXh0AyrzfZ60000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
TV SAO JOSE 55 GALPAO 04 TIMBO ESPLANADA 48370000 BA

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.000,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.000,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	440,00	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.240,00	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000019 120101802316 107682180827 145016500012

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35 N° ARQUIVO: LgHlr7HJ7YY0000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 10/2023
N° CONTROLE: PAYtyehFQqU0000-8

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.800,22	REM SEM 13° SALÁRIO	1.400,22
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	701,83	DEPÓSITO	112,01
VAL DEVIDO PREV SOC	2.185,08	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	1
		TOTAL A RECOLHER	112,01

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	CNPJ	21.450.165/0001-35
Período apuração	10/2023	Número do Recibo	50000176589673
Data/Hora da Transmissão	09/11/2023 12:47:38	Identificação da Apuração de Débitos	22353829114 / eSocial 59540496 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000173640861
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAO JOSE II	Número	55
Complemento	GALPAO04	Bairro/Distrito	TIMBO
Município	Esplanada	UF	BA
CEP	48370000	Telefone	7196421002
Correio Eletrônico	STARTSOLUCOESINTEGRADAS@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA	CPF	78453046549
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	487,39		
Deduções	Salário Família: 59,82 Retenção Lei 9711/98: 427,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	594,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 594,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	1.259,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.259,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	1.080,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.080,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	188,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 188,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	157,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 157,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	12,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	62,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 62,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	94,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 94,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	37,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 37,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	150,40		
Saldo a Pagar	150,40		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	21.450.165/0001-35
Nome	START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Período de apuração	10/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	22353829114 / eSocial 59540496 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.081,39	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.528,02	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 365,13	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 150,40	R\$ 150,40
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.124,94	R\$ 150,40

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
CPF	784.530.465-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	09/11/2023 12:47:38
Nº do recibo de entrega	0000050000176589673
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	21.450.165/0001-35

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 5ª MEDIÇÃO – REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA, no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma Escola Municipal José Armando Correia

FOTO 01 – TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018



FOTO 02 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma Escola Municipal José Armando Correia

FOTO 03 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018



FOTO 04 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Iago R S Borba
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma Escola Municipal José Armando Correia

FOTO 05 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



FOTO 06 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Iago R's Borba
IAGO R'S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma Escola Municipal José Armando Correia

FOTO 07 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



FOTO 08 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014




DATA	MUNICÍPIO	EMPRENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma Escola Municipal José Armando Correia

FOTO 09 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020



FOTO 10 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

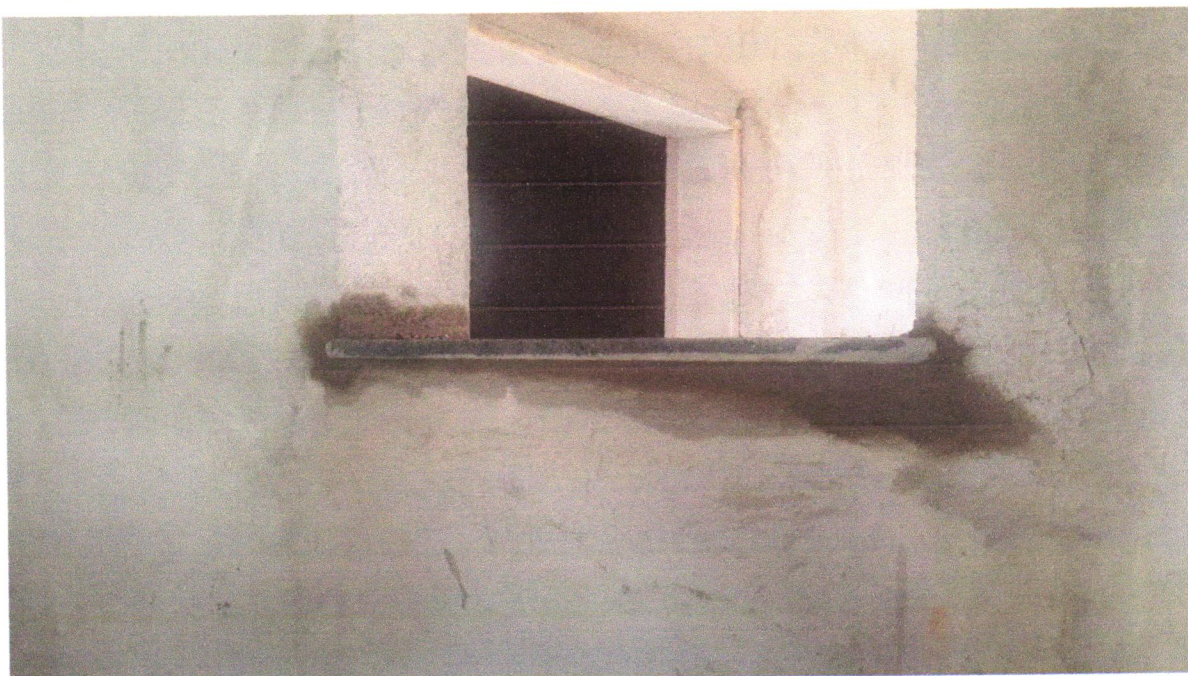

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma Escola Municipal José Armando Correia

FOTO 11 – KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



FOTO 12 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma Escola Municipal José Armando Correia

FOTO 13 – KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



FOTO 14 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma Escola Municipal José Armando Correia

FOTO 15 - Luminária c/02 pétalas, c/ alojam. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epoxi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., incl. suporte p/fixação em poste reto c/02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar, completa



FOTO 16 - Luminária c/02 pétalas, c/ alojam. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epoxi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., incl. suporte p/fixação em poste reto c/02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar, completa




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma Escola Municipal José Armando Correia

FOTO 17 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (laje).



FOTO 18 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

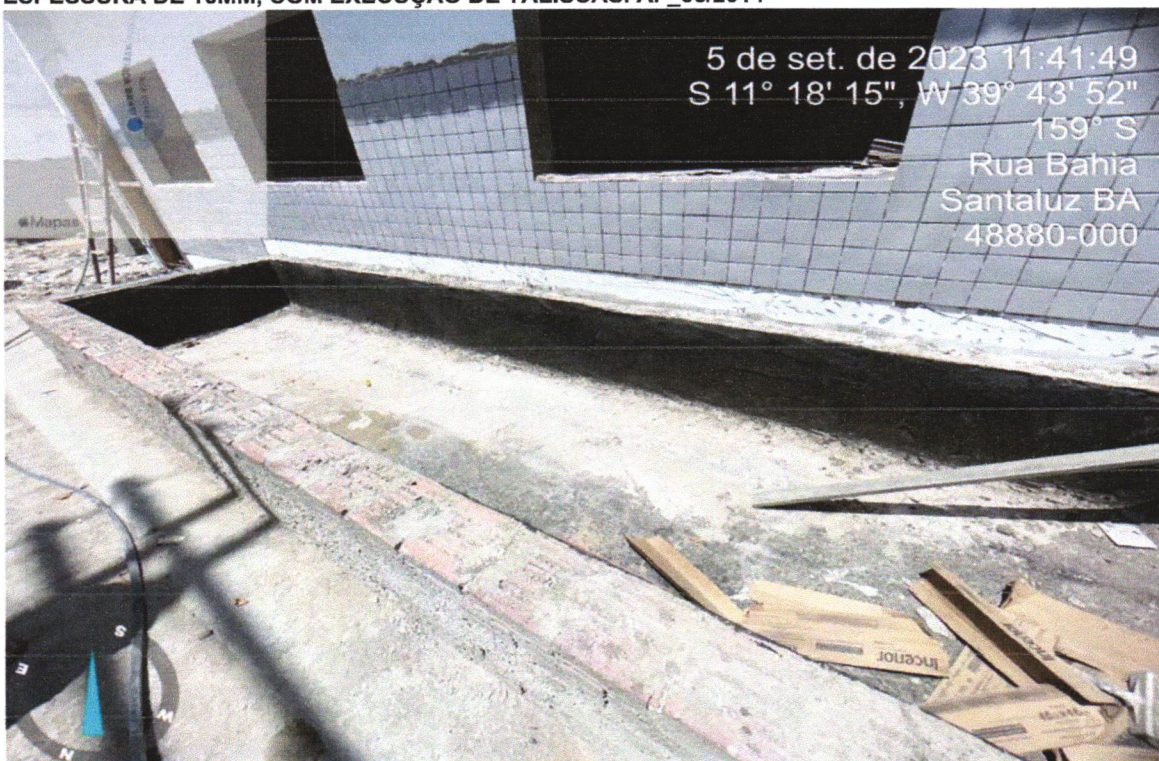

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma Escola Municipal José Armando Correia

FOTO 19 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014



FOTO 20 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma Escola Municipal José Armando Correia

FOTO 21 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

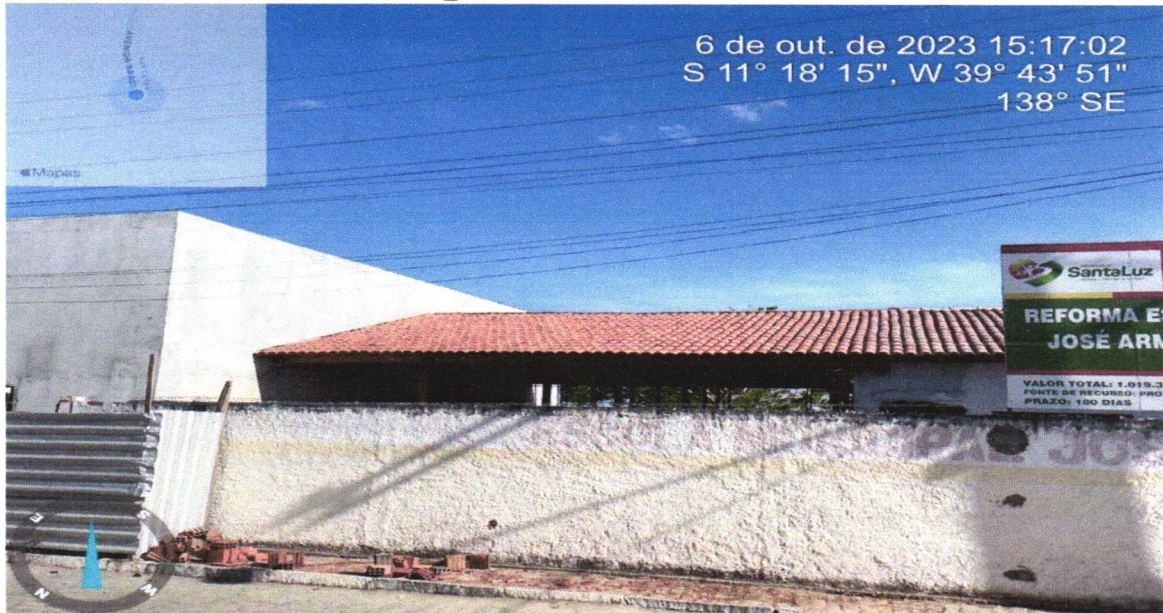


FOTO 22 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma Escola Municipal José Armando Correia

FOTO 23 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



FOTO 24 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

IAGO R'S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma Escola Municipal José Armando Correia

FOTO 25 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



FOTO 26 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma Escola Municipal José Armando Correia

FOTO 27 - Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm



FOTO 28 - Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm




Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3


IAGO R'S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma Escola Municipal José Armando Correia

FOTO 29 - Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos



FOTO 30 - Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma Escola Municipal José Armando Correia


FOTO 31 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014





FOTO 32 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014



			RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
							24/09/2023							S	T	Q	Q	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 008-2022 RDO: 254			EFETIVO PESSOAL															
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			CATEGORIA				QTDE											
SIMBOLOGIA			1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA											
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra											
							Engenheiro 1											
							Téc. de Segurança											
							Aux Adm											
							Mestre de obra											
							Encarregado geral 1											
							Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES							MÃO DE OBRA DIRETA											
							Topografo											
							Auxiliar de topografia											
							Pedreiro 8											
							Ajudante Geral 7											
							Calçeteiro											
							Carpinteiro											
							Operador de Motosserra											
							Motorista											
							Montador											
							Montador/Eletricista											
							Eletricista											
							Operador de Patrol											
							Operador de Escavadeira											
							Operador de Pá carregadeira											
				Motorista de caçamba														
				Pintor														
				Encanador														
				Hh DO DIA														
OBSERVAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO											
							EFETIVO DO DIA 17											
							JORNADA DE TRABALHO											
							Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO														
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
							TIPO						QTDE.					
							Veículo Leve											
							Caminhão Munk											
							Caminhão Toco											
							Escavadeira											
							Pá carregadeira											
							Caçamba											
							Patrol											
							PC 200											
Placa Vibratória																		
Data: 24/09/2023			Data: 24/09/2023															



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
					28/09/2023	S	X	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 256				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE				
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE TAPUMÉ EM CHAPA COMPENSADA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EXECUÇÃO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABBROS E TERÇAS INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				Gerente de Obra				Engenheiro 1				
				Tec. de Segurança				Aux Adm				
				Mestre de obra				Encarregado geral 1				
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo				Auxiliar de topografia				
				Pedreiro				8				
				Ajudante Geral				7				
				Calcetelro				Carpinteiro				
				Operador de Motosserra				Motorista				
				Montador				Montador/Eletricista				
				Eletricista				Operador de Patrol				
				Operador de Escavadeira				Operador de Pé carregadeira				
				Motorista de caçamba				Pintor				
				Encanador				Hh DO DIA				
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA				17				
				JORNADA DE TRABALHO				Hh DO DIA				
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				Veículo Leve				TIPO				
				Caminhão Munck				QTDE.				
				Caminhão Toco				Escavadeira				
				Pé carregadeira				Caçamba				
				Patrol				PC 200				
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 26/09/2023				Data: 26/09/2023								



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						27/09/2023						
Condições Climáticas:		Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				S T Q Q S S D						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		INSTALAÇÃO DE TAPUME EM CHAPA COMPENSADA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EXECUÇÃO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Caldeiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pé carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 17 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pé carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:				Data: 27/09/2023						
Data: 27/09/2023												



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data								
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 258		28/09/2023	S	T	Q	Q	X	S	S	D
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		EFETIVO PESSOAL						
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		INSTALAÇÃO DE TAPUME EM CHAPA COMPENSADA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EXECUÇÃO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		CATEGORIA		QTDE				
						MÃO DE OBRA INDIRETA						
						Gerente de Obra						
						Engenheiro		1				
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral		1				
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro		8				
						Ajudante Geral		7				
						Caloteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Encanador						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA		17				
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO		QTDE.				
						Veloculo Leve						
						Caminhão Munk						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 28/09/2023		Data: 28/09/2023										



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						29/09/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 259		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA					QTDE					
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
INSTALAÇÃO DE TAPUMÉ EM CHAPA COMPENSADA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EXECUÇÃO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA 17 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO QTDE. Veloulo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 29/09/2023		Data: 29/09/2023										



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data		X	
						30/09/2023		S T Q Q S S D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 008-2022 RDO: 260		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra				Engenheiro 1			
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		Tec. de Segurança				Aux Adm			
		Mestre de obra				Encarregado geral 1			
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA				Topografo			
		Auxiliar de topografia				Padreiro 8			
		Ajudante Geral				Calceteiro 7			
		Carpinteiro				Operador de Motosserra			
		Motorista				Montador			
		Montador/Eletricista				Eletricista			
		Operador de Patrol				Operador de Escavadeira			
Operador de Pá carregadeira				Motorista de caçamba					
Pintor				Encanador					
Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA 17			
		JORNADA DE TRABALHO				Hh DO DIA			
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO QTDE.			
		Veículo Leve				Caminhão Munk			
		Caminhão Toco				Escavadeira			
		Pá carregadeira				Caçamba			
		Patrol				PC 200			
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/09/2023		Data: 30/09/2023							



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data		X						
						03/10/2023		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 263		EFETIVO PESSOAL												
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE										
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA												
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra		1										
INSTALAÇÃO DE TAPUME EM CHAPA COMPENSADA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EXECUÇÃO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		Engenheiro		1										
		Tao. de Segurança												
		Aux Adm												
		Mestre de obra												
		Encarregado geral		1										
		Hh DO DIA												
		MÃO DE OBRA DIRETA												
		Topografo												
		Auxiliar de topografia												
		Pedreiro		8										
Ajudante Geral		7												
Calçeteiro														
Carpinteiro														
Operador de Motosserra														
Motorista														
Montador														
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor														
Encanador														
Hh DO DIA														
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO												
		EFETIVO DO DIA		17										
		JORNADA DE TRABALHO												
		Hh DO DIA												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS												
		TIPO		QTDE.										
		Veículo Leve												
		Caminhão Munck												
		Caminhão Toco												
		Escavadeira												
		Pá carregadeira												
		Caçamba												
Patrol														
PC 200														
Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 03/10/2023				Data: 03/10/2023										


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						05/10/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 284/2022		LICITAÇÃO N° 008-2022		RDO: 265		CATEGORIA				QTDE		
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EXECUÇÃO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		Gerente de Obra										
		Engenheiro 1										
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral 1										
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro 8										
		Ajudante Geral 7										
		Calçeteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Encaixador												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA 17										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO					QTDE.					
		Veículo Leve										
		Caminhão MuncK										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 05/10/2023		Data: 05/10/2023										



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						08/10/2023							S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 268		EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()				CATEGORIA			QTDE
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA											
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1											
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		Hh DO DIA											
		MÃO DE OBRA DIRETA											
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador											
		Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO											
		EFETIVO DO DIA 17 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS											
		TIPO					QTDE.						
		Veículo Leve											
		Caminhão Munck											
		Caminhão Toco											
		Escavadeira											
		Pá carregadeira											
		Caçamba											
		Patrol											
		PC 200											
		Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 08/10/2023		Data: 08/10/2023											



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data			
								09/10/2023			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA						EFETIVO PESSOAL			
CONTRATO N° 284/2022		LICITAÇÃO N° 008-2022		RDO: 288		CATEGORIA		QTDE			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EXECUÇÃO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		Gerente de Obra									
		Engenheiro		1							
		Tec. de Segurança									
		Aux Adm									
		Mestre de obra									
		Encarregado geral		1							
		Hh DO DIA									
		MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador		MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro		8					
				Ajudante Geral		7					
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Encanador											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 17 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO									
		OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Lave Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 09/10/2023		Data: 09/10/2023									



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						12/10/2023		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 272		EFETIVO PESSOAL												
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE										
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra		Engenheiro 1										
INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INSTALAÇÃO DE PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE INSTALAÇÃO DE SOLEIRA CIMENTADO INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO		Tec. de Segurança												
		Aux Adm												
		Mestre de obra												
		Encarregado geral		1										
		Hh DO DIA												
		MÃO DE OBRA DIRETA		Topografo										
		Auxiliar de topografia												
		Pedreiro		8										
		Ajudante Geral		7										
		Caleteiro												
Carpinteiro														
Operador de Motosserra														
Motorista														
Montador														
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor														
Encenador														
Hh DO DIA														
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA 17										
		JORNADA DE TRABALHO												
		Hh DO DIA												
		Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO QTDE.										
		Veículo Leve												
		Caminhão Muncck												
		Caminhão Toco												
		Escavadeira												
		Pá carregadeira												
		Caçamba												
		Patrol												
		PC 200												
		Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 12/10/2023		Data: 12/10/2023												



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data												
						13/10/2023							X					
Condições Climáticas:		Manhã: (1)			Tarde: (1)			Noite: ()			EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom			2- Chuva c/ cond. Trab.			3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA							
											MÃO DE OBRA INDIRETA							
											MÃO DE OBRA DIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INSTALAÇÃO DE PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE INSTALAÇÃO DE SOLEIRA CIMENTADO INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO										Gerente de Obra							1	
										Téc. de Segurança								
										Aux Adm								
										Mestre de obra								
										Encarregado geral							1	
Hh DO DIA																		
RESUMO DO EFETIVO																		
EFETIVO DO DIA										17								
JORNADA DE TRABALHO																		
Hh DO DIA																		
Hh ACUMULADO																		
EFETIVO EQUIPAMENTOS																		
TIPO										QTDE.								
Veículo Leve																		
Caminhão Muncck																		
Caminhão Toco																		
Escavadeira																		
Pá carregadeira																		
Caçamba																		
Patrol																		
PC 200																		
Placa Vibratória																		
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:													
Data: 13/10/2023					Data: 13/10/2023													



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					15/10/2023						
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA		CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 008-2022 RDO: 275					EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas:		Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE					Gerente de Obra						
							Engenheiro			1			
							Tec. de Segurança						
							Aux Adm						
							Mestre de obra						
							Encarregado geral			1			
							Hh DO DIA						
							MÃO DE OBRA DIRETA						
							Topografo						
							Auxiliar de topografia						
							Pedreiro			8			
							Ajudante Geral			7			
							Calceteiro						
							Carpinteiro						
							Operador de Motosserra						
							Motorista						
							Montador						
							Montador/Eletricista						
							Eletricista						
							Operador de Patrol						
							Operador de Escavadeira						
							Operador de Pá carregadeira						
							Motorista de caçamba						
							Pintor						
							Encanador						
							Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO						
							EFETIVO DO DIA			17			
							JORNADA DE TRABALHO						
							Hh DO DIA						
							Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS						
							TIPO			QTDE.			
							Veículo Leve						
							Caminhão Munck						
							Caminhão Toco						
							Escavadeira						
							Pá carregadeira						
							Caçamba						
							Patrol						
							PC 200						
							Pleca Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 15/10/2023		Data: 15/10/2023											



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
								18/10/2023						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL						
		OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA						CATEGORIA						
		CONTRATO N° 284/2022		LICITAÇÃO N° 008-2022		RDO: 278		QTDE						
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra						
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1						
		INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL						Tec. de Segurança						
		INSTALAÇÃO DE PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE						Aux Adm						
		INSTALAÇÃO DE SOLEIRA CIMENTADO						Mestre de obra						
		INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA						Encarregado geral 1						
		INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS												
		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA												
		INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO												
								Hh DO DIA						
								MÃO DE OBRA DIRETA						
								Topografo						
								Auxiliar de topografia						
								Pedreiro 8						
								Ajudante Geral 7						
								Calceiteiro						
								Carpinteiro						
								Operador de Motosserra						
								Motorista						
								Montador						
								Montador/Eletricista						
								Eletricista						
								Operador de Patrol						
								Operador de Escavadeira						
								Operador de Pá carregadeira						
								Motorista de caçamba						
								Pintor						
								Encanador						
								Hh DO DIA						
								RESUMO DO EFETIVO						
								EFETIVO DO DIA 17						
								JORNADA DE TRABALHO						
								Hh DO DIA						
								Hh ACUMULADO						
								EFETIVO EQUIPAMENTOS						
								TIPO						
								QTDE.						
								Veículo Leve						
								Caminhão Muncck						
								Caminhão Toco						
								Escavadeira						
								Pá carregadeira						
								Caçamba						
								Patrol						
								PC 200						
								Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 18/10/2023		Data: 18/10/2023												



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data		X						
						23/10/2023		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 008-2022 RDO: 284		EFETIVO PESSOAL												
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE										
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA												
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra		1										
INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INSTALAÇÃO DE PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE INSTALAÇÃO DE SOLEIRA CIMENTADO INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS		Engenheiro		1										
		Tec. de Segurança												
		Aux Adm												
		Mestre de obra												
		Encarregado geral		1										
		Hh DO DIA												
		MÃO DE OBRA DIRETA												
		Topógrafo												
		Auxiliar de topografia												
		Pedreiro		8										
Ajudante Geral		7												
Calceteiro														
Carpinteiro														
Operador de Motosserra														
Motorista														
Montador														
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor														
Encanador														
Hh DO DIA														
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO												
		EFETIVO DO DIA		17										
		JORNADA DE TRABALHO												
		Hh DO DIA												
		Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS												
		TIPO		QTDE.										
		Veículo Leve												
		Caminhão Muncok												
		Caminhão Toco												
		Escavadeira												
		Pá carregadeira												
		Caçamba												
		Patrol												
PC 200														
Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 23/10/2023		Data: 23/10/2023												



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data		X				
						26/10/2023		S	T	Q	Q	S
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
		OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA				CATEGORIA						QTDE
		CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 008-2022 RDO: 287				MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						1
		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA C/02 PÉTALAS PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO				Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						1
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						8
						Ajudante Geral						7
						Calcetelro						
						Carpintelro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Encanador						
						Hh DO DIA						
						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						17
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO		QTDE.				
						Veículo Leve						
						Caminhão Muncck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 26/10/2023		Data: 26/10/2023										



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data 28/10/2023							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N°: 284/2022 LICITAÇÃO N°: 009-2022 RDD: 289							
Condições Climáticas:				EFETIVO PESSOAL							
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hh DD DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							8
				Ajudante Geral							7
				Calçateiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Encanador							
Hh DD DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							17
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DD DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/10/2023				Data: 28/10/2023							


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data 29/10/2023						
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 008-2022 RDO: 290				EFETIVO PESSOAL						
	Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE		
	SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra			
								Engenheiro 1			
								Tec. de Segurança			
								Aux Adm			
								Mestre de obra			
								Encarregado geral 1			
								Hh DO DIA			
								MÃO DE OBRA DIRETA			
								Topografo			
								Auxiliar de topografia			
								Pedreiro 8			
								Ajudante Geral 7			
								Calçeteiro			
								Carpinteiro			
								Operador de Motosserra			
								Motorista			
								Montador			
								Montador/Eletricista			
								Eletricista			
								Operador de Patrol			
								Operador de Escavadeira			
								Operador de Pá carregadeira			
								Motorista de caçamba			
								Pintor			
								Encanador			
								Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO			
								EFETIVO DO DIA 17			
								JORNADA DE TRABALHO			
								Hh DO DIA			
								Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS			
								TIPO		QTDE.	
								Veículo Leve			
								Caminhão MuncK			
								Caminhão Toco			
								Escavadeira			
								Pá carregadeira			
								Caçamba			
								Patrol			
								PC 200			
								Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 29/10/2023				Data: 29/10/2023							


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

