



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 166/2022

EMPENHO: 128 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 3938 Data do Sub-Empenho: 28/11/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 18/01/2023

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenhari	Nº Lic.: 001/2022CP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	940.000,00	927.987,26	12.012,74
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022CP, CONTRATO Nº 254/2022. NF Nº 453. BOLETIM DE MEDIÇÃO 09. PERÍODO 01/11/2023 A 24/11/2023.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
60.263,51	60.263,51	0,00

Data do Empenho: 18/01/2023

Data do Liquidação: 28/11/2023

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	3.977,39
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	723,16
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	1.807,91

Cinquenta e três mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos ## Valor Retido 6.508,46
Valor Líquido 53.755,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	28/11/2023	453	U			60.263,51

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	60.263,51

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/11/2023.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/11/2023, podendo efetuar o pagamento.

WALDSON LOPES DE GÓES FILHO
Contador(a)
CPF: 024.127.355-22

3296231





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000453
Data e Hora de Emissão:
28/11/2023 14:08:01
Código de Verificação:
ALQG-GSXI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
24.697.344/0001-98
Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço:
Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador -
CEP:
41820-021 - BA
E-mail:
dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:
561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19
Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. Obra: Construção Do Centro De Especialidades Médicas Em Santaluz/BA. N° do contrato: 254/2022 Processo administrativo: 166/2022 Concorrência pública: N° 001/2022 BOLETIM DE MEDIÇÃO 09, PERÍODO 01/11/2023 a 24/11/2023
VALOR TOTAL: R\$ 60.263,51
Valor Material 40%: R\$ 24.105,40
Base de cálculo do INSS 60%: 36.158,11 x 11% R\$: 3.977,39
Valor do ISS 5%: R\$ 1.807,91
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM: 28/11/23 Assinatura: Julia Varjão

Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000641424

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$60.263,51

CNAE:

4299699 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
24.105,40	36.158,11	5,00%	1.807,91	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
3.977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,91	54.478,21

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 11/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/01 - Construção de edificações residenciais de qualquer tipo





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2023

I.R.R.F

Nº DAM: 364250	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA	INSCRIÇÃO: 30349	
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES			NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA
DOCUMENTOS			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE			
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO			
Base Cálculo: 723,16	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$ 723,16
		Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 723,16
DADOS PARA PAGAMENTO			
DATA LANÇAMENTO: 12/12/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 12/12/2023 08:48:35
		DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2023	
Composição do Imposto/Lançamentos			
Valor do Tributo:	723,16	Vir. Devido sem Desconto (VD):	723,16
Taxa de Expediente:		Vir. do Desconto:	0,00
Valor de Base Cálculo:	723,16	Vir. Devido com Desconto	723,16
INSTRUÇÕES:			
1) Pagável nas agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(+) MULTA DE MORA - R\$	
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;		(+) JUROS DE MORA - R\$	
4) NF-e Nº 453 - Data de emissão: 28/11/2023.		(-) VALOR A PAGAR - R\$	723,16



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8176000007 . 6 23163906202 . 6 31231010100 . 0 00036425007 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8176000007 . 6 23163906202 . 6 31231010100 . 0 00036425007 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2023

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 364250	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 12/12/2023 08:48:35	DATA VENCIMENTO: 31/12/2023
INSCRIÇÃO: 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	723,16
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	723,16





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 364249	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA		INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES				NUMERO: 2539
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98		R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 36.158,11	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.807,91	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.807,91
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 31/12/2023	MÊS REFERÊNCIA: Novembro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 12/12/2023 08:46:28	DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2023
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 453 - DATA DE EMISSÃO: 28/11/2023			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.807,91
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.807,91



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8179000018 . 0 07913906202 . 4 31231010500 . 1 00036424912 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000018 . 0 07913906202 . 4 31231010500 . 1 00036424912 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Novembro	Nº DAM: 364249	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 12/12/2023 08:46:28	DATA VENCIMENTO: 31/12/2023
INSCRIÇÃO		MP2 CONSTRUCOES LTDA		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.807,91
				(=) VALOR A PAGAR - R\$ 1.807,91





Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
Nº DO CONTRATO: 254/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 166/2022
OBRA Nº: 027/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/11/2023 a 24/11/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ: 24.597.344/0001-98

VALOR DA 9ª MEDIÇÃO R\$ 60.263,51

ITEM	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 09		ACUMULADO		SALDO		% EXECUTADO	
					QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS											
1.1.1	m²	6,00	513,57	3.081,42			6,00	3.081,42			100,00%	
1.1.2	UN	1,00	1.250,96	1.250,96			1,00	1.250,96	R\$	-	100,00%	
1.1.3	UN	1,00	2.853,59	2.853,59			1,00	2.853,59	R\$	-	100,00%	
1.1.4	M	60,00	74,24	4.454,40			0,00	-	60,00	R\$	4.454,40	0,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA											
1.2.1	H	440,00	134,68	59.259,20	30,00	4.040,40	390,00	52.525,20	50,00	R\$	6.734,00	88,64%
1.2.2	H	2.200,00	56,43	124.146,00	125,00	7.053,75	1.955,00	110.320,65	245,00	R\$	13.825,35	88,86%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.1	m²	727,87	14,21	10.343,03			727,87	10.343,03		R\$	-	100,00%
2.2	m²	462,00	94,51	43.663,62			462,00	43.663,62		R\$	-	100,00%
2.3	m²	727,87	3,41	2.482,03			727,87	2.482,03		R\$	-	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES											
3.1	m²	1.373,20	2,92	4.009,74			1.373,20	4.009,74		R\$	-	100,00%
3.2	m³	73,42	110,49	8.112,17			73,42	8.112,17		R\$	-	100,00%
3.3	m³	20,04	144,87	2.903,19			20,04	2.903,19		R\$	-	100,00%
3.4	m³	821,45	105,38	86.564,40			821,45	86.564,40		R\$	-	100,00%
4	INFRAESTRUTURA											
4.1	m³	9,12	446,49	4.071,98			9,12	4.071,98		R\$	-	100,00%
4.2	m²	199,84	194,82	38.932,82			199,84	38.932,82		R\$	-	100,00%
4.3	m²	300,28	102,63	30.817,73			300,28	30.817,73		R\$	-	100,00%
4.4	m³	115,68	572,82	66.263,81			115,68	66.263,81		R\$	-	100,00%


Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

DANIELA...
CNPJ: 24.597.344/0001-98



4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	488,00	23,99	11.707,12	-	488,00	11.707,12	R\$	-	100,00%
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	636,20	22,27	14.168,17	-	636,20	14.168,17	R\$	-	100,00%
4.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	107,70	20,65	2.224,00	-	107,70	2.224,00	R\$	-	100,00%
4.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	777,40	18,37	14.280,83	-	777,40	14.280,83	R\$	-	100,00%
4.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.206,30	15,50	34.197,65	-	2.206,30	34.197,65	R\$	-	100,00%
4.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	300,40	14,62	4.391,84	-	300,40	4.391,84	R\$	-	100,00%
4.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	39,00	16,20	631,80	-	39,00	631,80	R\$	-	100,00%
4.12	IMPERMEABILIZAÇÃO		-	-	-	-	0,00	-	R\$	-	-
4.12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	300,28	49,64	14.905,89	-	300,28	14.905,89	R\$	-	100,00%
5	SUPERESTRUTURA		-	-	-	-	0,00	-	R\$	-	-
5.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	826,73	152,31	125.919,24	-	826,73	125.919,24	R\$	-	100,00%
5.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	618,91	209,58	129.711,15	-	618,91	129.711,15	R\$	-	100,00%
5.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_11/2020	m²	8,10	203,94	1.651,91	-	8,10	1.651,91	R\$	-	100,00%
5.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	83,05	572,82	47.572,70	-	83,05	47.572,70	R\$	-	100,00%
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.411,70	20,53	70.042,20	-	3.411,70	70.042,20	R\$	-	100,00%
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.500,60	22,38	33.583,42	-	1.500,60	33.583,42	R\$	-	100,00%
5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	301,90	20,65	6.234,23	-	301,90	6.234,23	R\$	-	100,00%
5.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.566,50	18,28	28.635,62	-	1.566,50	28.635,62	R\$	-	100,00%
5.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.583,80	15,33	39.609,65	-	2.583,80	39.609,65	R\$	-	100,00%
5.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	105,60	14,35	1.515,36	-	105,60	1.515,36	R\$	-	100,00%
5.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,60	15,87	231,70	-	14,60	231,70	R\$	-	100,00%
5.12	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	-	215,45	-	-	0,00	-	R\$	-	#DIV/0!
5.13	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	421,33	202,06	85.133,93	-	421,33	85.133,93	R\$	-	100,00%
5.14	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	89,91	68,47	6.156,13	-	89,91	6.156,13	R\$	-	100,00%


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000911424


 MARIA...
 Nº...
 CPF...



5.15	ESTRUTURA REVERTORIO ENTERRADO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-
5.15.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	46,80	68,47	3.204,39	-	46,80	3.204,39	-	R\$	100,00%
5.15.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,00	572,82	2.864,10	3,00	1.718,46	5,00	2.864,10	R\$	100,00%
5.15.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	143,40	22,38	3.209,29	-	143,40	3.209,29	-	R\$	100,00%
5.15.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	204,10	20,65	4.214,66	-	204,10	4.214,66	-	R\$	100,00%
5.15.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	180,40	18,28	3.297,71	-	180,40	3.297,71	-	R\$	100,00%
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - TÉRREO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1.194,02	103,38	123.437,78	-	1.194,02	123.437,78	-	R\$	100,00%
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - PAVIMENTO SUPERIOR		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1.117,86	103,38	115.564,36	-	1.117,86	115.564,36	-	R\$	100,00%
6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - RECEPÇÃO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-
6.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	91,95	103,38	9.505,79	-	91,95	9.505,79	-	R\$	100,00%
6.4	PLATIBANDA DA COBERTURA DO TÉRREO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-
6.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	114,30	103,38	11.816,33	-	114,30	11.816,33	-	R\$	100,00%
6.5	PLATIBANDA COBERTURA DO PAVIMENTO SUPERIOR		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-
6.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	123,15	103,38	12.731,24	-	123,15	12.731,24	-	R\$	100,00%
6.6	PLATIBANDA DA ÁREA DO RESERVATÓRIO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-
6.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	37,70	103,38	3.897,42	-	37,70	3.897,42	-	R\$	100,00%
6.7	VERGAS E CONTRAVERGAS		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-
6.7.1	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	110,94	54,61	6.058,43	-	110,94	6.058,43	-	R\$	100,00%
6.7.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	110,94	42,52	4.717,16	-	110,94	4.717,16	-	R\$	100,00%
6.7.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	72,40	48,84	3.536,01	-	72,40	3.536,01	-	R\$	100,00%
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-
7.1	REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-
7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2.651,63	5,07	13.443,76	-	2.651,63	13.443,76	-	R\$	100,00%
7.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2.388,00	31,69	75.675,72	-	2.388,00	75.675,72	-	R\$	100,00%


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



7.1.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	263,62	25,59	6.746,03			263,62	6.746,03		R\$	-	100,00%
7.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	602,77	76,72	46.244,51			580,00	44.497,60	22,77	R\$	1.746,91	96,22%
7.1.5	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	93,54	105,56	9.874,08			93,54	9.874,08		R\$	-	100,00%
7.1.6	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	593,22	222,52	132.003,31			0,00	-	593,22	R\$	132.003,31	0,00%
7.1.7	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 31 x 47 cm, pei 2, Tecnogrês, acetinado, linha branca, ref.55020 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-iii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m²	645,83	79,69	51.466,19			600,93	47.888,11	44,90	R\$	3.578,08	93,05%
7.1.8	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	43,06	65,36	2.814,40			0,00	-	43,06	R\$	2.814,40	0,00%
7.2	REVESTIMENTO EXTERNO - PAREDES		-	-	-			0,00	-	-	R\$	-	-
7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.834,40	5,07	9.300,40			1.834,40	9.300,40		R\$	-	100,00%
7.2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.834,40	25,59	46.942,29			1.834,40	46.942,29		R\$	-	100,00%
7.2.3	Chapim de concreto pré-moldado	m	229,12	69,11	15.834,48	23,61	1.631,68	229,12	15.834,48		R\$	-	100,00%
7.2.4	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor marmore - SG8408, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	1.718,86	95,48	164.116,75			1.880,00	160.406,40	38,86	R\$	3.710,35	97,74%
8	REVESTIMENTO DE PISO		-	-	-			0,00	-	-	R\$	-	-
8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	633,53	35,46	22.464,97			633,53	22.464,97		R\$	-	100,00%
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	918,70	46,57	42.783,85			918,70	42.783,85		R\$	-	100,00%
8.3	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	460,90	222,52	102.559,46			0,00	-	460,90	R\$	102.559,46	0,00%
8.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	416,38	101,00	42.054,38			416,38	42.054,38		R\$	-	100,00%
8.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	35,50	99,14	3.519,47			35,50	3.519,47		R\$	-	100,00%
9	FORRO		-	-	-			0,00	-	-	R\$	-	-
9.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	918,70	44,87	41.222,06			620,00	27.819,40	298,70	R\$	13.402,66	67,49%
9.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	926,65	3,46	3.206,20			610,00	2.110,60	316,65	R\$	1.095,60	65,83%
10	PINTURA		-	-	-			0,00	-	-	R\$	-	-
10.1	PINTURA INTERNA		-	-	-			0,00	-	-	R\$	-	-
10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.148,96	2,95	3.389,43			1.148,96	3.389,43		R\$	-	100,00%


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 DANIELA GONCALVES
 ANO 2017
 Nº 24.591.344/2017



10.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	1.148,96	28,14	32.331,73	-	1.148,96	32.331,73	-	R\$	-	100,00%	
10.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	1.148,96	16,98	19.509,34	100,00	1.698,00	700,00	11.886,00	448,96	R\$	7.623,34	60,92%
10.2	PINTURA TETO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	-	
10.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	918,70	28,14	25.852,21	-	570,00	16.039,80	348,70	R\$	9.812,41	62,04%	
10.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	918,70	19,34	17.767,65	-	570,00	11.023,80	348,70	R\$	6.743,85	62,04%	
11	ESQUADRIAS		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	-	
11.1	PORTAS		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	-	
11.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	1.044,35	10.443,50	-	10,00	10.443,50	-	R\$	-	100,00%	
11.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	1.093,02	10.930,20	-	10,00	10.930,20	-	R\$	-	100,00%	
11.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	33,00	1.181,22	38.980,26	10,00	11.812,20	30,00	35.436,60	3,00	R\$	3.543,66	90,91%
11.1.4	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, inclusive puxador	m²	16,07	652,71	10.489,04	-	0,00	-	16,07	R\$	10.489,04	0,00%	
11.1.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO REFLEXIVO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	134,65	480,26	64.667,00	-	0,00	-	134,65	R\$	64.667,00	0,00%	
11.1.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,30	665,99	2.863,75	-	0,00	-	4,30	R\$	2.863,75	0,00%	
11.2	JANELAS		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	-	
11.2.1	JANELA DE VIDRO LISO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2021_P	m²	26,82	443,20	11.886,62	-	0,00	-	26,82	R\$	11.886,62	0,00%	
12	COBERTURA		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	-	
12.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	643,80	73,04	47.023,15	-	643,80	47.023,15	-	R\$	-	100,00%	
12.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	643,80	26,49	17.054,26	-	643,80	17.054,26	-	R\$	-	100,00%	
12.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	643,80	33,63	21.650,99	-	643,80	21.650,99	-	R\$	-	100,00%	
12.4	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	m²	1,00	98,71	98,71	-	0,00	-	1,00	R\$	98,71	0,00%	
12.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	266,80	72,63	19.377,68	30,00	2.178,90	232,00	16.850,16	34,80	R\$	16.850,16	86,96%
12.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	92,47	123,52	11.421,89	-	92,47	11.421,89	-	R\$	11.421,89	100,00%	
12.5	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DOS REVERTÓRIOS		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	-	


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




12.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	31,25	58,62	1.831,87	-	31,25	1.831,87	-	R\$	-	100,00%
14	QUIOSQUES		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
14.6.1	ESTRUTURA E ALVENARIA - QUIOSQUES		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
14.6.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	3,00	4.113,73	12.341,19	-	3,00	12.341,19	-	R\$	-	100,00%
14.6.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	255,88	103,38	26.452,87	-	255,88	26.452,87	-	R\$	-	100,00%
14.6.1.3	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	59,94	202,06	12.111,47	-	59,94	12.111,47	-	R\$	-	100,00%
14.6.1.4	Chapim de concreto pré-moldado	m	72,20	69,11	4.989,74	-	72,20	4.989,74	-	R\$	-	100,00%
14.6.2	COBERTURA - QUIOSQUES		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
14.6.2.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	50,98	73,04	3.723,57	-	50,98	3.723,57	-	R\$	-	100,00%
14.6.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	50,98	26,49	1.350,46	-	50,98	1.350,46	-	R\$	-	100,00%
14.6.2.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,50	91,59	2.060,77	-	22,50	2.060,77	-	R\$	-	100,00%
14.6.2.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	72,20	72,63	5.243,88	-	72,20	5.243,88	-	R\$	-	100,00%
14.6.2.5	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	m²	51,84	553,61	28.699,14	-	0,00	-	51,84	R\$	28.699,14	0,00%
14.6.2.6	Estrutura metálica, em tubos quadrados ASTM A-36, 100x100x3mm (9,174kg/m), pintada, p/ telhados, vãos 6,00 a 10,00m - Executada	m	136,80	245,13	33.533,78	-	136,80	33.533,78	-	R\$	-	100,00%
14.6.3	PISO - QUIOSQUES		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
14.6.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	50,36	35,46	1.785,76	-	50,36	1.785,76	-	R\$	-	100,00%
14.6.3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	50,36	46,57	2.345,26	-	50,36	2.345,26	-	R\$	-	100,00%
14.6.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	50,36	65,90	3.318,72	-	50,36	3.318,72	-	R\$	-	100,00%
14.6.4	REVESTIMENTO PAREDE E TETO - QUIOSQUES		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
14.6.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	511,76	5,07	2.594,62	-	511,76	2.594,62	-	R\$	-	100,00%
14.6.4.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	511,76	25,59	13.095,93	-	511,76	13.095,93	-	R\$	-	100,00%
14.6.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	129,92	68,40	8.886,52	-	129,92	8.886,52	-	R\$	-	100,00%
14.6.4.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	50,36	44,87	2.259,65	-	0,00	-	50,36	R\$	2.259,65	0,00%


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




14.6.4.5	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor marmore - SG8408, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	196,34	95,48	18.746,54			196,34	18.746,54	R\$	-	100,00%
14.6.4.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	78,18	16,98	1.327,49			0,00		R\$	1.327,49	0,00%
14.6.4.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	50,36	3,47	174,74			0,00		R\$	174,74	0,00%
14.6.4.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	50,36	19,34	973,96			0,00		R\$	973,96	0,00%
14.6.4.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	27,82	2,95	82,06			0,00		R\$	82,06	0,00%
14.6.4.10	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	27,82	28,14	782,85			0,00		R\$	782,85	0,00%
14.6.5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, LOUÇAS E METAIS - QUIOSQUES		-	-	-			0,00	-	R\$	-	
14.6.5.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,00	139,36	557,44			4,00	557,44	R\$	-	100,00%
14.6.5.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	8,00	88,30	706,40			8,00	706,40	R\$	-	100,00%
14.6.5.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12,00	172,86	2.074,32			12,00	2.074,32	R\$	-	100,00%
14.6.5.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	532,72	2.130,88			0,00		R\$	2.130,88	0,00%
14.6.5.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	268,33	1.073,32			0,00		R\$	1.073,32	0,00%
14.6.5.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	982,73	1.965,46			2,00	1.965,46	R\$	-	100,00%
14.6.5.7	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2D OU 3/4D, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	1.077,49	4.309,96			0,00		R\$	4.309,96	0,00%
14.6.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUES		-	-	-			0,00	-	R\$	-	
14.6.6.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	32,00	235,55	7.537,60			32,00	7.537,60	R\$	-	100,00%
14.6.6.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00	172,54	690,16			4,00	690,16	R\$	-	100,00%
14.6.6.3	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	-	102,52	-			0,00	-	R\$	-	#DIV/0!
14.6.6.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8,00	203,70	1.629,60	4,00	814,80	4,00	814,80	R\$	814,80	50,00%
14.6.7	ESQUADRIAS - QUIOSQUES		-	-	-			0,00	-	R\$	-	
14.6.7.2	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive cabrilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	36,50	384,72	14.042,28			0,00		R\$	14.042,28	0,00%


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



14.6.7.3	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	10,86	384,72	4.178,05	-	0,00	-	10,86	R\$	4.178,05	0,00%
14.6.8	DIVERSOS - QUIOSQUES		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	-
14.6.8.1	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	9,00	1.327,23	11.945,07	-	0,00	-	9,00	R\$	11.945,07	0,00%
14.6.8.2	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	10,14	415,33	4.211,44	-	0,00	-	10,14	R\$	4.211,44	0,00%
15	HIDROSANITÁRIO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	-
15.1	ESGOTO E SANITÁRIO 1 PAVIMENTO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	-
15.1.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	741,16	2.964,64	-	4,00	2.964,64	-	R\$	-	100,00%
15.1.2	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	25,00	59,09	1.477,25	-	25,00	1.477,25	-	R\$	-	100,00%
15.1.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	16,76	33,52	-	2,00	33,52	-	R\$	-	100,00%
15.1.6	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	16,83	67,32	-	4,00	67,32	-	R\$	-	100,00%
15.1.7	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	6,00	73,55	441,30	-	6,00	441,30	-	R\$	-	100,00%
15.1.8	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	5,00	23,83	119,15	-	5,00	119,15	-	R\$	-	100,00%
15.1.9	Curva de 90° longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2,00	21,89	43,78	-	2,00	43,78	-	R\$	-	100,00%
15.1.10	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	1,00	45,95	45,95	-	1,00	45,95	-	R\$	-	100,00%
15.1.11	Fornecimento e instalação de curva 90° curta pvc, junta elástica, ponta/bolsa, ø = 40mm	un	35,00	14,49	507,15	-	35,00	507,15	-	R\$	-	100,00%
15.1.12	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	15,00	28,30	424,50	-	15,00	424,50	-	R\$	-	100,00%
15.1.13	Joelho 90° c/visita, pvc soldável, p/esgoto, diâm = 100 x 50mm	un	2,00	46,15	92,30	-	2,00	92,30	-	R\$	-	100,00%
15.1.14	Joelho 90° pvc rígido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário	un	33,00	22,21	732,93	-	33,00	732,93	-	R\$	-	100,00%
15.1.15	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	19,00	53,32	1.013,08	-	19,00	1.013,08	-	R\$	-	100,00%
15.1.16	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	15,00	61,54	923,10	-	15,00	923,10	-	R\$	-	100,00%
15.1.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00	16,12	48,36	-	3,00	48,36	-	R\$	-	100,00%
15.1.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	20,75	20,75	-	1,00	20,75	-	R\$	-	100,00%
15.1.19	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	3,00	24,55	73,65	-	3,00	73,65	-	R\$	-	100,00%
15.1.20	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,30	53,24	761,33	-	14,30	761,33	-	R\$	-	100,00%
15.1.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	156,02	31,47	4.909,94	-	156,02	4.909,94	-	R\$	-	100,00%
15.1.22	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	38,27	20,21	773,43	-	38,27	773,43	-	R\$	-	100,00%
15.1.23	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	26,27	26,25	689,58	-	26,27	689,58	-	R\$	-	100,00%


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Sinalizado em 20/08/2024
 Horário: 14:58:30
 IP: 192.168.1.100



15.1.24	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	1,00	54,25	54,25			-	1,00	54,25	-	R\$	-	100,00%
15.1.25	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	21,00	22,59	474,39			-	21,00	474,39	-	R\$	-	100,00%
15.1.26	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	4,00	14,03	56,12			-	4,00	56,12	-	R\$	-	100,00%
15.1.27	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	21,00	13,23	277,83			-	21,00	277,83	-	R\$	-	100,00%
15.1.28	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,76	24,02	258,45			-	10,76	258,45	-	R\$	-	100,00%
15.1.29	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00	18,48	388,08			-	21,00	388,08	-	R\$	-	100,00%
15.3	ESGOTO E SANITÁRIO 2º PAVIMENTO		-	-	-			-	0,00	-	-	R\$	-	
15.3.1	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	1,00	59,09	59,09			-	1,00	59,09	-	R\$	-	100,00%
15.3.2	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	1,00	73,55	73,55			-	1,00	73,55	-	R\$	-	100,00%
15.3.3	Curva de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1,00	17,69	17,69			-	1,00	17,69	-	R\$	-	100,00%
15.3.4	Curva de 90° longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2,00	21,89	43,78			-	2,00	43,78	-	R\$	-	100,00%
15.3.5	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	2,00	28,30	56,60			-	2,00	56,60	-	R\$	-	100,00%
15.3.6	Joelho 90° pvc rígido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário	un	2,00	22,21	44,42			-	2,00	44,42	-	R\$	-	100,00%
15.3.7	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00	53,32	53,32			-	1,00	53,32	-	R\$	-	100,00%
15.3.8	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	1,00	61,54	61,54			-	1,00	61,54	-	R\$	-	100,00%
15.3.9	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIOLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,21	53,24	863,02			-	16,21	863,02	-	R\$	-	100,00%
15.3.10	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	4,38	20,21	88,51			-	4,38	88,51	-	R\$	-	100,00%
15.3.11	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	0,43	26,25	11,28			-	0,43	11,28	-	R\$	-	100,00%
15.3.12	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	1,00	54,25	54,25			-	1,00	54,25	-	R\$	-	100,00%
15.3.13	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	1,00	22,59	22,59			-	1,00	22,59	-	R\$	-	100,00%
15.3.14	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	1,00	13,23	13,23			-	1,00	13,23	-	R\$	-	100,00%
15.3.15	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	18,00	13,95	251,10			-	18,00	251,10	-	R\$	-	100,00%
15.3.16	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	4,00	10,72	42,88			-	4,00	42,88	-	R\$	-	100,00%
15.3.17	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	69,07	58,84	4.064,07			-	69,07	4.064,07	-	R\$	-	100,00%
15.3.18	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	18,48	18,48			-	1,00	18,48	-	R\$	-	100,00%
15.4	ESGOTO E SANITÁRIO 3º PAVIMENTO		-	-	-			-	0,00	-	-	R\$	-	
15.4.1	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	1,00	28,69	28,69			-	1,00	28,69	-	R\$	-	100,00%
15.4.2	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIOLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,10	53,24	165,04			-	3,10	165,04	-	R\$	-	100,00%
15.4.3	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	19,00	10,72	203,68			-	19,00	203,68	-	R\$	-	100,00%
15.4.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	59,81	15,66	936,62			-	59,81	936,62	-	R\$	-	100,00%
15.5	ÁGUA FRIA E BARRILETE 1º PAVIMENTO		-	-	-			-	0,00	-	-	R\$	-	


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



15.5.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	26,24	131,20			5,00	131,20	R\$	-	100,00%
15.5.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	21,94	109,70			5,00	109,70	R\$	-	100,00%
15.5.3	COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	5,00	24,00	120,00			5,00	120,00	R\$	-	100,00%
15.5.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	9,12	182,40			20,00	182,40	R\$	-	100,00%
15.5.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,40	10,17	14,23			1,40	14,23	R\$	-	100,00%
15.5.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2D, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	5,03	50,30			10,00	50,30	R\$	-	100,00%
15.5.7	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	8,97	44,85			5,00	44,85	R\$	-	100,00%
15.5.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	6,17	30,85			5,00	30,85	R\$	-	100,00%
15.5.9	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	15,66	78,30			5,00	78,30	R\$	-	100,00%
15.5.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,14	10,17	194,65			19,14	194,65	R\$	-	100,00%
15.5.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4D, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	42,00	6,01	252,42			42,00	252,42	R\$	-	100,00%
15.5.12	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	49,00	11,01	539,49			49,00	539,49	R\$	-	100,00%
15.5.13	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	7,12	142,40			20,00	142,40	R\$	-	100,00%
15.5.14	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	104,72	31,56	3.304,96			104,72	3.304,96	R\$	-	100,00%
15.5.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	32,00	8,33	266,56			32,00	266,56	R\$	-	100,00%
15.5.16	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4D INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	20,77	83,08			4,00	83,08	R\$	-	100,00%
15.5.17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2D INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	31,00	19,05	590,55			31,00	590,55	R\$	-	100,00%
15.5.18	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00	16,76	284,92			17,00	284,92	R\$	-	100,00%
15.6	ÁGUA FRIA E BARRILETE 2º PAVIMENTO		-	-	-			0,00	-	R\$	-	-
15.6.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	8,97	53,82			6,00	53,82	R\$	-	100,00%
15.6.2	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	6,53	6,53			1,00	6,53	R\$	-	100,00%
15.6.3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,59	26,74	229,69			8,59	229,69	R\$	-	100,00%
15.6.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	8,62	17,24			2,00	17,24	R\$	-	100,00%
15.6.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4D, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	6,01	24,04			4,00	24,04	R\$	-	100,00%

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

[Handwritten signature]
 N.º 24.000.344.000/2014



15.6.6	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	11,01	154,14				14,00	154,14		R\$	-	100,00%
15.6.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,46	14,92				2,00	14,92		R\$	-	100,00%
15.6.8	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00	5,88	105,84				18,00	105,84		R\$	-	100,00%
15.6.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	69,63	12,39	862,71				69,63	862,71		R\$	-	100,00%
15.6.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	10,63	31,89				3,00	31,89		R\$	-	100,00%
15.6.11	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2D INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	19,05	57,15				3,00	57,15		R\$	-	100,00%
15.7	ÁGUA FRIA E ALIMENTAÇÃO		-	-	-				0,00	-		R\$	-	
15.7.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	8,97	17,94				2,00	17,94		R\$	-	100,00%
15.7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,48	10,17	360,83				35,48	360,83		R\$	-	100,00%
15.7.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	8,79	17,58				2,00	17,58		R\$	-	100,00%
15.7.4	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	33,57	33,57				1,00	33,57		R\$	-	100,00%
15.7.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	7,46	193,96				26,00	193,96		R\$	-	100,00%
15.7.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	179,68	12,39	2.226,23				179,68	2.226,23		R\$	-	100,00%
15.7.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,29	21,04	216,50				10,29	216,50		R\$	-	100,00%
15.7.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	10,63	127,56				12,00	127,56		R\$	-	100,00%
15.7.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	17,00	17,00				1,00	17,00		R\$	-	100,00%
15.7.10	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	3,00	1.934,46	5.803,38				3,00	5.803,38		R\$	-	100,00%
15.8	APARELHOS E METAIS		-	-	-				0,00	-		R\$	-	
15.8.1	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA D FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	102,52	205,04				0,00	-	2,00	R\$	205,04	0,00%
15.8.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	532,72	7.990,80	10,00	5.327,20	10,00		5.327,20	5,00	R\$	2.663,60	66,67%
15.8.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	399,44	3.594,96				0,00	-	9,00	R\$	3.594,96	0,00%
15.8.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	258,82	3.882,30				0,00	-	15,00	R\$	3.882,30	0,00%
15.8.5	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2D OU 3/4D, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	1.077,49	4.309,96				0,00	-	4,00	R\$	4.309,96	0,00%


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 DANIELA FERREIRA
 TITULAR
 MPB - 24.091.344/2017
 CNPJ: 24.091.344/2017



15.8.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	683,28	2.733,12			0,00		4,00	R\$	2.733,12	0,00%
15.8.7	Lavatório p/ consultorios com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	7,00	1.009,34	7.065,38			0,00		7,00	R\$	7.065,38	0,00%
15.8.8	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	801,33	1.602,66			0,00		2,00	R\$	1.602,66	0,00%
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA										R\$		
16.1	PONTOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS - TÉRREO										R\$		
16.1.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00	28,30	1.358,40			0,00		48,00	R\$	1.358,40	0,00%
16.1.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	196,00	56,20	11.015,20			0,00		196,00	R\$	11.015,20	0,00%
16.1.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	-	56,20	-			0,00		-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.4	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-	68,55	-			0,00		-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.5	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR LED 15W	un	-	102,52	-			0,00		-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.6	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	38,00	294,25	11.181,50			38,00	11.181,50	-	R\$	-	100,00%
16.1.6.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	282,00	17,12	4.827,84			282,00	4.827,84	-	R\$	-	100,00%
16.1.7	CABOS - TÉRREO										R\$		
16.1.7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10.000,00	5,12	51.200,00			10.000,00	51.200,00	-	R\$	-	100,00%
16.1.7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.000,00	8,35	50.100,00			6.000,00	50.100,00	-	R\$	-	100,00%
16.1.7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	11,46	3.438,00			300,00	3.438,00	-	R\$	-	100,00%
16.1.7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	28,91	-			0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.8	ELETRODUTOS - TÉRREO										R\$		
16.1.8.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00	14,09	12.681,00			900,00	12.681,00	-	R\$	-	100,00%
16.1.8.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	11,01	-			0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.8.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	10,28	-			0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.8.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	13,50	-			0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.9	DISJUNTORES, MEDIDOR E ATERRAMENTO - TÉRREO										R\$		
16.1.9.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	89,59	-			0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.9.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	119,45	-			0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.9.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	101,05	-			0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 2000041424



16.1.9.4	HASTE DE ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	112,43	224,86	-	0,00	-	2,00	R\$	224,86	0,00%
16.1.9.5	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	2.885,04	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.9.6	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	-	324,61	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.2	PONTOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS - 1 PAVIMENTO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
16.2.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	76,00	56,20	4.271,20	-	0,00	-	76,00	R\$	4.271,20	0,00%
16.2.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	28,30	339,60	-	0,00	-	12,00	R\$	339,60	0,00%
16.2.2	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-	68,55	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.2.3	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR LED 15W	un	-	102,52	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.2.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível santonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	14,00	294,25	4.119,50	-	14,00	4.119,50	-	R\$	-	100,00%
16.2.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	90,00	17,12	1.540,80	-	90,00	1.540,80	-	R\$	-	100,00%
16.2.6	CABOS - 1 PAVIMENTO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
16.2.6.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.000,00	5,12	30.720,00	-	6.000,00	30.720,00	-	R\$	-	100,00%
16.2.6.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.000,00	8,35	25.050,00	-	3.000,00	25.050,00	-	R\$	-	100,00%
16.2.6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	28,91	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.2.7	ELETRODUTOS - 1 PAVIMENTO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
16.2.7.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	601,58	14,09	8.476,26	-	601,58	8.476,26	-	R\$	-	100,00%
16.2.7.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	11,01	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.2.7.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	10,28	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.2.7.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	13,50	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.2.8	DISJUNTORES		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
16.2.8.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	89,59	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.2.8.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	119,45	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
17	PRAÇA DE PÚBLICA DE LAZER		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
17.1	SERVIÇOS INICIAIS		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
17.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	1.619,00	3,41	5.520,79	-	1.619,00	5.520,79	-	R\$	-	100,00%
17.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1.619,00	2,92	4.727,48	-	1.619,00	4.727,48	-	R\$	-	100,00%
17.2	PAVIMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
17.2.1	ESTACIONAMENTO LATERAL		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




17.2.1.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	363,80	95,63	34.790,19			0,00		363,80	R\$	34.790,19	0,00%
17.2.1.2	Colchão de areia	m³	54,57	146,87	8.014,69			0,00		54,57	R\$	8.014,69	0,00%
17.2.2	ESTACIONAMENTO PCD - ENTRADA PRINCIPAL		-	-	-			0,00		-	R\$	-	
17.2.2.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	97,02	95,63	9.278,02			0,00		97,02	R\$	9.278,02	0,00%
17.2.2.2	Colchão de areia	m³	14,55	146,87	2.136,95			0,00		14,55	R\$	2.136,95	0,00%
17.3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - PEDESTRES		-	-	-			0,00		-	R\$	-	
17.3.1	Colchão de areia	m³	111,05	146,87	16.309,91	66,00	9.693,42	66,00	9.693,42	45,05	R\$	6.616,49	59,43%
17.3.2	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	46,18	111,80	5.162,92			0,00		46,18	R\$	5.162,92	0,00%
17.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	250,00	78,26	19.565,00	150,00	11.739,00	150,00	11.739,00	100,00	R\$	7.826,00	60,00%
17.3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	482,22	85,86	41.403,40			0,00		482,22	R\$	41.403,40	0,00%
17.3.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	209,70	52,70	11.051,19			209,70	11.051,19		R\$	-	100,00%
17.3.6	Guia, divisória, em Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00 m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	371,17	36,51	13.551,41	70,00	2.555,70	340,00	12.413,40	31,17	R\$	1.138,01	91,60%
17.4	PARQUE INFANTIL E ÁREA		-	-	-			0,00		-	R\$	-	
17.4.1	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado (h=100cm), com barras superior, inferior e verticais a cada 3.00m (1.1/2") e barra verticais quadrada (1/2") a cada 12cm - Rev 01	m	43,43	484,87	21.057,90			43,43	21.057,90		R\$	-	100,00%
17.4.2	PARQUE INFANTIL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	36.197,40	36.197,40			0,00		1,00	R\$	36.197,40	0,00%
17.4.3	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	111,70	74,68	8.341,75			0,00		111,70	R\$	8.341,75	0,00%
17.4.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	111,70	120,20	13.426,34			111,70	13.426,34		R\$	-	100,00%
17.4.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	111,70	2,85	318,34			111,70	318,34		R\$	-	100,00%
17.5	ILUMINAÇÃO		-	-	-			0,00		-	R\$	-	
17.5.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, COM LÂMPADAS LED 200W, COMPLETO COM CABOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	19,00	5.739,12	109.043,28			19,00	109.043,28		R\$	-	100,00%
17.6	JARDIM		-	-	-			0,00		-	R\$	-	
17.6.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	173,45	14,71	2.551,44			0,00		173,45	R\$	2.551,44	0,00%
17.6.2	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	3,00	530,57	1.591,71			0,00		3,00	R\$	1.591,71	0,00%
17.6.3	Planta - Palmeira Areca (alt=3,00m), fornecimento e plantio	un	3,00	159,29	477,87			0,00		3,00	R\$	477,87	0,00%
17.6.4	Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	15,00	44,87	673,05			0,00		15,00	R\$	673,05	0,00%
17.6.5	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	8,00	86,10	688,80			0,00		8,00	R\$	688,80	0,00%
17.6.6	Planta -Palmeira-rabo-de-raposa, h=7,00m, fornecimento e plantio	un	5,00	1.552,43	7.762,15			0,00		5,00	R\$	7.762,15	0,00%
17.6.7	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais - Murta-de-cheiro - h=4metros	un	57,00	36,49	2.079,93			0,00		57,00	R\$	2.079,93	0,00%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		-	-	-			0,00		-	R\$	-	
18.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	13,00	303,32	3.943,16			0,00		13,00	R\$	3.943,16	0,00%

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



18.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	13,00	20,25	263,25			0,00		13,00	R\$	263,25	0,00%
18.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	49,00	35,77	1.752,73			0,00		49,00	R\$	1.752,73	0,00%
18.4	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	13,00	18,77	244,01			0,00		13,00	R\$	244,01	0,00%
18.5	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	8,00	27,02	216,16			0,00		8,00	R\$	216,16	0,00%
19	SPDA		-		-			0,00		-	R\$	-	
19.1	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	434,14	75,95	32.972,93			0,00		434,14	R\$	32.972,93	0,00%
19.2	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,27	82,69	187,70			0,00		2,27	R\$	187,70	0,00%
19.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	14,00	112,43	1.574,02			0,00		14,00	R\$	1.574,02	0,00%
19.4	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	265,00	4,24	1.123,60			0,00		265,00	R\$	1.123,60	0,00%
19.5	Terminal aéreo 3/8" x 50mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 ou similar - fornecimento	un	188,00	6,46	1.214,48			0,00		188,00	R\$	1.214,48	0,00%
19.6	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	un	75,00	2,58	193,50			0,00		75,00	R\$	193,50	0,00%
19.7	Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação	un	8,00	16,29	130,32			0,00		8,00	R\$	130,32	0,00%
19.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	46,00	25,99	1.195,54			0,00		46,00	R\$	1.195,54	0,00%
19.9	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	3,00	367,39	1.102,17			0,00		3,00	R\$	1.102,17	0,00%
20	SERVIÇOS FINAIS		-		-			0,00		-	R\$	-	
20.1	Plataforma elevatória Vertical Modelo SMART, p/port. neces. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em Aço inox escovado , c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar	un	1,00	47.840,89	47.840,89			0,00		1,00	R\$	47.840,89	0,00%
20.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.657,55	4,01	10.656,77			0,00		2.657,55	R\$	10.656,77	0,00%
21	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO							0,00					
21.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	186,90	R\$ 165,10	30.857,19			186,90	30.857,19		R\$	-	100,00%
22	SUBESTAÇÃO AÉREA 150 KVA		-		-			0,00		-	R\$	-	#DIV/0!
22.1	Transformador de distribuição, 150 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - fornecimento e instalação. af_12/2020	un	1,00	R\$ 23.061,46	23.061,46			0,00		1,00	R\$	23.061,46	0,00%
22.2	Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600	un	1,00	R\$ 1.422,32	1.422,32			0,00		1,00	R\$	1.422,32	0,00%
22.3	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	un	1,00	R\$ 1.251,28	1.251,28			0,00		1,00	R\$	1.251,28	0,00%
22.4	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	un	1,00	R\$ 85,05	85,05			0,00		1,00	R\$	85,05	0,00%
22.5	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	3,00	R\$ 39,57	118,71			0,00		3,00	R\$	118,71	0,00%


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3009041424


 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Nº 23/2020
 DTNº 24/50/3440201



22.6	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	2,00	R\$ 124,36	248,72	-	0,00	-	2,00	R\$	248,72	0,00%	
22.7	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	R\$ 110,36	110,36	-	0,00	-	1,00	R\$	110,36	0,00%	
22.8	Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka	un	3,00	R\$ 470,56	1.411,68	-	0,00	-	3,00	R\$	1.411,68	0,00%	
22.9	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	1,50	R\$ 9,28	13,92	-	0,00	-	1,50	R\$	13,92	0,00%	
22.10	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	1,50	R\$ 21,36	32,04	-	0,00	-	1,50	R\$	32,04	0,00%	
22.11	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	un	4,00	R\$ 15,17	60,68	-	0,00	-	4,00	R\$	60,68	0,00%	
22.12	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	4,00	R\$ 112,43	449,72	-	0,00	-	4,00	R\$	449,72	0,00%	
22.13	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento	kg	6,23	R\$ 133,61	832,65	-	0,00	-	6,23	R\$	832,65	0,00%	
22.14	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento	kg	8,85	R\$ 133,13	1.178,73	-	0,00	-	8,85	R\$	1.178,73	0,00%	
22.15	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 0,80m	un	1,00	R\$ 1.171,99	1.171,99	-	0,00	-	1,00	R\$	1.171,99	0,00%	
22.16	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	12,00	R\$ 11,16	133,92	-	0,00	-	12,00	R\$	133,92	0,00%	
22.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	12,00	R\$ 71,63	859,56	-	0,00	-	12,00	R\$	859,56	0,00%	
22.18	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3,00	R\$ 48,71	146,13	-	0,00	-	3,00	R\$	146,13	0,00%	
22.19	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	un	3,00	R\$ 8,71	26,13	-	0,00	-	3,00	R\$	26,13	0,00%	
22.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	50,00	R\$ 120,34	6.017,00	-	0,00	-	50,00	R\$	6.017,00	0,00%	
22.21	Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	R\$ 2.026,18	2.026,18	-	0,00	-	1,00	R\$	2.026,18	0,00%	
22.22	Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm	un	3,00	R\$ 18,09	54,27	-	0,00	-	3,00	R\$	54,27	0,00%	
22.23	Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento	un	20,00	R\$ 318,54	6.370,80	-	0,00	-	20,00	R\$	6.370,80	0,00%	
22.24	Fornecimento de elo fusível tipo 8k	un	3,00	R\$ 13,02	39,06	-	0,00	-	3,00	R\$	39,06	0,00%	
22.25	Fornecimento de mão francesa plana 726mm	un	2,00	R\$ 10,37	20,74	-	0,00	-	2,00	R\$	20,74	0,00%	
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TERREO E 1º PAVIMENTO	-	-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!	
23.1	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 400 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	UND	124,00	R\$ 189,12	23.450,88	-	124,00	23.450,88	-	R\$	-	100,00%	
23.2	Tê horizontal 400 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UND	27,00	R\$ 200,67	5.418,09	-	44,00	8.829,48	-	17,00	R\$	3.411,39	162,96%
23.3	Cruzeta 400 x 100 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	UND	7,00	R\$ 192,56	1.347,92	-	7,00	1.347,92	-	R\$	-	100,00%	
23.4	Suporte angular 400 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	UND	7,00	R\$ 30,54	213,78	-	7,00	213,78	-	R\$	-	100,00%	
23.5	Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ourolux ou similar	UND	241,00	R\$ 309,58	74.608,78	-	0,00	-	241,00	R\$	74.608,78	0,00%	
23.6	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED	UND	24,00	R\$ 534,09	12.818,16	-	0,00	-	24,00	R\$	12.818,16	0,00%	
23.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	54,00	R\$ 14,48	781,92	-	0,00	-	54,00	R\$	781,92	0,00%	
23.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	4,00	R\$ 16,60	66,40	-	0,00	-	4,00	R\$	66,40	0,00%	
23.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	8,00	R\$ 16,60	132,80	-	0,00	-	8,00	R\$	132,80	0,00%	
23.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 256,10	256,10	-	0,00	-	1,00	R\$	256,10	0,00%	


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 30800/11424



23.11	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	UND	2,00	R\$ 56,33	112,66	-	0,00	-	2,00	R\$	112,66	0,00%
23.12	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	UND	3,00	R\$ 312,44	937,32	-	0,00	-	3,00	R\$	937,32	0,00%
23.13	Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA	UND	2,00	R\$ 309,31	618,62	-	0,00	-	2,00	R\$	618,62	0,00%
23.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00	R\$ 1.022,64	3.067,92	-	0,00	-	3,00	R\$	3.067,92	0,00%
24	SUPERESTRUTURA		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
24.1	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiroiro 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M²	642,65	R\$ 256,40	164.775,46	-	642,65	164.775,46	-	R\$	-	100,00%
26	AGUA PLUVIAL		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
26.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	205,97	R\$ 109,87	22.629,92	-	205,97	22.629,92	-	R\$	-	100,00%
26.2	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	18,00	R\$ 218,83	3.938,94	-	18,00	3.938,94	-	R\$	-	100,00%
26.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	8,00	R\$ 869,84	6.958,72	-	8,00	6.958,72	-	R\$	-	100,00%
27	DRENAGEM - AR CONDICIONADO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
27.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	651,80	R\$ 16,72	10.898,09	-	651,80	10.898,09	-	R\$	-	100,00%
27.2	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	159,00	R\$ 11,01	1.750,59	-	159,00	1.750,59	-	R\$	-	100,00%
27.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	6,00	R\$ 230,62	1.383,72	-	6,00	1.383,72	-	R\$	-	100,00%
Total			VALOR TOTAL DA OBRA:		R\$ 4.105.811,36	MEDIÇÃO 09:	R\$ 60.263,51	ACUMULADO:	R\$ 3.160.884,57	SALDO:	R\$ 944.926,75	76,99%

MEDIÇÃO 09 R\$ 60.263,51 (Sessenta mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos.)

ENGENHEIRO CIVIL - EMPRESA

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

ENGENHEIRA CIVIL - FISCAL DO MUNICÍPIO





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/10/2023 15:13:05.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GbtvMDMrTVC00000.SFP é:

ba7a80c2-c995-4d13-93d1-ee46ede07553

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 10/2023

NRA: GbtvMDMrTVC00000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 155

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	10/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	59328107 / Reinf CP 22613528317 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.996,41	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 51.508,11	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 12.619,77	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 356,54	R\$ 356,54
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 82.480,83	R\$ 356,54

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF	904.030.025-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/11/2023 14:24:46
Nº do recibo de entrega	0000050000177069280



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período apuração	10/2023	Número do Recibo	50000177069280
Data/Hora da Transmissão	10/11/2023 14:24:46	Identificação da Apuração de Débitos	59328107 / Reinf CP 22613528317 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000175703993
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	TANCREDO NEVES	Número	2539
Complemento	EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING	Bairro/Distrito	CAMINHO DAS ARVORES
Município	Salvador	UF	BA
CEP	41820021	Telefone	7197308153
Correio Eletrônico	SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PATRICIA DE CARVALHO MENDES	CPF	90403002591
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	GUSTAVO BORTOLETTO		
CPF	26925381883	CRC	-
UF	-	Telefone	1934710670
Correio Eletrônico	gustavo@visualassessoria.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	279,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 279,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	111,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 111,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	167,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 167,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	22,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 22,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	67,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 67,14		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	335,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 335,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	2.238,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.238,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	5.159,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.159,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	2.063,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.063,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	3.095,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.095,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	412,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 412,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	1.238,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.238,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	6.191,75		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.191,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	41.278,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 41.278,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	1.464,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.464,00		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	17.328,03		
Deduções	Salário Família: 1.286,13 Retenção Lei 9711/98: 16.041,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	668,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 668,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	356,54		
Saldo a Pagar	356,54		



CNPJ 24.597.344/0001-98	Razão Social MP2 CONSTRUCOES LTDA		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.16.23314.9004574-0	Valor Total do Documento 356,54
Observações Nº Recibo Declaração: 50000177069280			Valor Total do Documento 356,54

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	356,54			356,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
	Totais	356,54			356,54



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8	56540385233 8	24071623314 4	90045740320 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 24.597.344/0001-98
Número: 07.16.23314.9004574-0
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 356,54

Pague com o PIX



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 TOMADOR

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE N° CONTROLE: IcvaqM0hxC90000-8 N° ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
 LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	290,31	0,00	0,00	0,00	290,31
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	725,96	0,00	0,00	0,00	725,96
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	108,89	0,00	0,00	0,00	108,89
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	1.125,16	0,00	0,00	0,00	1.125,16
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	210,52	0,00	0,00	0,00	210,52
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	210,52	0,00	0,00	0,00	210,52
TOTAL A RECOLHER	210,52	0,00	0,00	0,00	210,52

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 TOMADOR

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: SHOPPING SANTA LUZ N° CONTROLE: B659v1uU5500000-4 N° ARQUIVO: GbtvMMDMrTVC0000-0
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	876,77	0,00	0,00	0,00	876,77
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.238,26	0,00	0,00	0,00	2.238,26
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	335,73	0,00	0,00	0,00	335,73
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.271,30	0,00	0,00	0,00	3.271,30
OUTRAS ENTIDADES	649,09	0,00	0,00	0,00	649,09
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	649,09	0,00	0,00	0,00	649,09
TOTAL A RECOLHER	3.920,39	0,00	0,00	0,00	3.920,39

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 30/10/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 15:09:49

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	8
REMUNERAÇÃO	13.399,26
DEPÓSITO	1.071,94
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.071,94

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
MP2 CONSTRUCOES LTDA			900045580171		0079	2216	507
0,00	0,00	210,52	0,00	0,00	0,00	210,52	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : MP2 CONSTRUCOES LTDA - 24.597.344/0001-98 VALOR COMPENSADO: R\$ 1.125,16 - 05/2021 A 05/2021							
MP2 CONSTRUCOES LTDA			900162765275		0079	2208	507
876,77	2.573,99	649,09	179,46	0,00	0,00	3.920,39	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : MP2 CONSTRUCOES LTDA - 24.597.344/0001-98							



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 30/10/2023
HORA: 15:09:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 155

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE

INSCRIÇÃO: 900045580171

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	63.641,68	1.125,16	62.516,52

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS):

787,62



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000102 719401802316 107682200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
Nº ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
Nº CONTROLE: PmJvG3cplxf0000-6
COD REC: 155 COMP: 10/2023

TOMADOR/OBRA : TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO
LOGRADOURO
DOUTOR CELINO GOMES DA SILVA
INSCRIÇÃO: 900045580171
BAIRRO
OURO NEGRO
CIDADE
CANDEIAS
CEP
43805190
UF
BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.629,80	REM SEM 13° SALÁRIO	3.629,80
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	290,38
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.629,80	REM SEM 13° SALÁRIO	3.629,80
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	290,31	DEPÓSITO	290,38
VAL DEVIDO PREV SOC	210,52	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000102 719401802316 107682200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
N° ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
N° CONTROLE: PmJvG3cplx0000-6
COD REC: 155 COMP: 10/2023

TOMADOR/OBRA : SHOPPING SANTA LUZ
LOGRADOURO
SANTA LUZ

INSCRIÇÃO: 900162765275
BAIRRO CIDADE CEP UF
CENTRO SANTALUZ 48880000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	10.969,14	REM SEM 13° SALÁRIO	9.769,46
REM BASE CALC 13° SAL	222,16	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	781,56
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	10.969,14	REM SEM 13° SALÁRIO	9.769,46
REM BASE CALC 13° SAL	222,16	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	876,77	DEPÓSITO	781,56
VAL DEVIDO PREV SOC	3.920,39	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	6



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000102 719401802316 107682200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

Nº ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0

Nº CONTROLE: PmJvG3cplx0000-6

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 10/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO	14.598,94
REM BASE CALC 13º SAL	222,16
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.167,08
VAL DEVIDO PREV SOC	4.130,91

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO	13.399,26
REM 13º SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	1.071,94
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8

TOTAL TRABALHADORES 9

TOTAL A RECOLHER 1.071,94





Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 2539 - CAMINHO DAS ARVORES,
SALVADOR/BA - CEP: 41820021 - EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING
TORRE LONDRES SALA 913
Número da Certidão: 383588

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.gov.br>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 16:04:57 horas do dia 02/10/2023.
Válida até dia 31/12/2023.

Código de controle da certidão: **A37B.7D0F.7F57.2371.03CB.5B82.2999.D322**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20235947409

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/11/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:15:43 do dia 01/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2023.

Código de controle da certidão: **9BA6.59EA.5E4D.06E7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão n°: 53224576/2023

Expedição: 02/10/2023, às 16:12:02

Validade: 30/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/11/2023 a 15/12/2023

Certificação Número: 2023111609222803238798

Informação obtida em 22/11/2023 18:32:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000102 719401802316 107682200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE INSCRIÇÃO: 900045580171

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ELISEU PEREIRA COSTA			124.80425.44-6	16/03/2022	01				07170
1.400,22	0,00		0,00	107,83			112,02		0,00
GEOVANE DOS SANTOS PINTO			200.52036.03-5	08/12/2020	01				07155
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,36		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 3.629,80

0,00

0,00

290,31

290,38



0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000102 719401802316 107682200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE N° DE CONTROLE: IcvaqM0hxC90000-8
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021

N° ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900045580171

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.629,80	0,00	3.629,80	0,00
TOTAIS:	2	3.629,80	0,00	3.629,80	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES LTDA
 COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE N° DE CONTROLE: IcvagM0hx90000-8

N° ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 900045580171

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	210,52	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	290,31
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		05/2021 PERÍODO FINAL:	05/2021 VALOR SOLICITADO:	63.641,68	
PERÍODO INICIAL:	1.125,16	VALOR A COMPENSAR:	62.516,52	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	787,62

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
-------------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000102 719401802316 107682200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: SHOPPING SANTA LUZ FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900162/65275

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
MAICON SANTANA LIMA	1.199,68	222,16	164.39481.00-3 222,16	13/09/2023	01		27/10/2023 I3 0,00	07170 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000102 719401802316 107682200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: SHOPPING SANTA LUZ

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 900162/65275

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARLOS VINICIUS DE JESUS SAMPAIO			162.76497.35-6		13/09/2023	01			07170
1.244,12	0,00		0,00		93,79			99,53	0,00
DOMINGOS FEITOSA DOS SANTOS			125.33468.86-1		13/09/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00		182,48			178,37	0,00
DONATO BRITO ARAUJO JUNIOR			160.15112.32-9		04/09/2023	01			07170
1.332,98	0,00		0,00		101,78			106,64	0,00
ELSON SILVA DE CARVALHO			200.10928.97-3		04/09/2023	01			07170
1.400,22	0,00		0,00		107,83			112,02	0,00
JOSENI ANUNCIACAO MONTEIRO			162.01080.59-8		04/09/2023	01			07170
1.332,98	0,00		0,00		101,78			106,64	0,00
LUCIANO SANTANA BARRETO			203.16822.38-2		13/09/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00		182,48			178,36	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 10.969,14

222,16

222,16

876,77

781,56



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000102 719401802316 107682200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: SHOPPING SANTA LUZ N° DE CONTROLE: B659v1uU5500000-4

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021

N° ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900162165275

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	9.769,46	0,00	10.969,14	222,16
TOTAIS:	7	9.769,46	0,00	10.969,14	222,16



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: SHOPPING SANTA LUZ N° DE CONTROLE: B659v1uU5500000-4

N° ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 900162/65275

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.920,39	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	876,77
SALÁRIO FAMÍLIA:	179,46	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100000102 719401802316 107682200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: PmJvG3cplx0000-6

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

N° ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	14.598,94	222,16	14.598,94	222,16
TOTAIS:	9	14.598,94	222,16	14.598,94	222,16



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000102 719401802316 107682200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA N° DE CONTROLE: PmJvG3cplx0000-6 N° ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 13.399,26
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.071,94	0,00	0,00	0,00	1.071,94



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES LTDA N° DE CONTROLE: PmJvG3cplxf0000-6 N° ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
 COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.130,91	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.167,08
SALÁRIO FAMÍLIA:	179,46	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 63.641,68
 VALOR ABATIDO: 1.125,16 VALOR A COMPENSAR: 62.516,52 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 787,62

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	1	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0								



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 9ª MEDIÇÃO – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 01 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021



FOTO 02 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

CONTRATO Nº 001/2023
Medição de OBRAS
Data: 31/10/2023

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 03 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021



FOTO 04 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3009041424




[Handwritten signature]

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 05 - CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO



FOTO 06 - CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

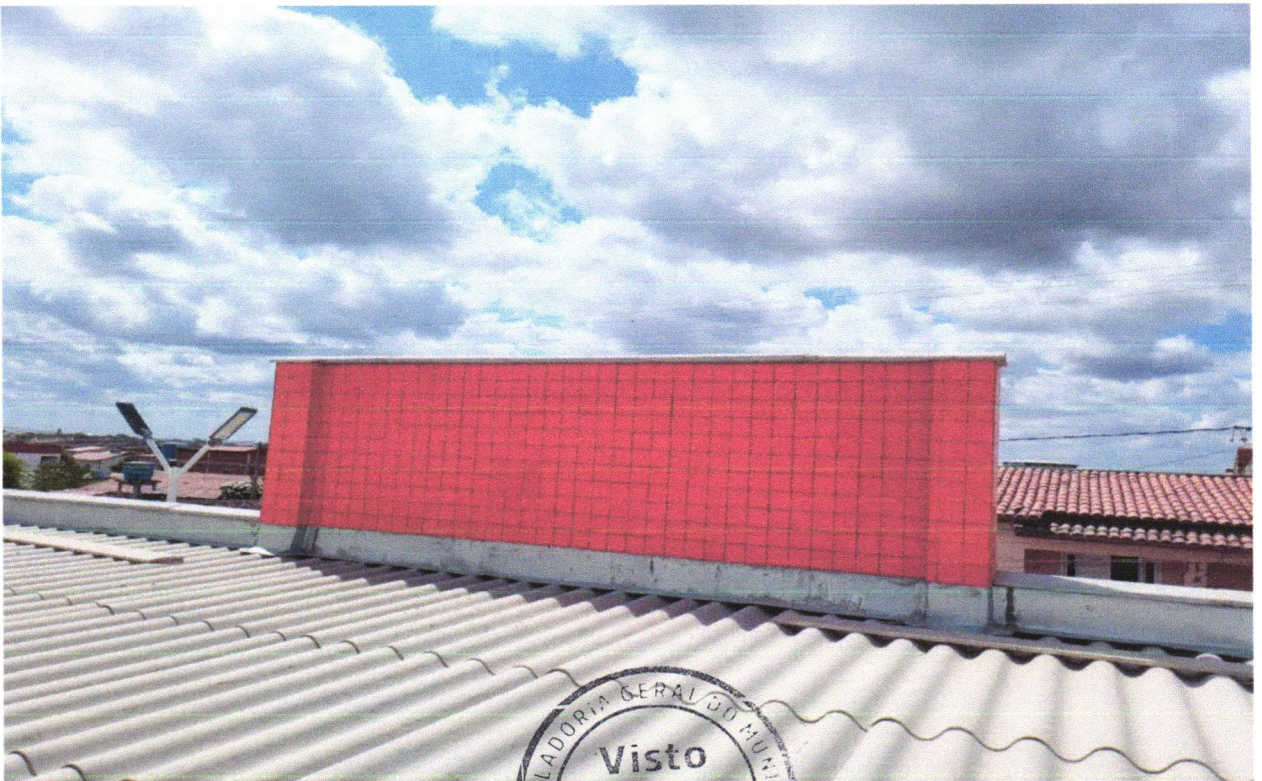

Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3009041424



[Handwritten signature]
CANTILHA
Engenheira Civil
CREA-BA 24.507.941/03-1/02

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 07 - CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

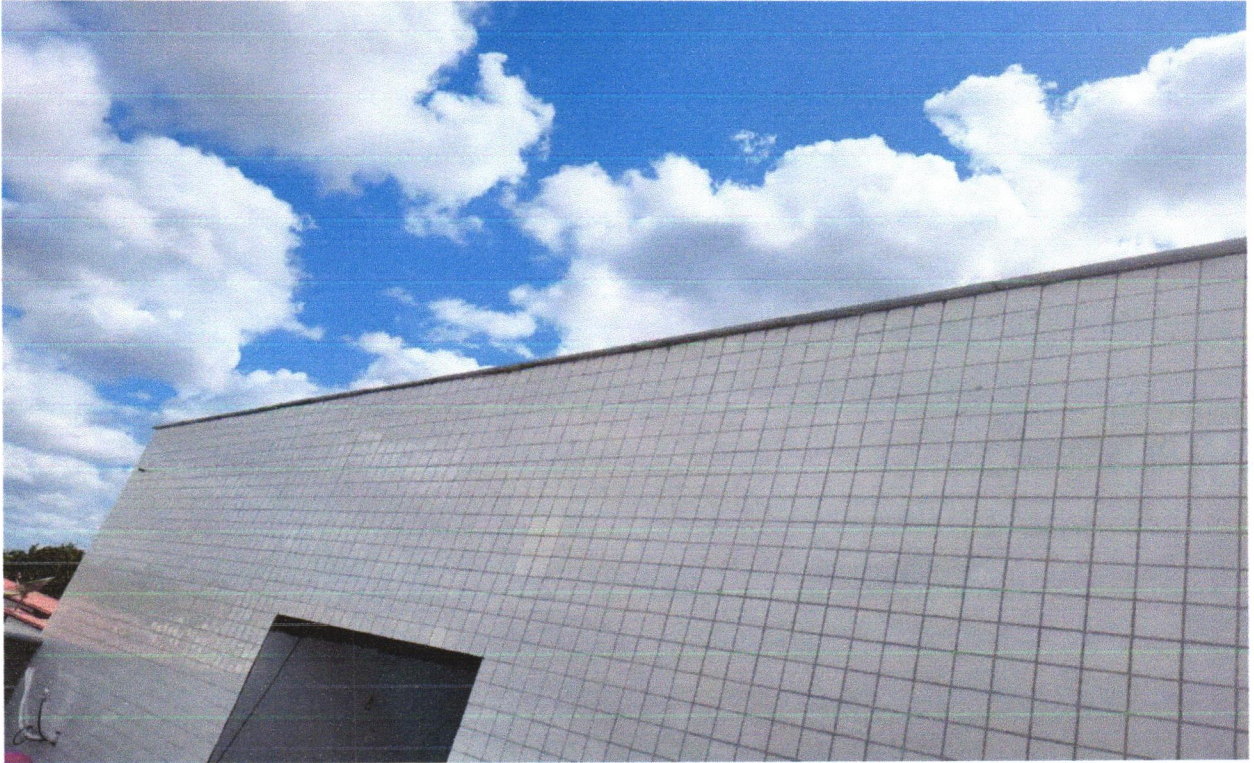


FOTO 08 - CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



[Handwritten Signature]
SANTALUZ - BA
Rua: ...
Município de SantaLuz - Bahia
CEP: 24.321-000

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 09 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017



FOTO 10 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



[Handwritten signature]
DANIELA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-BA 3000041424
UNPU 24 307 44300117

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 11 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014



FOTO 12 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014



Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424




[Handwritten signature]

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 15 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



FOTO 16 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

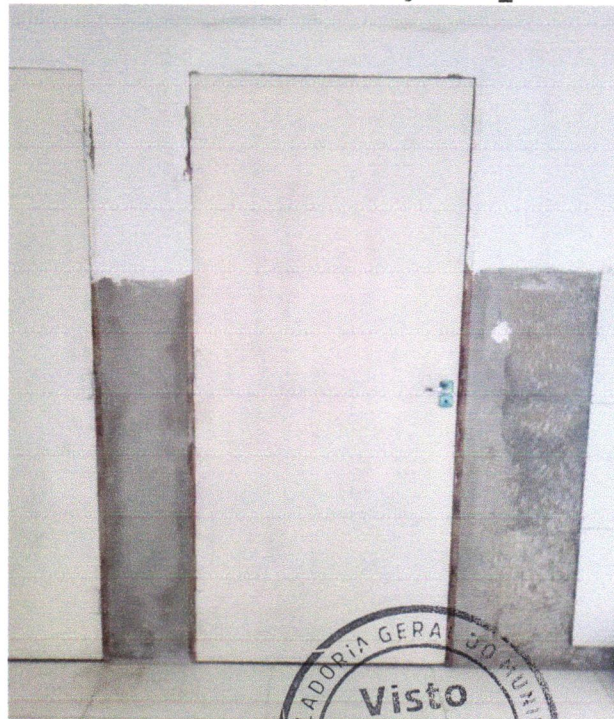

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



[Handwritten signature]
[Illegible text]

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 17 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



FOTO 18 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



[Handwritten signature]
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CNPJ 24.097.344/0001-00

DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 13 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



FOTO 14 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

SAVILLA
CREA-BA 3000041424
MÉD. 24 591 24 1030 1158



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 15 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).AF_01/2016


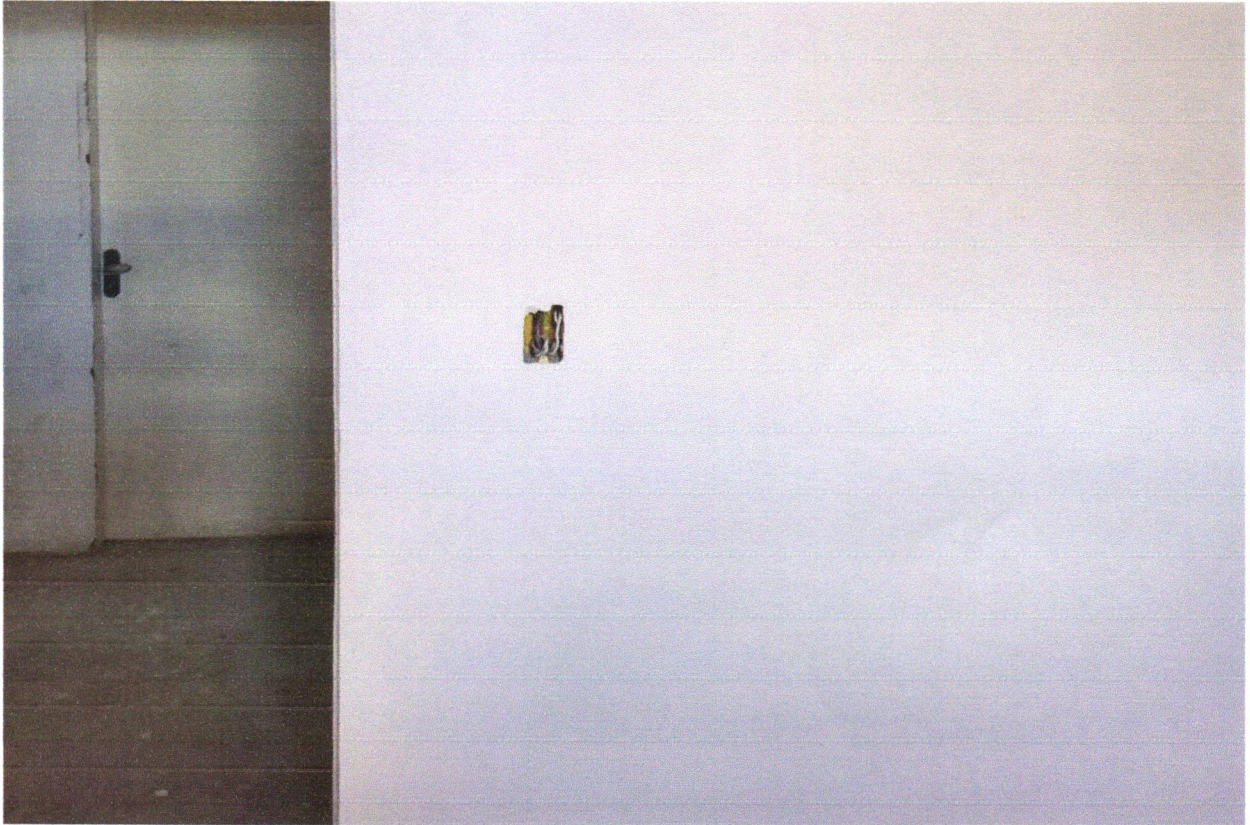


FOTO 16 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).AF_01/2016



Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

SANTALUZ
BAHIA
07413-24-501-3443001-34

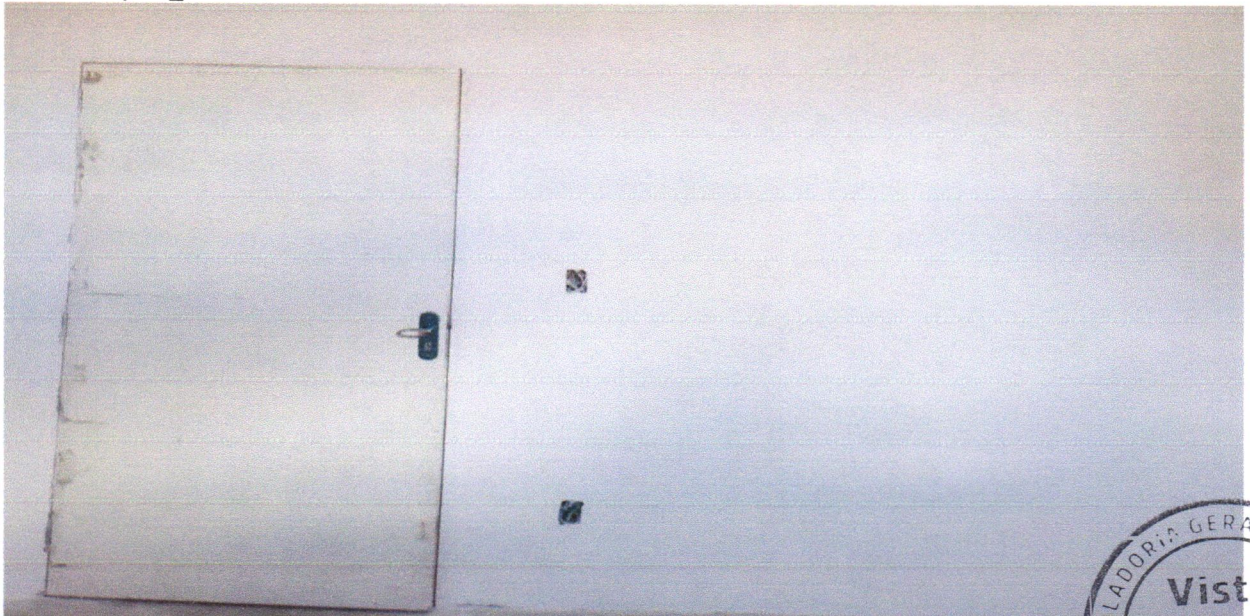

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 19 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015



FOTO 20 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



[Handwritten signature]
DANIELA M. S. OLIVEIRA
MÉDICA
CRM-BA 24.937/04/10/2015

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 19 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015



FOTO 20 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015



Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



[Handwritten signature]
 CARILLY
 M...
 24/10/2023

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 21 – COLCHÃO DE AREIA



FOTO 22 - COLCHÃO DE AREIA



Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



[Handwritten signature]
MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA
RUA 24 DE ABRIL, 2000 - 44100-000

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 23 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 12/2015



FOTO 24 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 12/2015



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



[Handwritten signature]
CONTROLEADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SANTA LUZ - BAHIA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 23 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015



FOTO 24 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



[Handwritten signature]
[Illegible text]

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 25 - GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00 M), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3




FOTO 26 - GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00 M), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



[Handwritten signature]

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data													
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				04/10/2023													
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		CONTRATO N° 254/2022			LICITAÇÃO N° 0001/2022			RDO: 125				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas:		Manhã: (1)			Tarde: (1)			Noite: ()				CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.											MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		EXECUÇÃO DE CONCRETO INSTALAÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INSTALAÇÃO DE GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO											Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 19 Ajudante Geral 20 Calceteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador 3						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO																	
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória																	
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:														
Data: 04/10/2023					Data: 04/10/2023														



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				05/10/2023							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 126				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DE CONCRETO INSTALAÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INSTALAÇÃO DE GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							1
				Mestre de obra							1
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
Pedreiro							19				
Ajudante Geral							20				
Calceteiro											
Carpinteiro							3				
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor							3				
Armador							3				
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão MuncK							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/10/2023				Data: 05/10/2023							


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				09/10/2023	x								
				S	T	Q	Q	S	S	D			
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 130				EFETIVO PESSOAL					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CONCRETO INSTALAÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INSTALAÇÃO DE GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				Gerente de Obra			1						
				Engenheiro			1						
				Tec. de Segurança			1						
				Aux Adm			1						
				Mestre de obra			1						
				Encarregado geral									
				Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro			19						
				Ajudante Geral			20						
				Calçeteiro									
				Carpinteiro			3						
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor			3						
				Armador			3						
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO			QTDE.						
				Veículo Leve									
				Caminhão Muncck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 09/10/2023				Data: 09/10/2023									


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



 Data: 24/09/2023




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 131				10/10/2023						
				S T Q Q S S D X EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P ACABAMENTOS PARA FORRO EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA				Gerente de Obra						
				Engenheiro		1				
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm		1				
				Mestre de obra		1				
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro		19				
				Ajudante Geral		20				
				Calçeteiro						
				Carpinteiro		3				
				Operador de Motosserra						
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor		3								
Armador		3								
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/10/2023				Data: 10/10/2023						


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				11/10/2023						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 132						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA				CATEGORIA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral						
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P ACABAMENTOS PARA FORRO EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 18 Ajudante Geral 20 Calceteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador 3						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/10/2023				Data: 11/10/2023						



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data												
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 133				12/10/2023												
Condições Climáticas:		Manhã: (1)			Tarde: (1)			Noite: ()				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom			2 - Chuva c/ cond. Trab.			3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA						
												MÃO DE OBRA INDIRETA						
												Gerente de Obra						
												Engenheiro						
												Tec. de Segurança						
												Aux Adm						
												Mestre de obra						
												Encarregado geral						
												Hh DO DIA						
												MÃO DE OBRA DIRETA						
												Topografo						
												Auxiliar de topografia						
												Pedreiro						
												Ajudante Geral						
												Calceiro						
												Carpinteiro						
												Operador de Motosserra						
												Motorista						
												Montador						
												Montador/Eletricista						
												Eletricista						
												Operador de Patrol						
												Operador de Escavadeira						
												Operador de Pá carregadeira						
												Motorista de caçamba						
												Pintor						
												Armador						
												Hh DO DIA						
												RESUMO DO EFETIVO						
												EFETIVO DO DIA						
												JORNADA DE TRABALHO						
												Hh DO DIA						
												Hh ACUMULADO						
												EFETIVO EQUIPAMENTOS						
												TIPO						
												QTDE.						
												Veículo Leve						
												Caminhão Muncck						
												Caminhão Toco						
												Escavadeira						
												Pá carregadeira						
												Caçamba						
												Patrol						
												PC 200						
												Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:												FISCALIZAÇÃO:						
Data:		12/10/2023										Date:						
												12/10/2023						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P ACABAMENTOS PARA FORRO EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA																		
CONSIDERAÇÕES																		
OBSERVAÇÕES																		



Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Data: 12/10/2023




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 134				13/10/2023						
				S T Q Q X S S D						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA				CATEGORIA						
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P ACABAMENTOS PARA FORRO EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 19 Ajudante Geral 20 Calceteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador 3						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/10/2023				Data: 13/10/2023						



Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				16/10/2023	X										
				S	T	Q	Q	S	S	D					
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 137								EFETIVO PESSOAL			
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()												CATEGORIA		QTDE	
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.												MÃO DE OBRA INDIRETA			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,												Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral			
												Hh DO DIA			
												MÃO DE OBRA DIRETA			
												Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 18 Ajudante Geral 20 Calceteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador 3			
												Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES												RESUMO DO EFETIVO			
												EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES												EFETIVO EQUIPAMENTOS			
												TIPO		QTDE.	
												Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 16/10/2023				Data: 16/10/2023											



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Data: 16/10/2023




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				24/10/2023						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 145				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 19 Ajudante Geral 20 Calceteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador 3 Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/10/2023				Data: 24/10/2023						


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				25/10/2023	S	T	X	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 148								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 19 Ajudante Geral 20 Calçeteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador 3 Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA: Data: 25/10/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 25/10/2023								



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Data: 25/10/2023




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				26/10/2023							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 147				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral							
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 19 Ajudante Geral 20 Calcetelro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador 3							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 26/10/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 26/10/2023							


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Data: 26/10/2023




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data			
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 148				27/10/2023			
				S	T	Q	Q
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA			
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,				MÃO DE OBRA INDIRETA			
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral			
				Hh DO DIA			
				MÃO DE OBRA DIRETA			
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 18 Ajudante Geral 20 Calceteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador 3			
				Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO			
				EFETIVO DO DIA			
				JORNADA DE TRABALHO			
				Hh DO DIA			
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS			
				TIPO			
				QTDE.			
				Veículo Leve			
				Caminhão Muncck			
				Caminhão Toco			
				Escavadeira			
				Pá carregadeira			
				Caçamba			
Patrol							
PC 200							
Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:			
Data: 27/10/2023				Data: 27/10/2023			



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

FISCALIZAÇÃO:
 Assinatura: _____
 Nome: _____
 CPF: _____




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		28/10/2023		S	T	Q	Q	S	S
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		CONTRATO Nº 254/2022		LICITAÇÃO Nº 0001/2022		RDO: 149		EFETIVO PESSOAL			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()								CATEGORIA		QTDE	
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA			
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra			
								Engenheiro			
								Tec. de Segurança			
								Aux Adm			
								Mestre de obra			
								Encarregado geral			
								Hh DO DIA			
								MÃO DE OBRA DIRETA			
								Topografo			
								Auxiliar de topografia			
								Pedreiro			
								Ajudante Geral			
								Calceiteiro			
								Carpinteiro			
								Operador de Motosserra			
								Motorista			
								Montador			
								Montador/Eletricista			
								Eletricista			
								Operador de Patrol			
								Operador de Escavadeira			
								Operador de Pá carregadeira			
								Motorista de caçamba			
								Pintor			
								Armador			
								Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO			
								EFETIVO DO DIA			
								JORNADA DE TRABALHO			
								Hh DO DIA			
								Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS			
								TIPO		QTDE.	
								Veiculo Leve			
								Caminhão Munck			
								Caminhão Toco			
								Escavadeira			
								Pá carregadeira			
								Caçamba			
								Patrol			
								PC 200			
								Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 28/10/2023		Data: 28/10/2023									



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Data: 28/10/2023



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data	X									
				30/10/2023	S	T	Q	Q	S	S	D			
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 151										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL					CATEGORIA				QTDE	
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA										
1- Tempo Bom 2 - Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral										
				Hh DO DIA										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 19 Ajudante Geral 20 Calceteiro Carpinteiro 3 Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador 3										
				Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 30/10/2023				Data: 30/10/2023										



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				31/10/2023								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 254/2022				LICITAÇÃO Nº 0001/2022				RDO: 152		CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra								
				Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm 1								
				Mestre de obra 1								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 19								
				Ajudante Geral 20								
				Calceiteiro								
				Carpinteiro 3								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pé carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor 3								
				Armador 3								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTDE.	
				Veículo Leve								
				Caminhão MuncK								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pé carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 31/10/2023				Data: 31/10/2023								
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,												


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 FISCALIZAÇÃO:



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data		X									
		01/11/2023		S	T	Q	Q	S	S	D			
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ								EFETIVO PESSOAL			
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS													
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CONTRATO N° 254/2022		LICITAÇÃO N° 0001/2022		RDO: 122					CATEGORIA		
SIMBOLOGIA		1 - Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3 - Chuva s/ cond. Trab.					QTDE		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											MÃO DE OBRA INDIRETA		
EXECUÇÃO DE CONCRETO INSTALAÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INSTALAÇÃO DE GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO											Gerente de Obra		
											Engenheiro		1
											Tec. de Segurança		
											Aux Adm		1
											Mestre de obra		1
											Encarregado geral		
Hh DO DIA													
MÃO DE OBRA DIRETA													
Topografo													
Auxiliar de topografia													
Pedreiro											19		
Ajudante Geral											20		
Calceiteiro													
Carpinteiro											3		
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor											3		
Armador											3		
CONSIDERAÇÕES											RESUMO DO EFETIVO		
											EFETIVO DO DIA		
											JORNADA DE TRABALHO		
											Hh DO DIA		
											Hh ACUMULADO		
OBSERVAÇÕES											EFETIVO EQUIPAMENTOS		
											TIPO		
											QTDE.		
											Veículo Leve		
											Caminhão Munck		
											Caminhão Toco		
											Escavadeira		
											Pá carregadeira		
											Caçamba		
											Patrol		
											PC 200		
											Placa Vibratória		
GERENTE DE OBRA:											FISCALIZAÇÃO:		
Data: 01/11/2023											Data: 01/11/2023		

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

[Handwritten signature]





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Data: 02/11/2023
S T Q Q S S D

CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 123

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	1
Mestre de obra	1
Encarregado geral	

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	19
Ajudante Geral	20
Calceiteiro	
Carpinteiro	3
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	3
Armador	3

Hh DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA
Hh ACUMULADO

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE
Veículo Leve	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

EXECUÇÃO DE CONCRETO
INSTALAÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
INSTALAÇÃO DE GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 02/11/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data: 02/11/2023

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CONTRATO Nº 254/2022

LICITAÇÃO Nº 0001/2022

RDO: 124

Data

03/11/2023

					X		
S	T	Q	Q	S	S	D	

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA	QTDE
MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	1
Mestre de obra	1
Encarregado geral	
MÃO DE OBRA DIRETA	
Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	19
Ajudante Geral	20
Calçeteiro	
Carpinteiro	3
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Plintor	3
Armador	3

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

CATEGORIA	QTDE
MÃO DE OBRA DIRETA	
Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	19
Ajudante Geral	20
Calçeteiro	
Carpinteiro	3
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Plintor	3
Armador	3

Hh DO DIA

EXECUÇÃO DE CONCRETO
 INSTALAÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
 INSTALAÇÃO DE GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO
 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA
 KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
 JORNADA DE TRABALHO
 Hh DO DIA
 Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 03/11/2023

Data: 03/11/2023

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

[Handwritten Signature]
 Data: 03/11/2023





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CONTRATO N° 254/2022

LICITAÇÃO N° 0001/2022

RDO: 125

Data	04/11/2023						
	S	T	Q	Q	S	S	D

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calceteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Armador

Hh DO DIA

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO QTDE

Veículo Leve

Caminhão MuncK

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

Condições Climáticas

SIMBOLOGIA

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

1- Tempo Bom

2 - Chuva c/ cond. Trab.

3- Chuva s/ cond. Trab.

FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 04/11/2023


FISCALIZAÇÃO:

Data: 04/11/2023


Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

[Handwritten signature]




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				X	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 127		08/11/2023							EFETIVO PESSOAL	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE				
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA				
EXECUÇÃO DE CONCRETO INSTALAÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INSTALAÇÃO DE GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		Gerente de Obra		Engenheiro		1				
		Téc. de Segurança		Aux Adm		1				
		Mestre de obra		Encarregado geral		1				
		Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA		Topografo						
		Auxiliar de topografia		Pedreiro		19				
		Ajudante Geral		Carpinteiro		3				
		Operador de Motosserra		Motorista						
		Montador		Montador/Eletricista						
		Eletricista		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba		Pintor		3				
		Armador				3				
		Hh DO DIA								
		CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA		
						JORNADA DE TRABALHO				
						Hh DO DIA				
						Hh ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO				
						Veículo Leve				
						Caminhão Munck				
						Caminhão Toco				
						Escavadeira				
						Pá carregadeira				
						Caçamba				
						Patrol				
						PC 200				
						Placa Vibratória				
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 08/11/2023		Data: 08/11/2023								



Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 130				09/11/2023						
				S	T	Q	Q	S	S	D
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA				CATEGORIA				QTDE		
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CONCRETO INSTALAÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INSTALAÇÃO DE GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				Gerente de Obra						
				Engenheiro				1		
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm				1		
				Mestre de obra				1		
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro				19		
				Ajudante Geral				20		
				Calceteiro						
				Carpinteiro				3		
				Operador de Motosserra						
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor				3						
Armador				3						
Hh DO DIA										
RESUMO DO EFETIVO										
EFETIVO DO DIA										
JORNADA DE TRABALHO										
Hh DO DIA										
Hh ACUMULADO										
EFETIVO EQUIPAMENTOS										
TIPO				QTDE.						
Veículo Leve										
Caminhão Munck										
Caminhão Toco										
Escavadeira										
Pá carregadeira										
Caçamba										
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/11/2023				Data: 09/11/2023						



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Data: 09/11/2023




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 131				10/11/2023						
Condições Climáticas:		S E T Q Q S S D				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA						
		Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
		FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P				Engenheiro 1						
		ACABAMENTOS PARA FORRO				Tec. de Segurança						
		EMASSAMENTO COM MASSA				Aux Adm 1						
		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA				Mestre de obra 1						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro 19						
						Ajudante Geral 20						
						Calceiteiro						
						Carpinteiro 3						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor 3						
						Armador 3						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QTDE.						
						Veículo Leve						
						Caminhão MuncK						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 10/11/2023		Data: 10/11/2023										



Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						13/11/2023	X	S	T	Q	Q	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 134		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA										
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P ACABAMENTOS PARA FORRO EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA		Gerente de Obra			1							
		Engenheiro			1							
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm			1							
		Mestre de obra			1							
		Encarregado geral										
		Hh DO DIA										
		CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA								
		OBSERVAÇÕES		Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro			10					
				Ajudante Geral			20					
				Calceiteiro								
				Carpinteiro			3					
				Operador de Motosserra								
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor			3									
Armador			3									
Hh DO DIA												
RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO QTDE.										
		Veículo Leve										
		Caminhão MuncK										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 13/11/2023		Data: 13/11/2023										



Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Data: 13/11/2023



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																									
						14/11/2023								S	T	Q	Q	S	S	D											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 135		EFETIVO PESSOAL																													
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA					QTDE																								
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA																													
1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P ACABAMENTOS PARA FORRO EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 19 Ajudante Geral 20 Calceteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador 3																													
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO																													
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																													
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>										TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																														
Veículo Leve																															
Caminhão Munck																															
Caminhão Toco																															
Escavadeira																															
Pá carregadeira																															
Caçamba																															
Patrol																															
PC 200																															
Placa Vibratória																															
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																													
Data: 14/11/2023		Data: 14/11/2023																													


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data	15/11/2023	S	T	Q	Q	S	S	D
------	------------	---	---	---	---	---	---	---

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CONTRATO Nº 254/2022

LICITAÇÃO Nº 0001/2022

RDO: 136

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

CATEGORIA

QTDE

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

1

Mestre de obra

1

Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

19

Ajudante Geral

20

Calceteiro

Carpinteiro

3

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

3

Armador

3

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:


Data: 15/11/2023

Data: 15/11/2023

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

[Handwritten signature]




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				19/11/2023	S	T	Q	Q	S	S	D	X
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 140								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA QTDE				
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador								
				Hh DO DIA								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE.								
				Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA: Data: 19/11/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 19/11/2023								



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data																							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			20/11/2023 X S T Q Q S S D																							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		CONTRATO N° 254/2022			LICITAÇÃO N° 0001/2022			RDD: 141			EFETIVO PESSOAL																	
Condições Climáticas:		Manhã: (1)			Tarde: (1)			Noite: ()			CATEGORIA QTDE																	
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom			2- Chuva c/ cond. Trab.			3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA																	
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,										Gerente de Obra							1											
										Engenheiro							1											
										Tec. de Segurança																		
										Aux Adm							1											
										Mestre de obra							1											
										Encarregado geral																		
										Hh DO DIA																		
										SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										MÃO DE OBRA DIRETA								
																				Topografo								
																				Auxiliar de topografia								
																				Pedreiro							19	
																				Ajudante Geral							20	
																				Calçeteiro								
																				Carpinteiro							3	
																				Operador de Motosserra								
Motorista																												
Montador																												
Montador/Eletricista																												
Eletricista																												
Operador de Patrol																												
Operador de Escavadeira																												
Operador de Pá carregadeira																												
Motorista de caçamba																												
Pintor							3																					
Armador							3																					
Hh DO DIA																												
CONSIDERAÇÕES										RESUMO DO EFETIVO																		
										EFETIVO DO DIA																		
										JORNADA DE TRABALHO																		
										Hh DO DIA																		
										Hh ACUMULADO																		
OBSERVAÇÕES										EFETIVO EQUIPAMENTOS																		
										TIPO							QTDE.											
										Veículo Leve																		
										Caminhão Muncck																		
										Caminhão Toco																		
										Escavadeira																		
										Pá carregadeira																		
										Caçamba																		
										Patrol																		
PC 200																												
Placa Vibratória																												
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:																							
Data: 20/11/2023					Data: 20/11/2023																							


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



 Data: 20/11/2023



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				21/11/2023	X						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		CONTRATO Nº 254/2022				LICITAÇÃO Nº 0001/2022				RDO: 142			
Condições Climáticas		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.											
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL							
						CATEGORIA			QTDE				
		MÃO DE OBRA INDIRETA											
		Gerente de Obra											
		Engenheiro 1											
		Tec. de Segurança											
		Aux Adm 1											
		Mestre de obra 1											
		Encarregado geral											
		Hh DO DIA											
		MÃO DE OBRA DIRETA											
		Topografo											
		Auxiliar de topografia											
		Pedreiro 19											
		Ajudante Geral 20											
		Calceteiro											
		Carpinteiro 3											
		Operador de Motosserra											
		Motorista											
		Montador											
		Montador/Eletricista											
		Eletricista											
		Operador de Patrol											
		Operador de Escavadeira											
		Operador de Pá carregadeira											
		Motorista de caçamba											
		Pintor 3											
		Armador 3											
		Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO											
		EFETIVO DO DIA											
		JORNADA DE TRABALHO											
		Hh DO DIA											
		Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS											
		TIPO				QTDE.							
		Veículo Leve											
		Caminhão Muncck											
		Caminhão Toco											
		Escavadeira											
		Pá carregadeira											
		Caçamba											
		Patrol											
		PC 200											
		Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 21/11/2023				Data: 21/11/2023									


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				22/11/2023						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 143						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA				CATEGORIA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 19 Ajudante Geral 20 Calceiteiro Carpinteiro 3 Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pé carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador 3 Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pé carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 22/11/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 22/11/2023						

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

[Handwritten signature]



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																		
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 144				23/11/2023 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>							S	T	Q	Q	S	S	D				X	
S	T	Q	Q	S	S	D																		
			X																					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		EFETIVO PESSOAL		CATEGORIA		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA														
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral		Hh DO DIA		MÃO DE OBRA DIRETA		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 19 Ajudante Geral 20 Calçeteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador 3		Hh DO DIA												
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,																								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																		
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO		QTDE.																
				Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória																				
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																						
Data: 23/11/2023		Data: 23/11/2023																						


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

