



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 094-2023

EMPENHO: 165 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 190 Data do Sub-Empenho: 08/02/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPF
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:	CPF:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673	RG:
	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 08/02/2024
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenhari: Nº Lic.: 003-2023CONC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 176-2023	6.142.048,76	1.016.151,76	5.125.897,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº176-2023, CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº003-2023, REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº04, PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. NFS-e.Nº468.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.016.151,76	1.016.151,76	0,00

Data do Empenho: 08/02/2024 Data do Liquidação: 08/02/2024

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	67.066,02
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	12.193,82
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	30.484,55

## Novecentos e seis mil e quatrocentos e sete reais e trinta e sete centavos ##	Valor Retido	109.744,39
	Valor Líquido	906.407,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	06/02/2024	468	U			1.016.151,76

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	1.016.151,76

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 08/02/2024. ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 08/02/2024, podendo efetuar o pagamento. WALDSON LOPES DE GÓES FILHO Contador(a) CPF: 024.127.355-22
---	---

3436414



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 094-2023

EMPENHO: 165 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 190 Data do Sub-Empenho: 08/02/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 08/02/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Concorrência para obras e serviços de engenharia	Nº Lic.:	003-2023CONC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	-	Contrato:	176-2023	6.142.048,76	1.016.151,76	5.125.897,00
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº176-2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003-2023.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.016.151,76	1.016.151,76	0,00

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	1.016.151,76	1.016.151,76

Um milhão e dezesseis mil e cento e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos

1.016.151,76

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 08/02/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 08/02/2024

WALDSON LOPES DE GÓES FILHO
Contador(a)
CPF: 024.127.355-22



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000468
Data e Hora de Emissão:
06/02/2024 16:36:02
Código de Verificação:
JZMC-LL8B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
24.597.344/0001-98
Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço:
Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador -
CEP: 41820-021 - BA
dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:
561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19
Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48890-000/BA
E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR
OBRA Nº: 090/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023
Nº DO CONTRATO: 176-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 094-2023
BM 04 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/01/2024 a 31/01/2024
Valor total: R\$ R\$ R\$ 1.016.151,76
Valor Material 40%: R\$ 406.460,70. Base de cálculo do INSS 60%: 609.691,06 x 11% R\$: 67.066,02
Valor do ISS 5%: R\$ 30.484,55
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1.016.151,76

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
406.460,70	609.691,06	5,00%	30.484,55	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
67.066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.484,55	918.601,19

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 02/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM **07/02/24**

Assinatura

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 365961		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA			INSCRIÇÃO: 30349	
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES						NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.P.F.:		R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.:		24.597.344/0001-98
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE						
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F					
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 12.193,82	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 12.193,82	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 12.193,82	
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 08/02/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 08/02/2024 02:32:03	DATA DE VENCIMENTO: 29/02/2024		
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	12.193,82		
Valor do Tributo: 12.193,82	Vir. Devido sem Desconto (VD): 12.193,82	Taxa de Expediente: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
Valor de Base Cálculo: 12.193,82	Vir. Devido com Desconto: 12.193,82		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
INSTRUÇÕES:			(+) MULTA DE MORA - R\$			
1) Pagável nas agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) JUROS DE MORA - R\$			
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(=) VALOR A PAGAR - R\$	12.193,82		
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.						
4) NF-e Nº 468 - Data de emissão: 06/02/2024						



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81770000121 . 4

93823906202 . 0

40229010100 . 3

00036596107 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81770000121 . 4

93823906202 . 0

40229010100 . 3

00036596107 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 365961	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 08/02/2024 02:32:03	DATA VENCIMENTO: 29/02/2024
INSCRIÇÃO: 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	12.193,82
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	12.193,82





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 365960	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA		INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES				NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98		R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 609.691,06	Alíquota (%) 5,000	Valor R\$ 30.484,55	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 30.484,55
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 11/03/2024	MÊS REFERÊNCIA: Fevereiro	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 08/02/2024 02:30:39	DATA DE VENCIMENTO: 11/03/2024
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 468 - DATA DE EMISSÃO: 06/02/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	30.484,55
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	30.484,55



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva




81770000304 . 6 84553906202 . 4 40311010500 . 0 00036596012 . 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81770000304 . 6 84553906202 . 4 40311010500 . 0 00036596012 . 9

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Fevereiro	Nº DAM: 365960	EXERCÍCIO 2024	DATA 08/02/2024 02:30:39	DATA VENCIMENTO: 11/03/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	30.484,55
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	30.484,55





Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023
Nº DO CONTRATO: 176/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 094-2023
OBRA Nº: 090/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2024 a 31/01/2024

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
EMPRESA: MP2 Construções EIRELI EPP
CNPJ: 24.597.344/0001-98
VALOR DA 4ª MEDIÇÃO 1.016.151,76

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO
MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Bancos
SINAPI - 11/2022 - Bahia
ORSE - 11/2022 - Sergipe

B.D.I
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 135,15%
Mensalista: 71,22%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	MEDIÇÃO 04		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
										QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 292.944,20	3,64%						
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 400,76	R\$ 495,10	R\$ 2.970,60	0,04%	0,00	R\$ 0,00	6,00	2.970,60	R\$ 0,00	100%
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	500,00	R\$ 115,78	R\$ 143,03	R\$ 71.515,00	0,89%	0,00	R\$ 0,00	500,00	71.515,00	R\$ 0,00	100%
1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	122,90	R\$ 53,52	R\$ 66,12	R\$ 8.126,15	0,10%	0,00	R\$ 0,00	122,90	8.126,14	R\$ 0,00	100%
1.5	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	5000,00	R\$ 7,40	R\$ 9,14	R\$ 45.700,00	0,57%	600,00	R\$ 5.484,00	4925,04	45.014,82	R\$ 685,18	99%
1.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,72	R\$ 9,02	R\$ 11,14	R\$ 74,86	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,71	74,76	R\$ 0,10	100%
1.7	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9,00	R\$ 33,39	R\$ 41,25	R\$ 371,25	0,00%	0,00	R\$ 0,00	9,00	371,25	R\$ 0,00	100%
1.8	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3596,13	R\$ 3,36	R\$ 4,15	R\$ 14.923,94	0,19%	0,00	R\$ 0,00	3596,13	14.923,93	R\$ 0,00	100%
1.9	8742	ORSE	Restauração - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01_03/2022	m	32,00	R\$ 53,02	R\$ 65,50	R\$ 2.096,00	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.096,00	0%
1.10	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	3155,59	R\$ 10,88	R\$ 13,44	R\$ 42.411,13	0,53%	0,00	R\$ 0,00	3155,59	42.411,12	R\$ 0,00	100%
1.11	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	3596,13	R\$ 23,58	R\$ 29,13	R\$ 104.755,27	1,30%	0,00	R\$ 0,00	3596,13	104.755,27	R\$ 0,00	100%
2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					R\$ 391.666,23	4,12%						
2.1	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	519,93	R\$ 114,29	R\$ 141,19	R\$ 73.408,92	0,91%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 73.408,92	0%
2.2	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2282,08	R\$ 80,15	R\$ 99,02	R\$ 225.971,56	2,80%	250,00	R\$ 24.755,00	2050,00	202.991,00	R\$ 22.980,56	90%
2.4	1988	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	57,07	R\$ 106,70	R\$ 131,82	R\$ 7.522,97	0,09%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.522,97	0%
2.4	13318	ORSE	Divisória em granito São Gabriel polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens	m²	29,94	R\$ 669,48	R\$ 827,06	R\$ 24.762,78	0,31%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 24.762,78	0%
3			ESQUADRIAS					R\$ 614.180,00	7,62%						
3.1	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (WC PCD)	UN	1,00	R\$ 1.067,97	R\$ 1.319,37	R\$ 1.319,37	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.319,37	0%
3.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (BOX WC FEMININO E MASCULINO)	m²	10,20	R\$ 751,64	R\$ 928,58	R\$ 9.471,52	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.471,52	0%
3.3	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (WC TÊRRO E ADM 1ª ANDAR)	UN	7,00	R\$ 397,74	R\$ 491,37	R\$ 3.439,59	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.439,59	0%
3.5	12989	ORSE	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela revestida 1"	m²	36,00	R\$ 709,36	R\$ 876,34	R\$ 31.548,24	0,39%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 31.548,24	0%
3.6	1857	ORSE	Porta em aço, em chapa galvanizada n°24, ralada, de enrolar	m²	991,66	R\$ 211,30	R\$ 261,04	R\$ 258.862,93	3,21%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 258.862,93	0%
3.7	1989	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm (ADM)	m	4,60	R\$ 137,60	R\$ 169,99	R\$ 781,95	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 781,95	0%

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Av. Tancredo Neves, 2530, Edif. Cos. Salvador, Torre Lendas, Sala 913
CEP: 41.826-011 - Salvador/BA
CNPJ: 20.155.999/0001-55

MP2 Construções EIRELI EPP
CNPJ: 24.597.344/0001-98
R. ...

3.8	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	991,66	R\$ 50,90	R\$ 62,88	R\$ 62.355,58	0,77%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 62.355,58	0%
3.9	12183	ORSE	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma	m²	419,72	R\$ 475,20	R\$ 587,06	R\$ 246.400,82	3,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 246.400,82	0%
4			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					R\$ 41.239,60	0,51%						
4.1	11890	ORSE	Exaustor ACI-200, da sticell ou similar - fornecimento e instalação	un	18,00	R\$ 1.718,98	R\$ 2.123,63	R\$ 38.225,34	0,47%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 38.225,34	0%
4.2	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	R\$ 113,07	R\$ 139,69	R\$ 1.396,90	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.396,90	0%
4.3	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 163,65	R\$ 202,17	R\$ 1.617,36	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.617,36	0%
5			VIDROS					R\$ 1.408,39	0,02%						
5.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,28	R\$ 215,91	R\$ 266,74	R\$ 1.408,39	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.408,39	0%
6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 141.332,47	1,75%						
6.1	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 17,48	R\$ 21,59	R\$ 86,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 86,36	0%
6.2	103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 9,64	R\$ 11,91	R\$ 47,64	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 47,64	0%
6.3	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 12,37	R\$ 15,28	R\$ 15,28	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 15,28	0%
6.4	94789	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 240,74	R\$ 297,41	R\$ 297,41	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 297,41	0%
6.5	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 5,56	R\$ 6,87	R\$ 6,87	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6,87	0%
6.6	103947	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R\$ 6,16	R\$ 7,61	R\$ 68,49	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 68,49	0%
6.7	103977	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R\$ 6,94	R\$ 8,57	R\$ 77,13	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 77,13	0%
6.8	103958	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 9,89	R\$ 12,22	R\$ 61,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 61,10	0%
6.9	103962	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 6,42	R\$ 7,98	R\$ 55,51	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 55,51	0%
6.10	103964	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	R\$ 8,15	R\$ 10,07	R\$ 140,98	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 140,98	0%
6.11	103969	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 19,86	R\$ 24,54	R\$ 24,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 24,54	0%
6.12	103972	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 29,25	R\$ 36,14	R\$ 36,14	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 36,14	0%
6.13	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 13,05	R\$ 16,12	R\$ 257,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 257,92	0%
6.14	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	175,00	R\$ 7,78	R\$ 9,61	R\$ 1.681,75	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.681,75	0%
6.15	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	92,00	R\$ 8,46	R\$ 10,45	R\$ 961,40	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 961,40	0%
6.16	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 12,86	R\$ 15,89	R\$ 127,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 127,12	0%
6.17	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 11,93	R\$ 14,74	R\$ 117,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 117,92	0%



6.18	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 17,48	R\$ 21,59	R\$ 21,59	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 21,59	0%
6.19	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 19,23	R\$ 23,76	R\$ 166,32	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 166,32	0%
6.20	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 105,84	R\$ 130,75	R\$ 523,00	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 523,00	0%
6.21	96841	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	74,00	R\$ 20,52	R\$ 25,35	R\$ 1.875,90	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.875,90	0%
6.22	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 19,23	R\$ 23,76	R\$ 95,04	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 95,04	0%
6.23	103950	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 10,74	R\$ 13,27	R\$ 53,08	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 53,08	0%
6.24	103951	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R\$ 14,92	R\$ 18,43	R\$ 313,31	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 313,31	0%
6.25	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 21,59	R\$ 26,67	R\$ 106,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 106,68	0%
6.26	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	R\$ 16,45	R\$ 20,32	R\$ 426,72	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 426,72	0%
6.27	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 5,85	R\$ 7,23	R\$ 7,23	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7,23	0%
6.28	89417	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 5,40	R\$ 6,67	R\$ 6,67	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6,67	0%
6.29	89611	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 32,19	R\$ 39,77	R\$ 79,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 79,54	0%
6.30	89614	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 60,36	R\$ 74,57	R\$ 74,57	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 74,57	0%
6.31	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00	R\$ 10,80	R\$ 13,34	R\$ 306,82	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 306,82	0%
6.32	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00	R\$ 12,75	R\$ 15,75	R\$ 362,25	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 362,25	0%
6.33	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 17,98	R\$ 22,21	R\$ 111,05	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 111,05	0%
6.34	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 25,07	R\$ 30,97	R\$ 619,40	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 619,40	0%
6.35	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 44,72	R\$ 55,25	R\$ 221,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 221,00	0%
6.36	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 29,28	R\$ 36,17	R\$ 72,34	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 72,34	0%
6.37	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R\$ 14,68	R\$ 18,14	R\$ 163,26	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 163,26	0%
6.38	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 17,91	R\$ 22,13	R\$ 110,65	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 110,65	0%
6.39	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 18,73	R\$ 23,14	R\$ 46,28	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 46,28	0%
6.40	104007	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	R\$ 21,86	R\$ 27,01	R\$ 594,22	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 594,22	0%
6.41	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 20,11	R\$ 24,84	R\$ 24,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 24,84	0%

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Av. Tancredo Neves, 2539, Edif. Cae Salvador, Torre Lanteros, Sala 913
CEP: 41.820-021 - Salvador/BA
CNPJ: 20.155.999/0001-05

[Handwritten signature]



6.42	89626	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 30,25	R\$ 37,37	R\$ 74,74	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 74,74	0%
6.43	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 61,76	R\$ 76,30	R\$ 152,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 152,60	0%
6.44	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 20,62	R\$ 25,47	R\$ 76,41	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 76,41	0%
6.45	89394	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 18,82	R\$ 23,25	R\$ 186,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 186,00	0%
6.46	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	426,00	R\$ 20,20	R\$ 24,96	R\$ 10.632,96	0,13%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 10.632,96	0%
6.47	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	282,00	R\$ 23,28	R\$ 28,76	R\$ 8.110,32	0,10%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 8.110,32	0%
6.48	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,00	R\$ 32,26	R\$ 39,85	R\$ 2.151,90	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.151,90	0%
6.49	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	66,00	R\$ 17,23	R\$ 21,29	R\$ 1.405,14	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.405,14	0%
6.50	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	238,00	R\$ 19,05	R\$ 23,53	R\$ 5.600,14	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.600,14	0%
6.51	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,00	R\$ 49,79	R\$ 61,51	R\$ 3.690,60	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.690,60	0%
6.52	89375	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 12,14	R\$ 15,00	R\$ 15,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 15,00	0%
6.54	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 680,82	R\$ 841,09	R\$ 4.205,45	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.205,45	0%
6.55	103018	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	R\$ 287,65	R\$ 355,36	R\$ 4.619,68	0,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.619,68	0%
6.58	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	106,00	R\$ 21,76	R\$ 26,88	R\$ 2.849,28	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.849,28	0%
6.59	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	34,00	R\$ 40,50	R\$ 50,03	R\$ 1.701,02	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.701,02	0%
6.60	104035	SINAPI	COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 52,26	R\$ 64,56	R\$ 64,56	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 64,56	0%
6.61	103018	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 287,65	R\$ 355,36	R\$ 1.421,44	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.421,44	0%
6.62	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	R\$ 54,41	R\$ 67,22	R\$ 1.277,18	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.277,18	0%
6.63	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	64,00	R\$ 58,54	R\$ 72,32	R\$ 4.628,48	0,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.628,48	0%
6.66	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 152,81	R\$ 188,78	R\$ 755,12	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 755,12	0%
6.67	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 282,07	R\$ 348,47	R\$ 348,47	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 348,47	0%
6.68	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 91,59	R\$ 113,15	R\$ 452,60	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 452,60	0%
6.69	103043	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 29,15	R\$ 36,01	R\$ 36,01	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 36,01	0%
6.70	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 111,58	R\$ 137,85	R\$ 551,40	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 551,40	0%
6.71	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 152,81	R\$ 188,78	R\$ 755,12	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 755,12	0%
6.72	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	63,00	R\$ 80,55	R\$ 99,51	R\$ 6.269,13	0,08%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.269,13	0%

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

[Handwritten signature]

6.73	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	59,00	R\$ 91,59	R\$ 113,15	R\$ 6.675,85	0,08%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.675,85	0%
6.74	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 38,13	R\$ 47,11	R\$ 188,44	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 188,44	0%
6.75	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 324,97	R\$ 401,47	R\$ 802,94	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 802,94	0%
6.77	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 324,97	R\$ 401,47	R\$ 401,47	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 401,47	0%
6.79	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 599,23	R\$ 740,29	R\$ 5.922,32	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.922,32	0%
6.80	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R\$ 471,68	R\$ 582,71	R\$ 6.409,81	0,08%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.409,81	0%
6.80	2097	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03	un	48,00	R\$ 790,22	R\$ 976,24	R\$ 46.859,52	0,58%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 46.859,52	0%
6.81	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 725,28	R\$ 896,01	R\$ 896,01	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 896,01	0%
6.82	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	11,00	R\$ 51,51	R\$ 63,64	R\$ 700,04	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 700,04	0%
7			ESGOTO					R\$ 94.584,71	1,17%						
7.1	104009	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	R\$ 13,03	R\$ 16,10	R\$ 354,20	0,00%	15,00	R\$ 241,50	15,00	241,50	R\$ 112,70	68%
7.2	98105	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4x0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	16,00	R\$ 633,39	R\$ 782,49	R\$ 12.519,84	0,16%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 12.519,84	0%
7.3	101806	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	17,00	R\$ 549,86	R\$ 679,30	R\$ 11.548,10	0,14%	14,00	R\$ 9.510,20	14,00	9.510,20	R\$ 2.037,90	82%
7.4	101804	SINAPI	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	11,00	R\$ 1.307,23	R\$ 1.614,95	R\$ 17.764,45	0,22%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 17.764,45	0%
7.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	49,00	R\$ 43,54	R\$ 53,79	R\$ 2.635,71	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.635,71	0%
7.6	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	R\$ 68,77	R\$ 84,96	R\$ 1.274,40	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.274,40	0%
7.7	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 73,78	R\$ 91,15	R\$ 91,15	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 91,15	0%
7.8	1545	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	R\$ 57,75	R\$ 71,34	R\$ 71,34	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 71,34	0%
7.9	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022	un	15,00	R\$ 14,52	R\$ 17,94	R\$ 269,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 269,10	0%
7.10	1620	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	R\$ 28,28	R\$ 34,94	R\$ 34,94	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 34,94	0%
7.11	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	79,00	R\$ 12,89	R\$ 15,92	R\$ 1.257,88	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.257,88	0%
7.12	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 32,48	R\$ 40,13	R\$ 120,39	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 120,39	0%
7.13	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 10,22	R\$ 12,63	R\$ 151,56	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 151,56	0%
7.14	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	R\$ 15,65	R\$ 19,33	R\$ 270,62	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 270,62	0%



7.15	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 21,69	R\$ 26,80	R\$ 214,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 214,40	0%
7.16	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,00	R\$ 9,99	R\$ 12,34	R\$ 271,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 271,48	0%
7.17	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	54,00	R\$ 14,93	R\$ 18,44	R\$ 995,76	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 995,76	0%
7.18	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 22,63	R\$ 27,96	R\$ 55,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 55,92	0%
7.19	1672	ORSE	Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	57,00	R\$ 15,79	R\$ 19,51	R\$ 1.112,07	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.112,07	0%
7.20	89850	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	R\$ 31,65	R\$ 39,10	R\$ 742,90	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 742,90	0%
7.21	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 14,93	R\$ 18,44	R\$ 73,76	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 73,76	0%
7.22	1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	15,00	R\$ 49,25	R\$ 60,84	R\$ 912,60	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 912,60	0%
7.23	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 78,99	R\$ 97,58	R\$ 292,74	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 292,74	0%
7.24	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R\$ 26,54	R\$ 32,79	R\$ 229,53	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 229,53	0%
7.25	1634	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	15,00	R\$ 29,45	R\$ 36,38	R\$ 545,70	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 545,70	0%
7.26	89754	SINAPI	LJVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	26,00	R\$ 20,87	R\$ 25,78	R\$ 670,28	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 670,28	0%
7.27	97994	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	1,00	R\$ 2.608,45	R\$ 3.222,48	R\$ 3.222,48	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.222,48	0%
7.28	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 762,78	R\$ 942,34	R\$ 942,34	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 942,34	0%
7.29	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 19,11	R\$ 23,61	R\$ 377,76	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 377,76	0%
7.30	1583	ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00	R\$ 22,94	R\$ 28,34	R\$ 56,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 56,68	0%
7.31	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 31,62	R\$ 39,06	R\$ 39,06	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 39,06	0%
7.32	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	R\$ 40,74	R\$ 50,33	R\$ 1.409,24	0,02%	10,00	R\$ 503,30	10,00	503,30	R\$ 905,94	36%
7.33	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	R\$ 24,21	R\$ 29,91	R\$ 837,48	0,01%	10,00	R\$ 299,10	10,00	299,10	R\$ 538,38	36%
7.34	1659	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	4,00	R\$ 30,90	R\$ 38,17	R\$ 152,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 152,68	0%
7.35	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	294,00	R\$ 27,32	R\$ 33,75	R\$ 9.922,50	0,12%	100,00	R\$ 3.375,00	100,00	3.375,00	R\$ 6.547,50	34%
7.36	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	78,00	R\$ 56,10	R\$ 69,31	R\$ 5.406,18	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.406,18	0%
7.37	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	72,00	R\$ 21,09	R\$ 26,05	R\$ 1.875,60	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.875,60	0%

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Av. Tancredo Neves, 2539, Edif. Cso Salvador, Torre Lanchas, Sala 913
CEP: 41.820-071 - Salvador/BA
CNPJ: 20.155.999/0001-55

Patricia C Mendes
CPF: 90480925-91
Sócia Administradora

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CRLV/BA 0516025570



7.38	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	396,00	R\$ 26,78	R\$ 33,08	R\$ 13.099,68	0,16%	100,00	R\$ 3.308,00	100,00	3.308,00	R\$ 9.791,68	25%
7.39	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	67,00	R\$ 33,37	R\$ 41,23	R\$ 2.762,41	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.762,41	0%
								R\$ 172.200,94	2,14%						
8.1	5970	ORSE	Caixa de Drenagem Tipo I - Dimensões 0,80x0,80x1,00m	un	17,00	R\$ 1.298,01	R\$ 1.603,56	R\$ 27.260,52	0,34%	15,00	R\$ 24.053,40	15,00	24.053,40	R\$ 3.207,12	88%
8.2	11524	ORSE	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.20 x 1.20 x 1.80 m	un	2,00	R\$ 6.836,50	R\$ 8.445,81	R\$ 16.891,62	0,21%	2,00	R\$ 16.891,62	2,00	16.891,62	R\$ 0,00	100%
8.3	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 18,54	R\$ 22,90	R\$ 229,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 229,00	0%
8.4	104064	SINAPI	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCIE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 180,33	R\$ 222,78	R\$ 1.336,68	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.336,68	0%
8.5	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 129,13	R\$ 159,53	R\$ 1.914,36	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.914,36	0%
8.6	83535	SINAPI	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	UN	4,00	R\$ 609,30	R\$ 752,73	R\$ 3.010,92	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.010,92	0%
8.7	1209	ORSE	Joelho 45º pvc rígido soldável para esgoto primário diâmetro 150mm Rev.01 10/2022	un	8,00	R\$ 86,64	R\$ 107,04	R\$ 856,32	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 856,32	0%
8.8	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	180,00	R\$ 73,51	R\$ 90,81	R\$ 16.345,80	0,20%	100,00	R\$ 9.081,00	100,00	9.081,00	R\$ 7.264,80	56%
8.9	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	144,00	R\$ 147,34	R\$ 182,02	R\$ 26.210,88	0,33%	100,00	R\$ 18.202,00	100,00	18.202,00	R\$ 8.008,88	69%
8.10	90697	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	48,00	R\$ 227,63	R\$ 281,21	R\$ 13.498,08	0,17%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 13.498,08	0%
8.11	6339	ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 300mm (Vinifort - Tigre ou similar)	m	24,00	R\$ 321,33	R\$ 396,97	R\$ 9.527,28	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.527,28	0%
8.12	7113	ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 400mm (Vinifort - Tigre ou similar)	m	66,00	R\$ 528,89	R\$ 653,39	R\$ 43.123,74	0,54%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 43.123,74	0%
8.13	90699	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	18,00	R\$ 487,35	R\$ 602,07	R\$ 10.837,26	0,13%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 10.837,26	0%
8.14	9276	ORSE	Abraçadeira em ferro galvanizado DN 150mm	un	18,00	R\$ 52,10	R\$ 64,36	R\$ 1.158,48	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.158,48	0%
9 SISTEMA DE INCÊNDIO								R\$ 126.915,69	1,58%						
9.1	12018	ORSE	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	un	169,00	R\$ 229,64	R\$ 283,70	R\$ 47.945,30	0,60%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 47.945,30	0%
9.2	12017	ORSE	Detector de temperatura termoviolométrico endereçável, modelo VRE-T, marca VERIN ou similar	un	30,00	R\$ 229,64	R\$ 283,70	R\$ 8.511,00	0,11%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 8.511,00	0%
9.3	7883	ORSE	Campainha (alarme) tipo gongo 4" Voc, p/incendio, ref.Cevel Gamma ou similar	un	10,00	R\$ 230,76	R\$ 285,08	R\$ 2.850,80	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.850,80	0%
9.4	11820	ORSE	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marca Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes	un	1,00	R\$ 5.672,59	R\$ 7.007,92	R\$ 7.007,92	0,09%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.007,92	0%
9.5	8693	ORSE	Bateria industrial para acionamento de sirene (p/penitenciária)	un	1,00	R\$ 309,00	R\$ 381,74	R\$ 381,74	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 381,74	0%
9.6	11829	ORSE	Accionador manual (botelra) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável	un	10,00	R\$ 152,57	R\$ 188,48	R\$ 1.884,80	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.884,80	0%
9.7	650	ORSE	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	27,00	R\$ 70,35	R\$ 86,91	R\$ 2.346,57	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.346,57	0%
9.8	4178	ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	un	4,00	R\$ 1,58	R\$ 1,95	R\$ 7,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7,80	0%
9.9	9975	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2"	un	619,00	R\$ 5,84	R\$ 7,21	R\$ 4.462,99	0,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.462,99	0%
9.10	10327	ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	un	98,00	R\$ 5,45	R\$ 6,73	R\$ 659,54	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 659,54	0%
9.11	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 9,92	R\$ 12,26	R\$ 12,26	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 12,26	0%
9.12	91882	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	123,00	R\$ 7,92	R\$ 9,78	R\$ 1.202,94	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.202,94	0%
9.13	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	R\$ 9,06	R\$ 11,19	R\$ 246,18	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 246,18	0%
9.14	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	R\$ 15,39	R\$ 19,01	R\$ 342,18	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 342,18	0%



9.15	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	785,00	R\$ 9,18	R\$ 11,34	R\$ 8.879,22	0,11%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 8.879,22	0%
9.16	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	R\$ 10,87	R\$ 13,43	R\$ 1.611,60	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.611,60	0%
9.17	95780	SINAPI	CONDUTE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM [1]	UN	5,00	R\$ 31,74	R\$ 39,21	R\$ 196,05	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 196,05	0%
9.18	95778	SINAPI	CONDUTE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	40,00	R\$ 29,44	R\$ 36,37	R\$ 1.454,80	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.454,80	0%
9.19	73661/001	SINAPI	CONDUTE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,00	R\$ 21,71	R\$ 26,82	R\$ 5.364,00	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.364,00	0%
9.21	649	ORSE	Fio rígido isolado em PVC. 1.5mm ² - 450/750v / 70°C	m	4400,00	R\$ 5,80	R\$ 7,17	R\$ 31.548,00	0,39%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 31.548,00	0%
			MIDRANTE					R\$ 32.899,36	0,41%						
10.1	94473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14,00	R\$ 107,25	R\$ 131,50	R\$ 1.855,00	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.855,00	0%
10.2	8612	ORSE	Conjunto moto-bomba centrifuga, trifásica, motor 4 CV, Schneider mod BC-21R ou similar	UN	1,00	R\$ 6.773,85	R\$ 8.368,41	R\$ 8.368,41	0,10%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 8.368,41	0%
10.3	72803	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 75MMx2,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 228,30	R\$ 282,04	R\$ 282,04	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 282,04	0%
10.4	83633	SINAPI	HIDRANTE SUBTERRÂNEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN-75MM	UN	1,00	R\$ 3.186,43	R\$ 3.936,52	R\$ 3.936,52	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.936,52	0%
10.5	92378	SINAPI	LULA EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 99,82	R\$ 115,91	R\$ 115,91	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 115,91	0%
10.6	92377	SINAPI	PIPEL EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 84,61	R\$ 104,53	R\$ 104,53	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 104,53	0%
10.7	1517	ORSE	Forneimento e instalação de redução fixa tipo Storz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incendio)	un	4,00	R\$ 208,96	R\$ 258,15	R\$ 1.032,60	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.032,60	0%
10.8	7643	ORSE	Registro globo angular 65º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente	un	4,00	R\$ 243,12	R\$ 297,88	R\$ 1.191,52	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.191,52	0%
10.9	12981	ORSE	Abrigo para incêndio com mangueira e esguicho, de embudo/feirma, com 90 x 60 x 17 cm, em chapas de aço, porta com ventilador, visor com inscrição "incendio", suporte/cassa interna para a mangueira, pintura eletrostática vermelha - fornec e instal	un	1,00	R\$ 1.881,03	R\$ 2.323,82	R\$ 2.323,82	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.323,82	0%
10.10	1517	ORSE	Forneimento e instalação de redução fixa tipo Storz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incendio)	un	4,00	R\$ 206,96	R\$ 258,15	R\$ 1.032,60	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.032,60	0%
10.11	12706	ORSE	Esguicho jato regulável de 1 1/2", para combate a incendio - Rev. 01	un	4,00	R\$ 186,65	R\$ 235,06	R\$ 952,24	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 952,24	0%
10.12	1517	ORSE	Forneimento e instalação de redução fixa tipo Storz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incendio)	un	4,00	R\$ 206,96	R\$ 258,15	R\$ 1.032,60	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.032,60	0%
10.13	1424	ORSE	Forneimento e instalação de tampão de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas 60mm (2 1/2")	un	4,00	R\$ 12,36	R\$ 15,27	R\$ 61,08	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 61,08	0%
10.14	1515	ORSE	Forneimento e instalação de mangueira de algodão para incêndio 1 1/2" com 15m	un	8,00	R\$ 579,42	R\$ 715,82	R\$ 5.726,56	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.726,56	0%
10.15	7787	ORSE	Forneimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	4,00	R\$ 64,18	R\$ 79,29	R\$ 317,16	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 317,16	0%
10.16	1510	ORSE	Forneimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" (tampão e corrente (incendio))	un	4,00	R\$ 309,58	R\$ 382,46	R\$ 1.529,84	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.529,84	0%
10.17	11894	ORSE	Hidrante de recalque incluído caixa em alvenaria de tijolos macios esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,60 x 0,35m, com lâmpada em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	un	1,00	R\$ 898,11	R\$ 1.109,53	R\$ 1.109,53	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.109,53	0%
10.18	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO B1 EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 404,48	R\$ 499,69	R\$ 499,69	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 499,69	0%
10.19	10896	ORSE	Registro globo angular 90º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente	un	1,00	R\$ 135,14	R\$ 166,95	R\$ 166,95	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 166,95	0%
10.20	97435	SINAPI	CURVAS GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 204,52	R\$ 252,66	R\$ 252,66	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 252,66	0%

Assinatura

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Av. Tancredo Neves, 2539, Edif. Casa Salvador, Torres Lindas, Sala 913
CEP: 41.820-071 - Salvador/BA
CNPJ: 20.155.998/0001-03


Pedro C. Mendes
CPF: 94.040.025-01
Soc. Administradora

Caixa Postal 100
Belo Horizonte - CELEBRAR 01602570

10.21	12685	ORSE	Esguicho Jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 2 1/2", para combate a incendio - Rev. 01	un	1,00	R\$ 370,99	R\$ 458,32	R\$ 458,32	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 458,32	0%
10.22	99524	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 461,21	R\$ 569,78	R\$ 569,78	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 569,78	0%
11			ROTA DE FUGA, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					R\$ 13.374,85	0,17%						
11.1	12886	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1	un	10,00	R\$ 20,72	R\$ 25,60	R\$ 256,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 256,00	0%
11.2	12015	ORSE	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incendio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	un	10,00	R\$ 133,28	R\$ 164,65	R\$ 1.646,50	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.646,50	0%
11.3	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	10,00	R\$ 22,00	R\$ 27,18	R\$ 271,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 271,80	0%
11.4	12885	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	un	4,00	R\$ 20,72	R\$ 25,60	R\$ 102,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 102,40	0%
11.5	12885	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	un	2,00	R\$ 20,72	R\$ 25,60	R\$ 51,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 51,20	0%
11.6	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	10,00	R\$ 23,14	R\$ 28,59	R\$ 285,90	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 285,90	0%
11.7	12894	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Hidrante de incendio"- Placa E9	un	2,00	R\$ 16,07	R\$ 19,85	R\$ 39,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 39,70	0%
11.8	12889	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	2,00	R\$ 17,41	R\$ 21,51	R\$ 43,02	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 43,02	0%
11.9	11866	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	10,00	R\$ 210,85	R\$ 260,48	R\$ 2.604,80	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.604,80	0%
11.10	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	6,00	R\$ 254,52	R\$ 314,43	R\$ 1.886,58	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.886,58	0%
11.11	1503	ORSE	Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado	un	5,00	R\$ 241,20	R\$ 297,98	R\$ 1.489,90	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.489,90	0%
11.12	1504	ORSE	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	5,00	R\$ 760,41	R\$ 939,41	R\$ 4.697,05	0,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.697,05	0%
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 1.233.257,78	15,31%						
12.1	12538	ORSE	Arruela de pressão 1/4"	un	3054,00	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 1.710,24	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.710,24	0%
12.2	12559	ORSE	Parafuso com bucha 5-10	un	639,00	R\$ 2,11	R\$ 2,61	R\$ 1.667,79	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.667,79	0%
12.3	12559	ORSE	Parafuso com bucha 5-10	un	639,00	R\$ 2,11	R\$ 2,61	R\$ 1.667,79	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.667,79	0%
12.4	9831	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	888,00	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 426,24	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 426,24	0%
12.5	12545	ORSE	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	379,80	R\$ 17,16	R\$ 21,20	R\$ 8.051,76	0,10%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 8.051,76	0%
12.6	101568	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	40,00	R\$ 112,82	R\$ 139,38	R\$ 5.575,20	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.575,20	0%
12.7	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1170,00	R\$ 21,59	R\$ 26,67	R\$ 31.203,90	0,39%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 31.203,90	0%
12.8	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6500,00	R\$ 3,31	R\$ 4,09	R\$ 26.585,00	0,33%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 26.585,00	0%
12.9	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46300,00	R\$ 9,08	R\$ 11,22	R\$ 519.486,00	6,45%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 519.486,00	0%
12.10	10620	ORSE	Parafuso com bucha 5-8	un	12,00	R\$ 4,54	R\$ 5,61	R\$ 67,32	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 67,32	0%
12.11	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7100,00	R\$ 4,42	R\$ 5,46	R\$ 38.766,00	0,48%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 38.766,00	0%
12.12	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00	R\$ 6,46	R\$ 7,98	R\$ 5.586,00	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.586,00	0%
12.13	10092	ORSE	Parafuso com bucha 5-6 (fornecimento)	un	360,00	R\$ 0,14	R\$ 0,17	R\$ 61,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 61,20	0%
12.14	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	10,00	R\$ 367,50	R\$ 454,01	R\$ 4.540,10	0,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.540,10	0%
12.15	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	889,00	R\$ 14,75	R\$ 18,22	R\$ 16.197,58	0,20%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 16.197,58	0%
12.16	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 10,92	R\$ 13,49	R\$ 134,90	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 134,90	0%
12.17	4185	ORSE	Caixa de alumínio 40 x 40 x 12 cm, fornecimento	un	2,00	R\$ 475,30	R\$ 587,19	R\$ 1.174,38	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.174,38	0%
12.18	8633	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	12,00	R\$ 17,84	R\$ 22,04	R\$ 264,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 264,48	0%



12.19	8635	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	342,00	R\$ 17,84	R\$ 22,04	R\$ 7.537,68	0,09%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.537,68	0%
12.20	9518	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	3,00	R\$ 19,28	R\$ 23,82	R\$ 71,46	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 71,46	0%
12.21	10315	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	306,00	R\$ 21,01	R\$ 25,96	R\$ 7.943,76	0,10%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.943,76	0%
12.22	452	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	28,00	R\$ 116,62	R\$ 144,07	R\$ 4.033,96	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.033,96	0%
12.23	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	280,00	R\$ 64,27	R\$ 79,40	R\$ 22.232,00	0,28%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 22.232,00	0%
12.24	11558	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 350 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	R\$ 2.035,60	R\$ 2.514,78	R\$ 2.514,78	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.514,78	0%
12.25	7996	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.SSM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	153,00	R\$ 165,04	R\$ 203,89	R\$ 31.195,17	0,39%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 31.195,17	0%
12.26	12968	ORSE	Suporte vertical 200 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	74,00	R\$ 19,97	R\$ 24,67	R\$ 1.825,58	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.825,58	0%
12.27	12574	ORSE	Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	19,00	R\$ 29,36	R\$ 36,27	R\$ 689,13	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 689,13	0%
12.28	7879	ORSE	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	113,00	R\$ 14,37	R\$ 17,75	R\$ 2.005,75	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.005,75	0%
12.29	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	96,00	R\$ 13,38	R\$ 16,53	R\$ 1.586,88	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.586,88	0%
12.30	12573	ORSE	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	17,00	R\$ 22,69	R\$ 28,03	R\$ 476,51	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 476,51	0%
12.30	9519	ORSE	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	82,00	R\$ 5,95	R\$ 7,35	R\$ 602,70	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 602,70	0%
12.32	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	140,00	R\$ 5,20	R\$ 6,42	R\$ 898,80	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 898,80	0%
12.33	762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	210,00	R\$ 38,14	R\$ 47,12	R\$ 9.895,20	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.895,20	0%
12.34	4533	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	33,00	R\$ 141,30	R\$ 174,56	R\$ 5.760,48	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.760,48	0%
12.35	3399	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	39,00	R\$ 83,30	R\$ 102,91	R\$ 4.013,49	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.013,49	0%
12.36	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	186,00	R\$ 62,39	R\$ 77,08	R\$ 14.336,88	0,18%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 14.336,88	0%
12.38	12600	ORSE	Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	210,00	R\$ 48,53	R\$ 59,95	R\$ 12.589,50	0,16%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 12.589,50	0%
12.39	12580	ORSE	Tampa de encaixe 200mm para Tê horizontal, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	33,00	R\$ 25,33	R\$ 31,29	R\$ 1.032,57	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.032,57	0%
12.39	12804	ORSE	Tampa de encaixe 300 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	39,00	R\$ 116,34	R\$ 143,73	R\$ 5.605,47	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.605,47	0%
12.41	12966	ORSE	Tampa de encaixe 400 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	156,00	R\$ 175,74	R\$ 217,11	R\$ 33.869,16	0,42%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 33.869,16	0%
12.42	12579	ORSE	Tampa de encaixe 75 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	186,00	R\$ 39,11	R\$ 48,32	R\$ 8.987,52	0,11%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 8.987,52	0%
12.43	371	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	325,00	R\$ 2,23	R\$ 2,75	R\$ 893,75	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 893,75	0%
12.44	372	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	272,00	R\$ 3,43	R\$ 4,24	R\$ 1.153,28	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.153,28	0%
12.46	373	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	5,00	R\$ 5,03	R\$ 6,21	R\$ 31,05	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 31,05	0%
12.47	8100	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 400 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	156,00	R\$ 150,86	R\$ 186,37	R\$ 29.073,72	0,36%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 29.073,72	0%
12.48	375	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	13,00	R\$ 8,45	R\$ 10,44	R\$ 135,72	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 135,72	0%
12.49	376	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	un	10,00	R\$ 17,91	R\$ 22,13	R\$ 221,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 221,30	0%
12.50	4234	ORSE	Luva para eletroduto pvc roscável, d=4" - fornecimento	un	141,00	R\$ 23,52	R\$ 29,06	R\$ 4.097,46	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.097,46	0%
12.51	13178	ORSE	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	3,00	R\$ 68,52	R\$ 84,65	R\$ 253,95	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 253,95	0%
12.52	12971	ORSE	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k de G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	245,00	R\$ 67,21	R\$ 83,03	R\$ 20.342,35	0,25%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 20.342,35	0%
12.53	11994	ORSE	Luminária em LED para iluminação pública,30W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio Inj.FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lmn/w.gar 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01	un	24,00	R\$ 606,53	R\$ 749,31	R\$ 17.983,44	0,22%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 17.983,44	0%
12.54	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1350,00	R\$ 15,73	R\$ 19,43	R\$ 26.230,50	0,33%	600,00	R\$ 11.658,00	600,00	11.658,00	R\$ 14.572,50	44%





12.55	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00	R\$ 19,48	R\$ 24,07	R\$ 577,68	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 577,68	0%
12.56	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	57,00	R\$ 24,69	R\$ 30,50	R\$ 1.738,50	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.738,50	0%
12.57	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	39,00	R\$ 34,31	R\$ 42,39	R\$ 1.653,21	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.653,21	0%
12.58	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3729,00	R\$ 11,99	R\$ 14,81	R\$ 55.226,49	0,69%	1500,00	R\$ 22.215,00	1500,00	22.215,00	R\$ 33.011,49	40%
12.59	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	141,00	R\$ 63,19	R\$ 78,06	R\$ 11.006,46	0,14%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 11.006,46	0%
12.60	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	7,00	R\$ 807,58	R\$ 750,60	R\$ 5.254,20	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.254,20	0%
12.61	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	14,00	R\$ 2.682,89	R\$ 3.313,95	R\$ 46.395,30	0,58%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 46.395,30	0%
12.62	97360	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	R\$ 6.326,46	R\$ 7.815,71	R\$ 101.604,23	1,26%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 101.604,23	0%
12.63	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 594,78	R\$ 734,79	R\$ 734,79	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 734,79	0%
12.64	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	152,00	R\$ 138,21	R\$ 170,74	R\$ 25.952,48	0,32%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 25.952,48	0%
12.65	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 983,86	R\$ 1.215,46	R\$ 1.215,46	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.215,46	0%
12.66	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 1.395,69	R\$ 1.724,24	R\$ 1.724,24	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.724,24	0%
12.67	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	170,00	R\$ 23,48	R\$ 29,01	R\$ 4.931,70	0,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.931,70	0%
12.68	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	2,00	R\$ 40,06	R\$ 49,49	R\$ 98,98	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 98,98	0%
12.69	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	681,00	R\$ 37,87	R\$ 46,78	R\$ 31.857,18	0,40%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 31.857,18	0%
13			SUBESTAÇÃO					R\$ 181.399,44	2,25%						
13.1	101553	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00	R\$ 22,00	R\$ 27,18	R\$ 81,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 81,54	0%
13.2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 44,48	R\$ 54,95	R\$ 54,95	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 54,95	0%
13.3	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	R\$ 44,95	R\$ 55,53	R\$ 5.553,00	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.553,00	0%
13.4	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	R\$ 64,57	R\$ 79,77	R\$ 1.595,40	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.595,40	0%
13.5	2858	ORSE	Fornecimento de chave fusivel 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka	un	3,00	R\$ 386,10	R\$ 476,99	R\$ 1.430,97	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.430,97	0%
13.6	72272	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	R\$ 18,64	R\$ 23,03	R\$ 138,18	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 138,18	0%
13.7	68069	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	5,00	R\$ 112,39	R\$ 138,85	R\$ 694,25	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 694,25	0%
13.8	3338	ORSE	Fornecimento de conector estribo para condutor 4 e 2 (222)	un	3,00	R\$ 34,90	R\$ 43,12	R\$ 129,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 129,36	0%
13.9	4141	ORSE	Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento	un	8,00	R\$ 261,36	R\$ 322,88	R\$ 2.583,04	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.583,04	0%
13.10	93026	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	R\$ 73,62	R\$ 90,95	R\$ 363,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 363,80	0%
13.11	93026	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	R\$ 73,62	R\$ 90,95	R\$ 363,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 363,80	0%
13.12	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	R\$ 11,29	R\$ 13,95	R\$ 83,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 83,70	0%

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Av. Tancredo Neves, 2539, Edif. Coo Salvador, Torre Londres, Sala 913
CEP: 41.820-021 - Salvador/BA
CNPJ: 20.155.999/0001-55

Patrícia C Mendes
CPF: 90.800.925-59
Sócio Administrador

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 051602570



13.13	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	51,00	R\$ 63,19	R\$ 78,06	R\$ 3.981,06	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.981,06	0%
13.14	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	R\$ 11,99	R\$ 14,81	R\$ 44,43	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 44,43	0%
13.15	4135	ORSE	Gancho suspensão com olhal, fornecimento	un	3,00	R\$ 21,55	R\$ 26,62	R\$ 79,86	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 79,86	0%
13.16	3766	ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	5,00	R\$ 133,66	R\$ 165,12	R\$ 825,60	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 825,60	0%
13.17	3066	ORSE	Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv	un	6,00	R\$ 107,91	R\$ 133,31	R\$ 799,86	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 799,86	0%
13.18	93017	SINAPI	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	R\$ 45,01	R\$ 55,61	R\$ 222,44	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 222,44	0%
13.19	9824	ORSE	Massa 3M para calafetagem (fornecimento)	kg	1,00	R\$ 26,11	R\$ 32,26	R\$ 32,26	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 32,26	0%
13.20	2884	ORSE	Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm	un	4,00	R\$ 14,85	R\$ 18,35	R\$ 73,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 73,40	0%
13.21	2918	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 450mm	un	7,00	R\$ 25,74	R\$ 31,80	R\$ 222,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 222,60	0%
13.22	12876	ORSE	Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka	un	3,00	R\$ 182,53	R\$ 225,50	R\$ 676,50	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 676,50	0%
13.23	101546	SINAPI	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	6,00	R\$ 46,50	R\$ 57,45	R\$ 344,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 344,70	0%
13.24	100612	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 1.054,37	R\$ 1.302,57	R\$ 1.302,57	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.302,57	0%
13.25	100602	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 967,90	R\$ 1.195,74	R\$ 1.195,74	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.195,74	0%
13.26	2955	ORSE	Fornecimento de suporte p/ transformador em poste dt	un	2,00	R\$ 251,33	R\$ 310,49	R\$ 620,98	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 620,98	0%
13.27	102107	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 35.022,43	R\$ 43.266,71	R\$ 43.266,71	0,54%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 43.266,71	0%
13.28	93000	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	150,00	R\$ 230,23	R\$ 284,43	R\$ 42.664,50	0,53%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 42.664,50	0%
13.29	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	R\$ 117,34	R\$ 144,96	R\$ 7.248,00	0,09%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.248,00	0%
13.30	11558	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 350 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	R\$ 2.035,60	R\$ 2.514,78	R\$ 2.514,78	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.514,78	0%
13.31	9400	ORSE	QDGBT - Quadro de distribuição geral de baixa tensão dim.: 2300x800x1000mm, conteúdo: disjuntor 3P 250DA, TC 2500/5A, oltmetro 96x96 60DV, amperímetro 96x96 2500/5A, chave comutadora e demais acessórios	un	1,00	R\$ 50.357,34	R\$ 62.211,46	R\$ 62.211,46	0,77%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 62.211,46	0%
14			SPDA					R\$ 284.254,70	3,53%						
14.1	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	432,00	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 241,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 241,92	0%
14.2	11039	ORSE	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	un	432,00	R\$ 0,78	R\$ 0,96	R\$ 414,72	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 414,72	0%
14.3	11036	ORSE	Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação	un	432,00	R\$ 0,59	R\$ 0,73	R\$ 315,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 315,36	0%
14.4	9831	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	432,00	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 207,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 207,36	0%
14.5	12740	ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	m	2400,00	R\$ 17,18	R\$ 21,22	R\$ 50.928,00	0,63%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 50.928,00	0%
14.6	8082	ORSE	Cabo de cobre n° 50 mm² - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	1250,00	R\$ 137,51	R\$ 169,88	R\$ 212.350,00	2,64%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 212.350,00	0%
14.7	4718	ORSE	Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	4,00	R\$ 559,50	R\$ 691,21	R\$ 2.764,84	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.764,84	0%
14.8	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	73,00	R\$ 101,80	R\$ 125,76	R\$ 9.180,48	0,11%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.180,48	0%
14.9	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	R\$ 119,24	R\$ 147,31	R\$ 294,62	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 294,62	0%
14.10	72315	SINAPI	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	129,00	R\$ 35,44	R\$ 43,78	R\$ 5.647,62	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.647,62	0%
14.11	12993	ORSE	Para-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1,1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo	un	1,00	R\$ 1.511,95	R\$ 1.867,86	R\$ 1.867,86	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.867,86	0%
14.12	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	R\$ 33,93	R\$ 41,92	R\$ 41,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 41,92	0%
15			CABEAMENTO ESTRUTURADO					R\$ 312.324,57	3,88%						
15.1	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	1623,00	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 908,88	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 908,88	0%
15.2	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	9900,00	R\$ 12,27	R\$ 15,16	R\$ 150.084,00	1,86%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 150.084,00	0%



15.3	12890	ORSE	Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar.	un	135,00	R\$ 244,99	R\$ 302,66	R\$ 40.859,10	0,51%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 40.859,10	0%
15.4	8997	ORSE	Condulete em pvc rígido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,I,B,L,L,LR), Tigre ou similar	un	151,00	R\$ 25,04	R\$ 30,93	R\$ 4.670,43	0,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.670,43	0%
15.5	11214	ORSE	Tomada para lógica r45, com caixa pvc, embutida, cat. 6	un	151,00	R\$ 62,92	R\$ 77,73	R\$ 11.737,23	0,15%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 11.737,23	0%
15.6	762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm [ref. mopa ou similar]	m	156,00	R\$ 38,14	R\$ 47,12	R\$ 7.350,72	0,09%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.350,72	0%
15.7	3400	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	9,00	R\$ 56,68	R\$ 70,02	R\$ 630,18	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 630,18	0%
15.8	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	246,00	R\$ 62,39	R\$ 77,08	R\$ 18.961,68	0,24%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 18.961,68	0%
15.09	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1344,00	R\$ 15,73	R\$ 19,43	R\$ 26.113,92	0,32%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 26.113,92	0%
15.10	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	51,00	R\$ 63,19	R\$ 78,06	R\$ 3.981,06	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.981,06	0%
15.11	91885	SINAPI	LLVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	150,00	R\$ 10,62	R\$ 13,12	R\$ 1.968,00	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.968,00	0%
15.12	93017	SINAPI	LLVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	24,00	R\$ 45,01	R\$ 55,61	R\$ 1.334,64	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.334,64	0%
15.13	369	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	4,00	R\$ 89,00	R\$ 109,95	R\$ 439,80	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 439,80	0%
15.14	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	R\$ 19,15	R\$ 23,66	R\$ 378,56	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 378,56	0%
15.15	9831	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	400,00	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 192,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 192,00	0%
15.16	12559	ORSE	Parafuso com bucha 5-10	un	411,00	R\$ 2,11	R\$ 2,61	R\$ 1.072,71	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.072,71	0%
15.17	9832	ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	1223,00	R\$ 1,91	R\$ 2,36	R\$ 2.886,28	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.886,28	0%
15.18	7879	ORSE	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	78,00	R\$ 14,37	R\$ 17,75	R\$ 1.384,50	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.384,50	0%
15.19	12573	ORSE	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	123,00	R\$ 22,69	R\$ 28,03	R\$ 3.447,69	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.447,69	0%
15.20	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	123,00	R\$ 13,38	R\$ 16,53	R\$ 2.033,19	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.033,19	0%
15.21	9519	ORSE	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	4,00	R\$ 5,95	R\$ 7,35	R\$ 29,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 29,40	0%
15.22	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	96,00	R\$ 5,20	R\$ 6,42	R\$ 616,32	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 616,32	0%
15.23	12600	ORSE	Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	156,00	R\$ 48,53	R\$ 59,95	R\$ 9.352,20	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.352,20	0%
15.24	12586	ORSE	Tampa de encaixe para Cruzeta 200mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	9,00	R\$ 15,67	R\$ 19,36	R\$ 174,24	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 174,24	0%
15.25	12579	ORSE	Tampa de encaixe 75 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	246,00	R\$ 39,11	R\$ 48,32	R\$ 11.886,72	0,15%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 11.886,72	0%
15.26	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	276,00	R\$ 28,83	R\$ 35,62	R\$ 9.831,12	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.831,12	0%
16			CFTV					R\$ 62.528,40	0,78%						
16.1	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	952,00	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 197,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 197,12	0%
16.2	9831	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	176,00	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 84,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 84,48	0%
16.3	12559	ORSE	Parafuso com bucha 5-10	un	250,00	R\$ 2,11	R\$ 2,61	R\$ 652,50	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 652,50	0%
16.4	9832	ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	176,00	R\$ 1,91	R\$ 2,36	R\$ 415,36	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 415,36	0%
16.5	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	76,00	R\$ 28,83	R\$ 35,62	R\$ 2.707,12	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.707,12	0%
16.6	8997	ORSE	Condulete em pvc rígido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,I,B,L,L,LR), Tigre ou similar	un	29,00	R\$ 25,04	R\$ 30,93	R\$ 896,97	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 896,97	0%
16.7	10909	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	29,00	R\$ 7,06	R\$ 8,72	R\$ 252,88	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 252,88	0%
16.8	7879	ORSE	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	38,00	R\$ 14,37	R\$ 17,75	R\$ 674,50	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 674,50	0%
16.9	8687	ORSE	Tã horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	R\$ 83,28	R\$ 102,88	R\$ 102,88	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 102,88	0%

16.10	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	44,00	R\$ 5,20	R\$ 6,42	R\$ 262,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 282,48	0%
16.11	12530	ORSE	Tampa de encaixe 100mm para Tê horizontal, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	R\$ 15,09	R\$ 18,57	R\$ 18,57	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 18,57	0%
16.12	762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	57,00	R\$ 38,14	R\$ 47,12	R\$ 2.685,84	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.685,84	0%
16.13	12526	ORSE	Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	57,00	R\$ 18,65	R\$ 23,04	R\$ 1.313,28	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.313,28	0%
16.14	12500	ORSE	Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	un	38,00	R\$ 8,42	R\$ 10,40	R\$ 395,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 395,20	0%
16.15	12140	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	15,00	R\$ 5,85	R\$ 7,23	R\$ 108,45	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 108,45	0%
16.16	7750	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"	un	15,00	R\$ 7,65	R\$ 9,45	R\$ 141,75	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 141,75	0%
16.17	95806	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM [1	UN	291,00	R\$ 23,33	R\$ 28,82	R\$ 8.386,62	0,10%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 8.386,62	0%
16.18	95785	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM [1 1/4"], APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	21,00	R\$ 40,53	R\$ 50,07	R\$ 1.051,47	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.051,47	0%
16.19	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	1400,00	R\$ 12,27	R\$ 15,16	R\$ 21.224,00	0,26%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 21.224,00	0%
16.20	11520	ORSE	Câmera Vm S5040 V1 1/3, 760 linhas 2.8 a 12mm, da Intelbras ou similar	un	29,00	R\$ 578,01	R\$ 714,07	R\$ 20.708,03	0,26%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 20.708,03	0%
16.21	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. v1 33 valemam ou similar)	un	21,00	R\$ 8,82	R\$ 10,90	R\$ 228,90	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 228,90	0%
17			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					R\$ 291.989,72	3,62%						
17.1			INFRAESTRUTURA					R\$ 82.698,96	1,03%						
42736	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	16,81	R\$ 50,70	R\$ 62,63	R\$ 1.052,81	0,01%	0,00	R\$ 0,00	12,81	802,29	R\$ 250,52	76%
42737	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	88,50	R\$ 20,36	R\$ 25,15	R\$ 2.225,78	0,03%	0,00	R\$ 0,00	68,50	1.722,77	R\$ 503,01	77%
42738	95957	SINAPI	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	7,00	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 29.933,75	0,37%	0,00	R\$ 0,00	5,25	22.450,31	R\$ 7.483,44	75%
42739	11322	ORSE	Bloco cerâmico tipo "u" (caixa) 9x19x19cm	m	983,30	R\$ 18,67	R\$ 23,06	R\$ 22.674,90	0,28%	0,00	R\$ 0,00	725,15	16.721,95	R\$ 5.952,95	74%
42740	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	462,15	R\$ 46,51	R\$ 57,46	R\$ 26.555,14	0,33%	0,00	R\$ 0,00	351,07	20.172,48	R\$ 6.382,66	76%
42741	95957	SINAPI	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,06	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 256,58	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 256,58	0%
17.2			SUPERESTRUTURA					R\$ 209.290,76	2,60%						
42767	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2867,00	R\$ 14,83	R\$ 18,32	R\$ 52.523,44	0,65%	750,00	R\$ 13.740,00	2183,50	40.001,72	R\$ 12.521,72	76%
42768	95957	SINAPI	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	12,77	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 54.607,71	0,68%	2,00	R\$ 8.552,50	10,50	44.900,62	R\$ 9.707,09	82%
42769	95957	SINAPI	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	23,89	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 102.159,61	1,27%	10,00	R\$ 42.762,50	21,95	93.842,30	R\$ 8.317,31	92%
18			REVESTIMENTO					R\$ 846.951,72	8,03%						
18.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	8854,96	R\$ 4,65	R\$ 5,74	R\$ 50.827,47	0,63%	1000,00	R\$ 5.740,00	5500,00	31.570,00	R\$ 19.257,47	62%
18.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	8854,96	R\$ 26,43	R\$ 32,65	R\$ 289.114,44	3,59%	6000,00	R\$ 195.900,00	6590,00	215.163,50	R\$ 73.950,94	74%
18.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	3596,13	R\$ 47,92	R\$ 59,20	R\$ 212.890,90	2,64%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 212.890,90	0%
18.4	2259	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	545,00	R\$ 18,91	R\$ 23,36	R\$ 12.731,20	0,16%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 12.731,20	0%
18.5	2262	ORSE	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm	m	13,17	R\$ 126,13	R\$ 143,47	R\$ 1.889,50	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.889,50	0%
18.12	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	255,00	R\$ 81,35	R\$ 100,50	R\$ 25.627,50	0,32%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 25.627,50	0%
18.13	12443	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metrô white, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m²	244,70	R\$ 178,20	R\$ 220,15	R\$ 53.870,71	0,67%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 53.870,71	0%
19			PINTURA					R\$ 376.301,05	4,67%						
19.1	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	2257,40	R\$ 3,62	R\$ 4,47	R\$ 10.090,58	0,13%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 10.090,58	0%
19.2	88484	SINAPI	DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	8854,96	R\$ 3,42	R\$ 4,23	R\$ 37.456,48	0,46%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 37.456,48	0%

19.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	884,96	R\$ 16,23	R\$ 20,05	R\$ 177.541,95	2,20%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 177.541,95	0%
19.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8358,19	R\$ 14,61	R\$ 18,05	R\$ 150.865,33	1,87%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 150.865,33	0%
19.6	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m²	13,65	R\$ 20,56	R\$ 25,40	R\$ 346,71	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 346,71	0%
20								R\$ 1.408.638,82	17,48%						
20.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	1328,98	R\$ 46,00	R\$ 56,83	R\$ 75.525,93	0,94%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 75.525,93	0%
20.2	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	43,53	R\$ 106,43	R\$ 131,48	R\$ 5.723,32	0,07%	43,53	R\$ 5.723,32	43,53	5.723,32	R\$ 0,00	100%
20.4	12729	ORSE	Telhamento com telha em aço galvanizado, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 20mm, FSup.=não pintada, Fin.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar	m²	3266,25	R\$ 202,59	R\$ 250,28	R\$ 817.477,05	10,15%	1877,50	R\$ 469.900,70	3266,25	817.477,05	R\$ 0,00	100%
20.5	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	3266,25	R\$ 58,96	R\$ 72,84	R\$ 237.913,65	2,95%	0,00	R\$ 0,00	3266,25	237.913,65	R\$ 0,00	100%
20.7	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	217,48	R\$ 58,96	R\$ 72,84	R\$ 15.841,24	0,20%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 15.841,24	0%
20.8	12736	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01 - (FECHAMENTO LATERAL)	m²	217,48	R\$ 117,37	R\$ 145,00	R\$ 31.534,60	0,39%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 31.534,60	0%
20.9	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem (platibanda)	m²	197,37	R\$ 500,20	R\$ 617,95	R\$ 121.964,79	1,51%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 121.964,79	0%
20.10	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	3266,25	R\$ 25,44	R\$ 31,43	R\$ 102.658,24	1,27%	0,00	R\$ 0,00	3266,25	102.658,23	R\$ 0,01	100%
21								R\$ 188.156,57	2,34%						
21.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	44,24	R\$ 97,90	R\$ 120,95	R\$ 5.350,83	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.350,83	0%
21.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	206,22	R\$ 24,15	R\$ 29,83	R\$ 6.151,54	0,08%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.151,54	0%
21.3	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	100,00	R\$ 53,76	R\$ 66,42	R\$ 6.642,00	0,08%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.642,00	0%
21.4	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	152,96	R\$ 80,15	R\$ 99,02	R\$ 15.146,10	0,19%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 15.146,10	0%
21.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	305,92	R\$ 4,65	R\$ 5,74	R\$ 1.755,98	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.755,98	0%
21.6	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	305,92	R\$ 26,43	R\$ 32,65	R\$ 9.988,29	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.988,29	0%
21.7	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	305,92	R\$ 2,95	R\$ 3,64	R\$ 1.113,55	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.113,55	0%
21.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	305,92	R\$ 14,61	R\$ 18,05	R\$ 5.521,86	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.521,86	0%
21.9	41595	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	235,00	R\$ 13,75	R\$ 16,99	R\$ 3.992,65	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.992,65	0%
21.10	100621	SINAPI	POSTE DE AÇO CDNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	R\$ 4.232,07	R\$ 5.228,30	R\$ 20.913,20	0,26%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 20.913,20	0%
21.11	10536	ORSE	Ulteira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00	R\$ 329,23	R\$ 406,73	R\$ 1.220,19	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.220,19	0%
21.12	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,50	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 2.138,13	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.138,13	0%
21.13	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	952,16	R\$ 71,75	R\$ 88,64	R\$ 84.399,46	1,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 84.399,46	0%
21.14	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	190,43	R\$ 101,26	R\$ 125,10	R\$ 23.822,79	0,30%	100,00	R\$ 12.510,00	100,00	12.510,00	R\$ 11.312,79	53%



QUIOSQUE													R\$	225.386,89	2,80%				
INFRAESTRUTURA													R\$	7.850,51	0,10%				
44562	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,69	R\$ 50,70	R\$ 62,63	R\$ 105,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,69	105,83	R\$ 0,01	100%				
44563	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	8,91	R\$ 20,36	R\$ 25,15	R\$ 224,09	0,00%	0,00	R\$ 0,00	8,91	224,08	R\$ 0,01	100%				
44564	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,60	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 2.565,75	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,60	2.565,75	R\$ 0,00	100%				
44565	11322	ORSE	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	m	99,00	R\$ 18,67	R\$ 23,06	R\$ 2.282,94	0,03%	0,00	R\$ 0,00	99,00	2.282,94	R\$ 0,00	100%				
44566	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	46,50	R\$ 46,51	R\$ 57,46	R\$ 2.671,89	0,03%	0,00	R\$ 0,00	46,50	2.671,89	R\$ 0,00	100%				
SUPERESTRUTURA													R\$	30.948,57	0,38%				
44593	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	431,20	R\$ 14,83	R\$ 18,32	R\$ 7.899,58	0,10%	0,00	R\$ 0,00	431,20	7.899,58	R\$ 0,00	100%				
44594	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,43	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 10.391,29	0,13%	1,00	R\$ 4.276,25	2,43	10.391,28	R\$ 0,01	100%				
44595	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,96	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 12.657,70	0,16%	1,00	R\$ 4.276,25	2,96	12.657,70	R\$ 0,00	100%				
ALVENARIA													R\$	46.991,34	0,58%				
44621	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	267,30	R\$ 80,15	R\$ 99,02	R\$ 26.468,05	0,33%	55,00	R\$ 5.446,10	245,00	24.259,90	R\$ 2.208,15	92%				
44622	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	534,60	R\$ 4,85	R\$ 5,74	R\$ 3.068,60	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.068,60	0%				
44623	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	534,60	R\$ 26,43	R\$ 32,65	R\$ 17.454,69	0,22%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 17.454,69	0%				
PINTURA													R\$	19.248,49	0,24%				
44652	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	442,75	R\$ 2,95	R\$ 3,64	R\$ 1.611,61	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.611,61	0%				
44653	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	442,75	R\$ 16,23	R\$ 20,05	R\$ 8.877,14	0,11%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 8.877,14	0%				
44654	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvnil ou similar)	m²	30,24	R\$ 20,56	R\$ 25,40	R\$ 768,10	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 768,10	0%				
44655	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	442,75	R\$ 14,61	R\$ 18,05	R\$ 7.991,64	0,10%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.991,64	0%				
REVESTIMENTO													R\$	48.988,57	0,61%				
44682	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	67,50	R\$ 112,62	R\$ 138,13	R\$ 9.391,28	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.391,28	0%				
44683	8948	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Atlas, linha onix, ref. OM 5233, cor glacial ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev D1	m²	158,40	R\$ 186,29	R\$ 230,14	R\$ 36.454,18	0,45%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 36.454,18	0%				
44684	40	Próprio	Revestimento de parede externo com tijolinho brick , coleção França ou similar cor branco ou similar, incluindo rejuntamento	M²	91,85	R\$ 27,70	R\$ 34,22	R\$ 3.149,11	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.149,11	0%				
ESQUADRIAS													R\$	20.075,05	0,25%				
44713	1857	ORSE	Porta em aço, em chapa galvanizada n24, ralada, de enrolar	m²	29,70	R\$ 211,30	R\$ 261,04	R\$ 7.752,89	0,10%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.752,89	0%				
44714	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	R\$ 397,74	R\$ 491,37	R\$ 4.422,33	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.422,33	0%				
44716	1988	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	27,00	R\$ 106,70	R\$ 131,82	R\$ 3.559,14	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.559,14	0%				
44717	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	6,30	R\$ 77,81	R\$ 96,13	R\$ 605,62	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 605,62	0%				
44718	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO JACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	59,40	R\$ 50,90	R\$ 62,88	R\$ 3.735,07	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.735,07	0%				
COBERTURA													R\$	27.650,15	0,34%				
44743	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	100,44	R\$ 47,55	R\$ 58,74	R\$ 5.899,85	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.899,85	0%				



44744	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	100,44	R\$ 103,76	R\$ 128,19	R\$ 12.875,40	0,16%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 12.875,40	0%	
44745	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	67,50	R\$ 106,43	R\$ 131,48	R\$ 8.874,90	0,11%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 8.874,90	0%	
22.8			ACESSÓRIOS					R\$ 23.634,21	0,29%							
44774	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	R\$ 163,65	R\$ 202,17	R\$ 1.819,53	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.819,53	0%	
44775	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 120,81	R\$ 149,25	R\$ 1.343,25	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.343,25	0%	
44777	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	9,00	R\$ 329,23	R\$ 406,73	R\$ 3.660,57	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.660,57	0%	
44777	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	19,40	R\$ 444,62	R\$ 549,28	R\$ 10.656,03	0,13%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 10.656,03	0%	
44778	9684	ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	9,00	R\$ 553,56	R\$ 683,87	R\$ 6.154,83	0,08%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.154,83	0%	
23			PRAÇA					R\$ 596.736,79	7,41%							
23.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	37,91	R\$ 97,90	R\$ 120,95	R\$ 4.585,21	0,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.585,21	0%	
23.2	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	150,00	R\$ 53,76	R\$ 66,42	R\$ 9.963,00	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.963,00	0%	
23.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	50,00	R\$ 152,05	R\$ 187,84	R\$ 9.392,00	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.392,00	0%	
23.4	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	189,56	R\$ 24,15	R\$ 29,83	R\$ 5.654,57	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.654,57	0%	
23.5	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	84,28	R\$ 47,74	R\$ 58,98	R\$ 4.970,83	0,06%	20,00	R\$ 1.179,60	74,00	4.364,52	R\$ 606,31	88%	
23.6	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	177,80	R\$ 35,80	R\$ 44,23	R\$ 7.864,09	0,10%	50,00	R\$ 2.211,50	138,00	6.103,74	R\$ 1.760,35	78%	
23.7	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	777,14	R\$ 77,45	R\$ 95,68	R\$ 74.356,76	0,92%	0,00	R\$ 0,00	432,00	41.333,76	R\$ 33.023,00	56%	
23.7	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	631,12	R\$ 101,26	R\$ 125,10	R\$ 78.953,11	0,98%	400,00	R\$ 50.040,00	600,00	75.060,00	R\$ 3.893,11	95%	
23.8	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	988,93	R\$ 71,75	R\$ 88,64	R\$ 87.658,76	1,09%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 87.658,76	0%	
23.9	100621	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLA FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	10,00	R\$ 4.232,07	R\$ 5.228,30	R\$ 52.283,00	0,65%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 52.283,00	0%	
23.9	12	Próprio	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA C/60, Q196 (3,11 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	m²	1389,52	R\$ 147,43	R\$ 182,14	R\$ 253.087,17	3,14%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 253.087,17	0%	
23.10	10288	ORSE	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref. NK1606, da Nilko ou similar	un	10,00	R\$ 546,23	R\$ 674,81	R\$ 6.748,10	0,08%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.748,10	0%	
23.11	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00	R\$ 329,23	R\$ 406,73	R\$ 1.220,19	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.220,19	0%	
24			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 351.188,60	4,36%							
24.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	R\$ 106,23	R\$ 131,24	R\$ 115.491,20	1,43%	88,00	R\$ 11.549,12	352,00	46.196,48	R\$ 69.294,72	40%	
24.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2220,00	R\$ 34,62	R\$ 42,77	R\$ 94.949,40	1,18%	440,00	R\$ 18.818,80	1760,00	75.275,20	R\$ 19.674,20	79%	
24.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4440,00	R\$ 25,66	R\$ 31,70	R\$ 140.748,00	1,75%	440,00	R\$ 13.948,00	1760,00	55.792,00	R\$ 84.956,00	40%	
25			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 35.526,59	0,44%							
25.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	7773,87	R\$ 3,70	R\$ 4,57	R\$ 35.526,59	0,44%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 35.526,59	0%	
								Total sem BDI	R\$ 6.522.088,42		MEDICÃO 04	1.016.151,76	RECEBIDO TOTAL	2.648.306,85	SALDO TOTAL	5.414.081,15

Total do BDI R\$ 1.535.299,61

Total Geral R\$ 8.057.388,03

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Av. Tancredo Neves, 2539, Edif. Coo Salvador, Torre Lomboas, Sala 913
CEP: 41.820-021 - Salvador/BA
CNPJ: 20.155.999/0001-55



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 2539 - CAMINHO DAS ARVORES,
SALVADOR/BA - CEP: 41820021 - EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING
TORRE LONDRES SALA 913

Número da Certidão: 809740

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 09:43:54 horas do dia 01/02/2024.

Válida até dia 01/05/2024.

Código de controle da certidão: **69FC.3BD0.685C.2754.A033.758A.4D2F.49C7**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20240508417

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/02/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:23:44 do dia 29/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2024.

Código de controle da certidão: **D21D.20A7.0FC6.8B02**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Certidão nº: 7401798/2024
Expedição: 01/02/2024, às 09:46:20
Validade: 30/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/02/2024 a 01/03/2024

Certificação Número: 2024020200040341247600

Informação obtida em 05/02/2024 15:37:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/01/2024 14:59:59.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo NA6vOaMbmno00007.SFP é:

ec0bf7a6-e48f-41bf-80bf-fa289b08793e

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 12/2023

NRA: NA6vOaMbmno00007

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 155

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 24.597.344/0001-98	Razão Social MP2 CONSTRUCOES LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24011.0119755-6	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000196820574			Valor Total do Documento 844,48

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	844,48			844,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	844,48			844,48

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 11/01/2024 08:56:39

85810000008 0 44480385240 9 19071624011 6 01197556161 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000008 0 44480385240 9 19071624011 6 01197556161 3



CNPJ: 24.597.344/0001-98
 Número: 07.16.24011.0119755-6
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 844,48

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	12/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	62600840 / Reinf CP 23773872710 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 19.207,83	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 54.760,17	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 13.439,85	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 844,48	R\$ 844,48
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 88.252,33	R\$ 844,48

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir; débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF	904.030.025-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/01/2024 15:05:34
Nº do recibo de entrega	0000050000196820574

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período apuração	12/2023	Número do Recibo	50000196820574
Data/Hora da Transmissão	10/01/2024 15:05:34	Identificação da Apuração de Débitos	62600840 / Reinf CP 23773872710 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	TANCREDO NEVES	Número	2539
Complemento	EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING	Bairro/Distrito	CAMINHO DAS ARVORES
Município	SALVADOR	UF	BA
CEP	41820021	Telefone	7197308153
Correio Eletrônico	SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PATRICIA DE CARVALHO MENDES	CPF	90403002591
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	GUSTAVO BORTOLETTO		
CPF	26925381883	CRC	-
UF	-	Telefone	1934710670
Correio Eletrônico	gustavo@visualassessoria.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	233,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 233,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	93,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 93,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	139,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 139,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	18,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 18,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	55,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 55,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	279,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 279,69		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.864,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.864,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	5.559,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.559,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.223,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.223,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	3.335,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.335,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	444,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 444,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.334,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.334,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	6.671,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.671,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	44.479,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 44.479,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.464,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.464,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	18.402,63		
Deduções	Salário Família: 1.423,71 Retenção Lei 9711/98: 16.978,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	805,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 805,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	844,48		
Saldo a Pagar	844,48		

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 TOMADOR

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,0
 TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE N° CONTROLE: MSqOg8Y0mx70000-8 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	311,32	0,00	0,00	0,00	311,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	772,63	0,00	0,00	0,00	772,63
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	115,89	0,00	0,00	0,00	115,89
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	1.199,84	0,00	0,00	0,00	1.199,84
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	224,06	0,00	0,00	0,00	224,06
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	224,06	0,00	0,00	0,00	224,06
TOTAL A RECOLHER	224,06	0,00	0,00	0,00	224,06

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 TOMADOR

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: SHOPPING SANTA LUZ N° CONTROLE: KJue16ORYbr0000-4 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 INSCRIÇÃO: 900162765275
 LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	736,17	0,00	0,00	0,00	736,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.864,62	0,00	0,00	0,00	1.864,62
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	279,69	0,00	0,00	0,00	279,69
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.701,02	0,00	0,00	0,00	2.701,02
OUTRAS ENTIDADES	540,74	0,00	0,00	0,00	540,74
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	540,74	0,00	0,00	0,00	540,74
TOTAL A RECOLHER	3.241,76	0,00	0,00	0,00	3.241,76

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/01/2024
HORA: 14:56:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 155

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE INSCRIÇÃO: 900045580171

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	69.797,14	1.199,84	68.597,30

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 839,89

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MP2 CONSTRUCOES LTDA			900045580171			2216	507
0,00	0,00	224,06	0,00	0,00	0,00	224,06	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : MP2 CONSTRUCOES LTDA - 24.597.344/0001-98 VALOR COMPENSADO: R\$ 1.199,84 - 05/2021 A 05/2021							
MP2 CONSTRUCOES LTDA			900162765275			2208	507
736,17	2.144,31	540,74	179,46	0,00	0,00	3.241,76	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : MP2 CONSTRUCOES LTDA - 24.597.344/0001-98							

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000129 499401802404 107684200825 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: NA6vOaMbmno0000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: AOzRM6rPlgM0000-0
COD REC: 155 COMP: 12/2023

TOMADOR/OBRA : TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO INSCRIÇÃO: 900045580171 N° CONTROLE: MSqOg8Y0mx70000-8
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
DOUTOR CELINO GOMES DA SILVA OURO NEGRO CANDEIAS 43805190 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.863,18	REM SEM 13° SALÁRIO	3.863,18
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.814,90
		DEPÓSITO	454,24
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.863,18	REM SEM 13° SALÁRIO	3.863,18
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.814,90
CONTR SEGURADOS DEVIDA	311,32	DEPÓSITO	454,24
VAL DEVIDO PREV SOC	224,06	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000129 499401802404 107684200825 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: NA6vOaMbmno0000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: AOzRM6rPlgM0000-0
COD REC: 155 COMP: 12/2023

TOMADOR/OBRA : SHOPPING SANTA LUZ INSCRIÇÃO: 900162765275 N° CONTROLE: KJue16ORYbr0000-4
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
SANTA LUZ CENTRO SANTALUZ 48880000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	8.989,86	REM SEM 13° SALÁRIO	8.525,34
REM BASE CALC 13° SAL	333,25	REM 13° SALÁRIO	1.420,89
		DEPÓSITO	795,70
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	8.989,86	REM SEM 13° SALÁRIO	8.525,34
REM BASE CALC 13° SAL	333,25	REM 13° SALÁRIO	1.420,89
CONTR SEGURADOS DEVIDA	736,17	DEPÓSITO	795,70
VAL DEVIDO PREV SOC	3.241,76	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	5

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000129 499401802404 107684200825 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUÇOES LTDA

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

Nº ARQUIVO: NA6vOaMbmno0000-7

Nº CONTROLE: AOzRM6rPlgM0000-0

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 12/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.853,04	REM SEM 13° SALÁRIO	12.388,52
REM BASE CALC 13° SAL	333,25	REM 13° SALÁRIO	3.235,79
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.047,49	DEPÓSITO	1.249,94
VAL DEVIDO PREV SOC	3.465,82	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	7
		TOTAL A RECOLHER	1.249,94

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000129 499401802404 107684200825 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900045580171

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ELISEU PEREIRA COSTA			124.80425.44-6	16/03/2022	01				07170
	1.633,60	700,11	0,00					186,70	0,00
GEOVANE DOS SANTOS PINTO			200.52036.03-5	08/12/2020	01				07155
	2.229,58	1.114,79	0,00					267,54	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.863,18 1.814,90 0,00 311,32 454,24 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000129 499401802404 107684200825 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE N° DE CONTROLE: MSqOg8Y0mx70000-8

N° ARQUIVO: NA6vOaMbmno0000-7
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900045580171

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.863,18	1.814,90	3.863,18	0,00
TOTAIS:	2	3.863,18	1.814,90	3.863,18	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE N° DE CONTROLE: MSqOg8Y0mx70000-8

N° ARQUIVO: NA6vOaMbmno0000-7
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 900045580171

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	224,06	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	311,32
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		05/2021 PERÍODO FINAL:	05/2021 VALOR SOLICITADO:	69.797,14
PERÍODO INICIAL:	05/2021	VALOR A COMPENSAR:	68.597,30	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO:	1.199,84			839,89

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
-------------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000129 499401802404 107684200825 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: SHOPPING SANTA LUZ
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900162/65275

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARLOS VINICIUS DE JESUS SAMPAIO	464,52	111,09	162.76497.35-6 333,25	13/09/2023 59,82	01		11/12/2023 I3 0,00	07170 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000129 499401802404 107684200825 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: SHOPPING SANTA LUZ
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 900162/65275

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DOMINGOS FEITOSA DOS SANTOS			125.33468.86-1	13/09/2023	01			07152
2.229,58	371,59		0,00	182,48			208,10	0,00
DONATO BRITO ARAUJO JUNIOR			160.15112.32-9	04/09/2023	01			07170
1.332,98	222,17		0,00	101,78			124,42	0,00
ELSON SILVA DE CARVALHO			200.10928.97-3	04/09/2023	01			07170
1.400,22	233,37		0,00	107,83			130,68	0,00
JOSENI ANUNCIACAO MONTEIRO			162.01080.59-8	04/09/2023	01			07170
1.332,98	222,17		0,00	101,78			124,41	0,00
LUCIANO SANTANA BARRETO			203.16822.38-2	13/09/2023	01			07152
2.229,58	371,59		0,00	182,48			208,09	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 8.989,86 1.531,98 333,25 736,17 795,70 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000129 499401802404 107684200825 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: SHOPPING SANTA LUZ N° DE CONTROLE: KJue16ORYbr0000-4
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021

N° ARQUIVO: NA6vOaMbmno0000-7
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900162/65275

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	8.525,34	1.420,89	8.989,86	333,25
TOTAIS:	6	8.525,34	1.420,89	8.989,86	333,25

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: SHOPPING SANTA LUZ N° DE CONTROLE: KJue16ORYbr0000-4

N° ARQUIVO: NA6vOaMbmno0000-7
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 900162/65275

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.241,76	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	736,17
SALÁRIO FAMÍLIA:	179,46	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100000129 499401802404 107684200825 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: AOzRM6rPlgM0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

N° ARQUIVO: NA6vOaMbmno0000-7
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	12.853,04	3.346,88	12.853,04	333,25
TOTAIS:	8	12.853,04	3.346,88	12.853,04	333,25

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000129 499401802404 107684200825 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES LTDA	N° DE CONTROLE: AOzRM6rPlgM0000-0	N° ARQUIVO: NA6vOaMbmno0000-7
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS:	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING	BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021		CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	12.388,52
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	3.235,79
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.249,94	0,00	0,00	0,00	1.249,94

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES LTDA N° DE CONTROLE: AOzRM6rPlgM0000-0 N° ARQUIVO: NA6vOaMbmno0000-7
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.465,82	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.047,49
SALÁRIO FAMÍLIA:	179,46	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 69.797,14
VALOR ABATIDO: 1.199,84 VALOR A COMPENSAR: 68.597,30 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 839,89

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/01/2024
HORA: 14:56:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 155

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE INSCRIÇÃO: 900045580171

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	69.797,14	1.199,84	68.597,30

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 839,89

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MP2 CONSTRUCOES LTDA			900045580171		0079	2216	507
0,00	0,00	224,06	0,00	0,00	0,00	224,06	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : MP2 CONSTRUCOES LTDA - 24.597.344/0001-98 VALOR COMPENSADO: R\$ 1.199,84 - 05/2021 A 05/2021							
MP2 CONSTRUCOES LTDA			900162765275		0079	2208	507
736,17	2.144,31	540,74	179,46	0,00	0,00	3.241,76	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : MP2 CONSTRUCOES LTDA - 24.597.344/0001-98							

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 02/01/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 14:56:35

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

15.624,31

DEPÓSITO

1.249,94

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.249,94

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ª MEDIÇÃO – SHOPPING POPULAR NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA, no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - Ba

FOTO 01 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020



FOTO 02 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

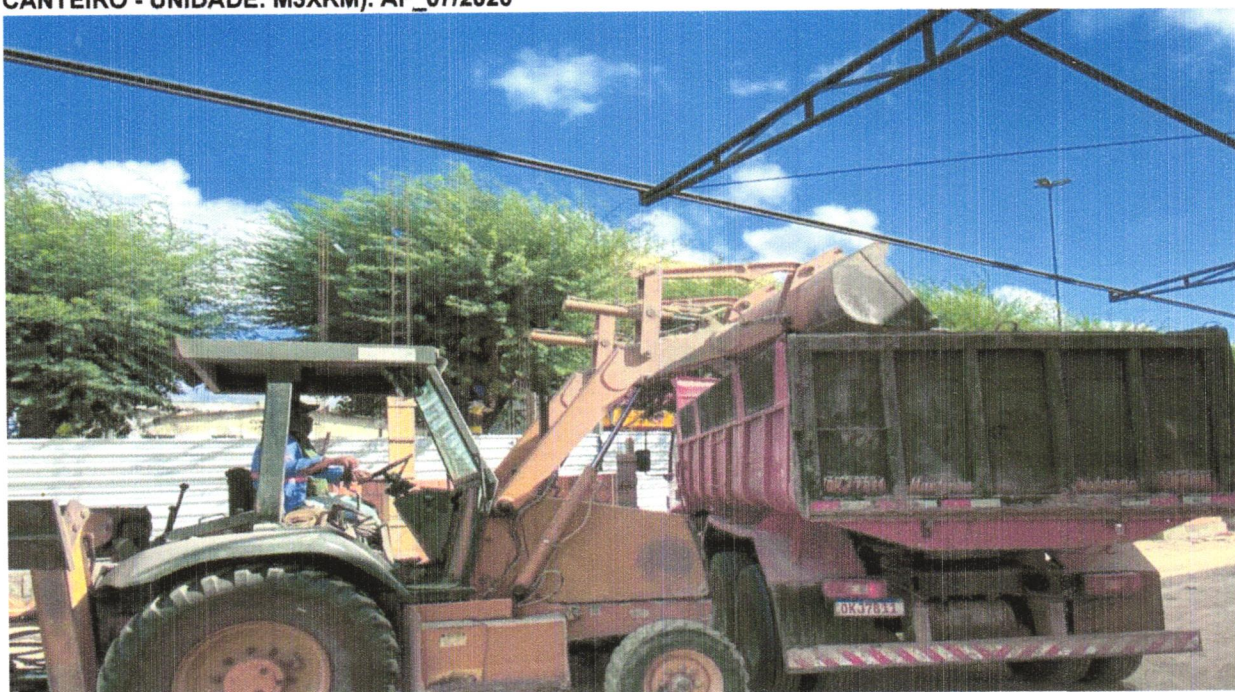

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - Ba

FOTO 03 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014.



FOTO 04 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - Ba

FOTO 05 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



FOTO 06 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - Ba

FOTO 07 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



FOTO 08 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - Ba

FOTO 09 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



FOTO 10 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 11 - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022.



FOTO 12 - CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020.



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 13 - CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020.



FOTO 14 - TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.



31/01/2024

Santaluz-Ba

Shopping Popular no
Município de Santaluz - BA.

FOTO 15 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.



FOTO 16 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022



31/01/2024


Santaluz-Ba

Shopping Popular no
Município de Santaluz - BA.

FOTO 17 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.



FOTO 18 - CAIXA DE DRENAGEM TIPO I - DIMENSÕES 0,80X0,80X1,00M

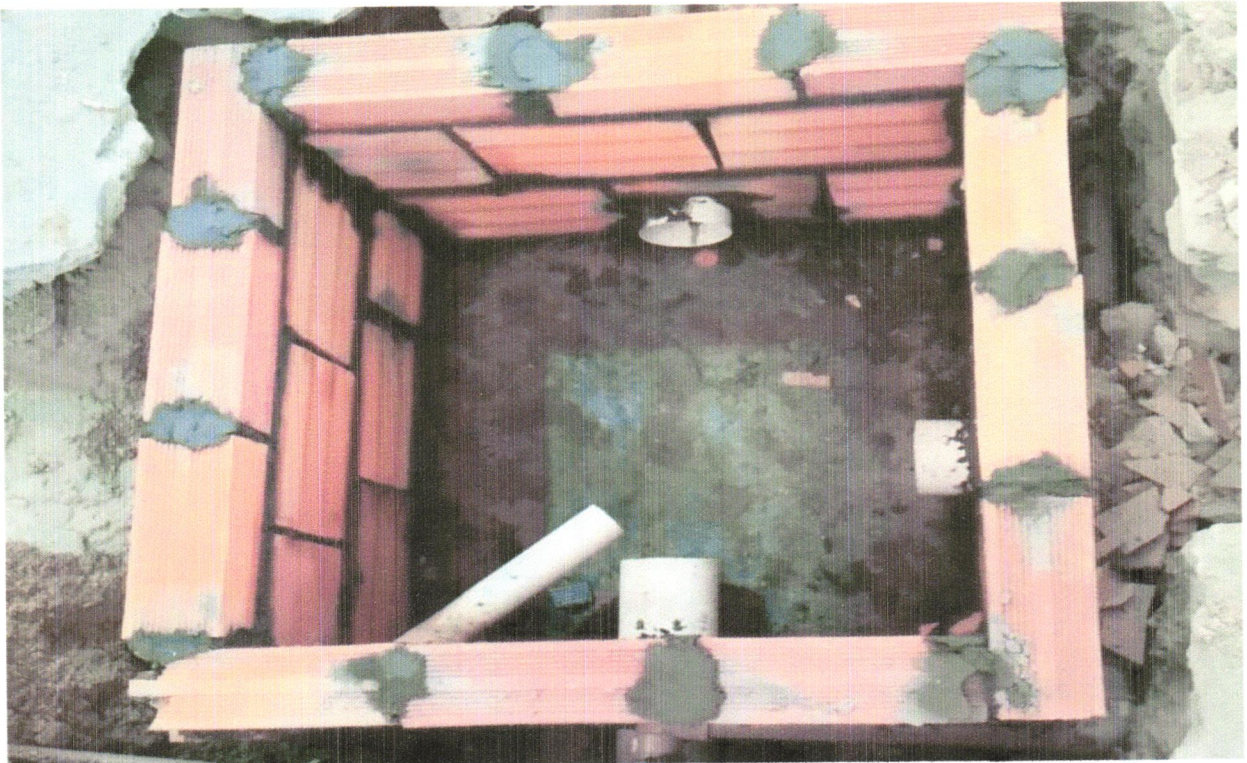

31/01/2024

Santaluz-Ba

Shopping Popular no
Município de Santaluz - BA.

FOTO 19 - CAIXA DE DRENAGEM TIPO I - DIMENSÕES 0,80X0,80X1,00M



FOTO 20 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 21 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015

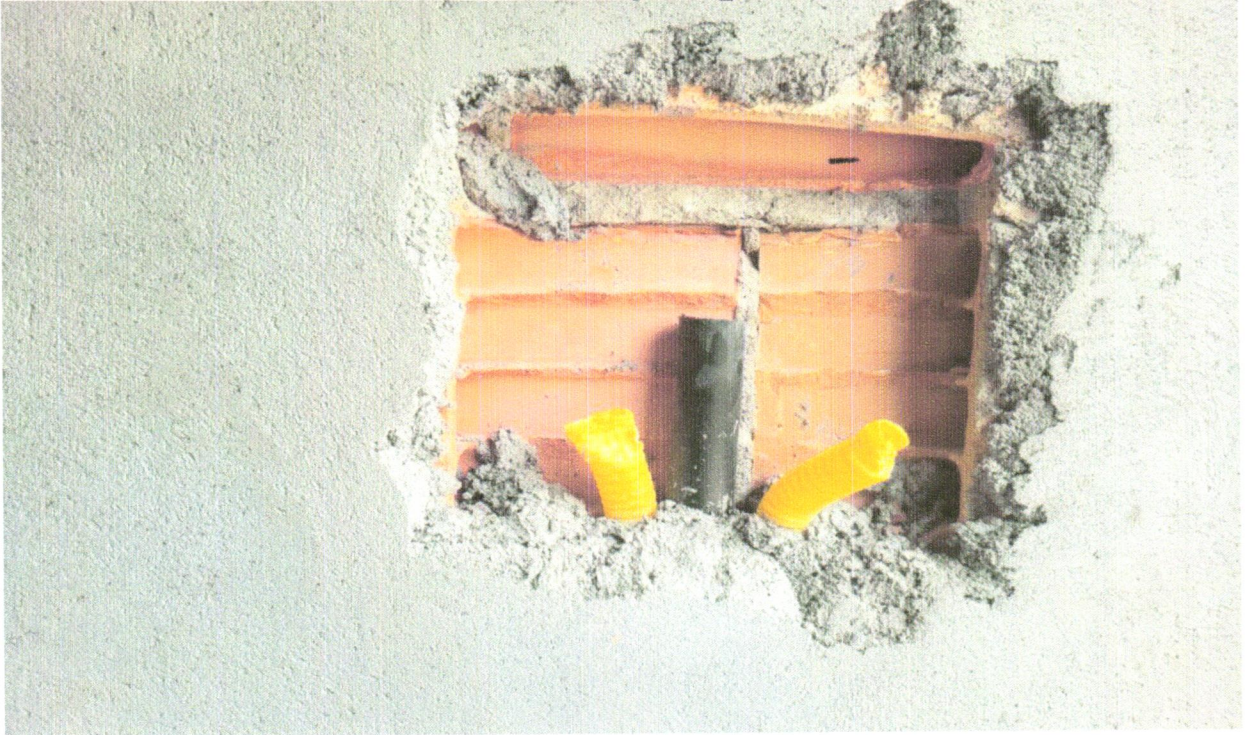


FOTO 22 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 23 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022



FOTO 24 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 25 – ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022



FOTO 26 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

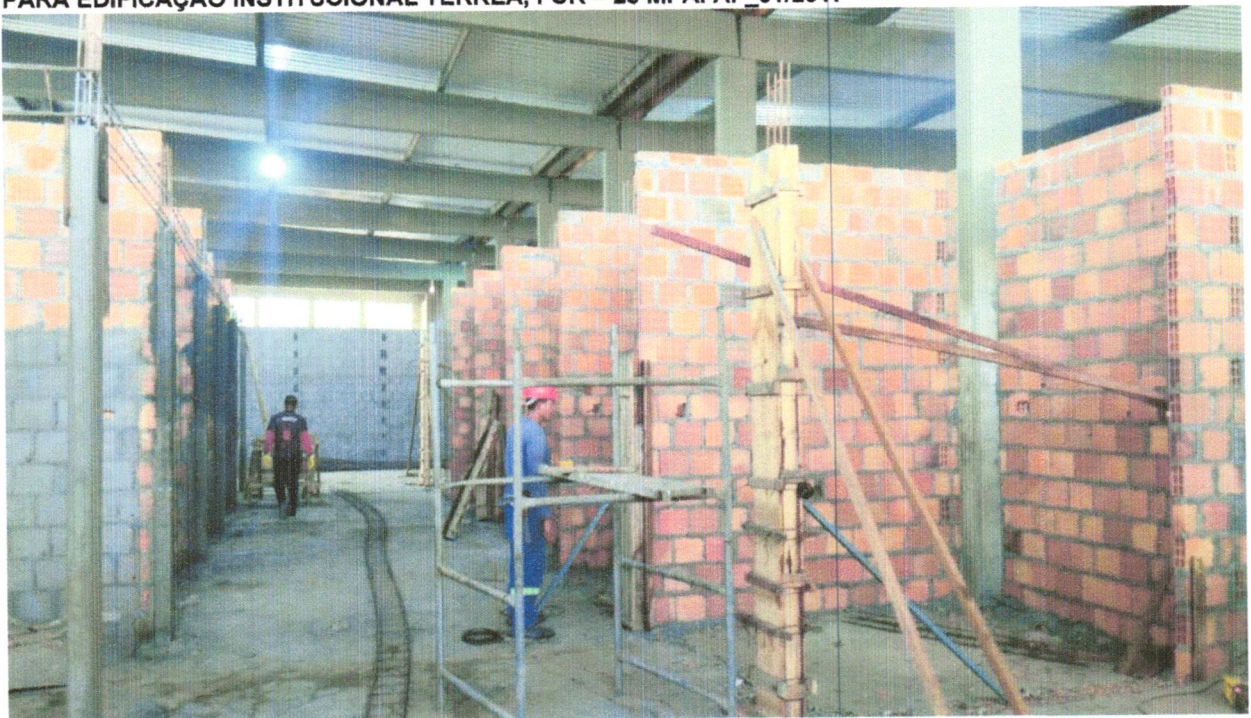

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 27 –(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017



FOTO 28 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 29 –(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017



FOTO 30 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017




DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 31 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022.



FOTO 32 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022.

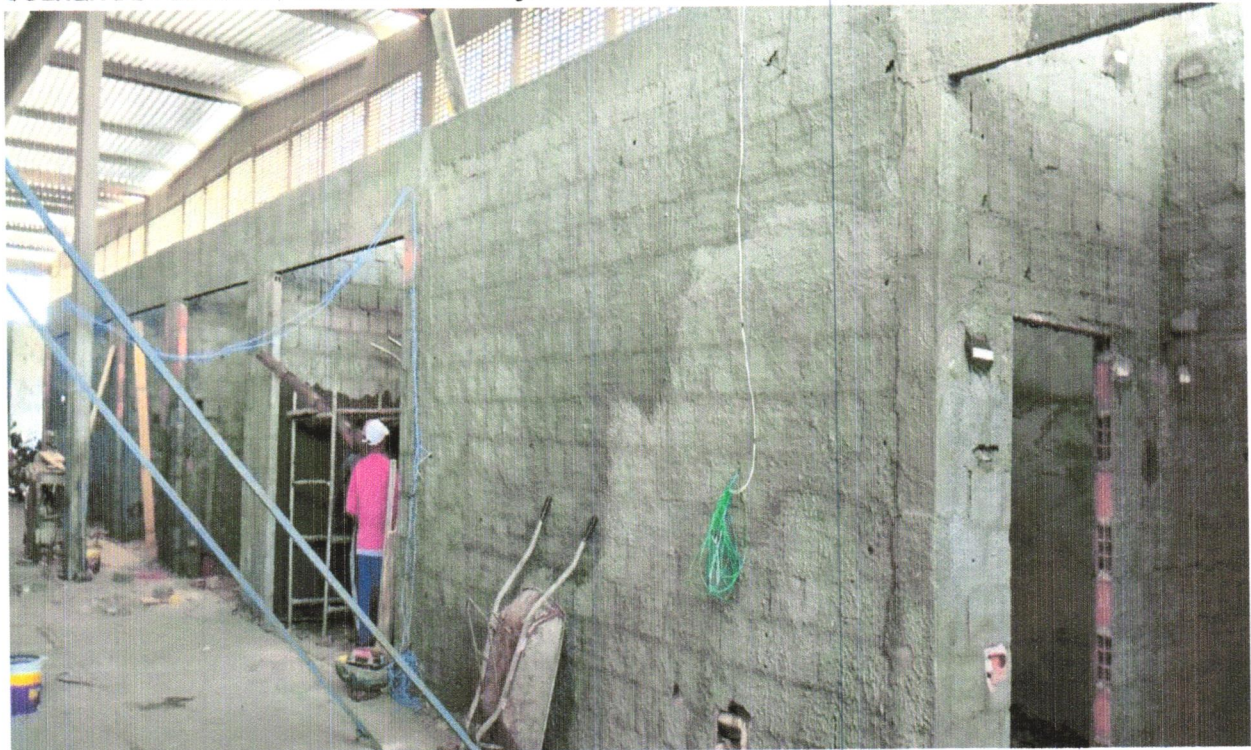


DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 33 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022.



FOTO 34 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022.

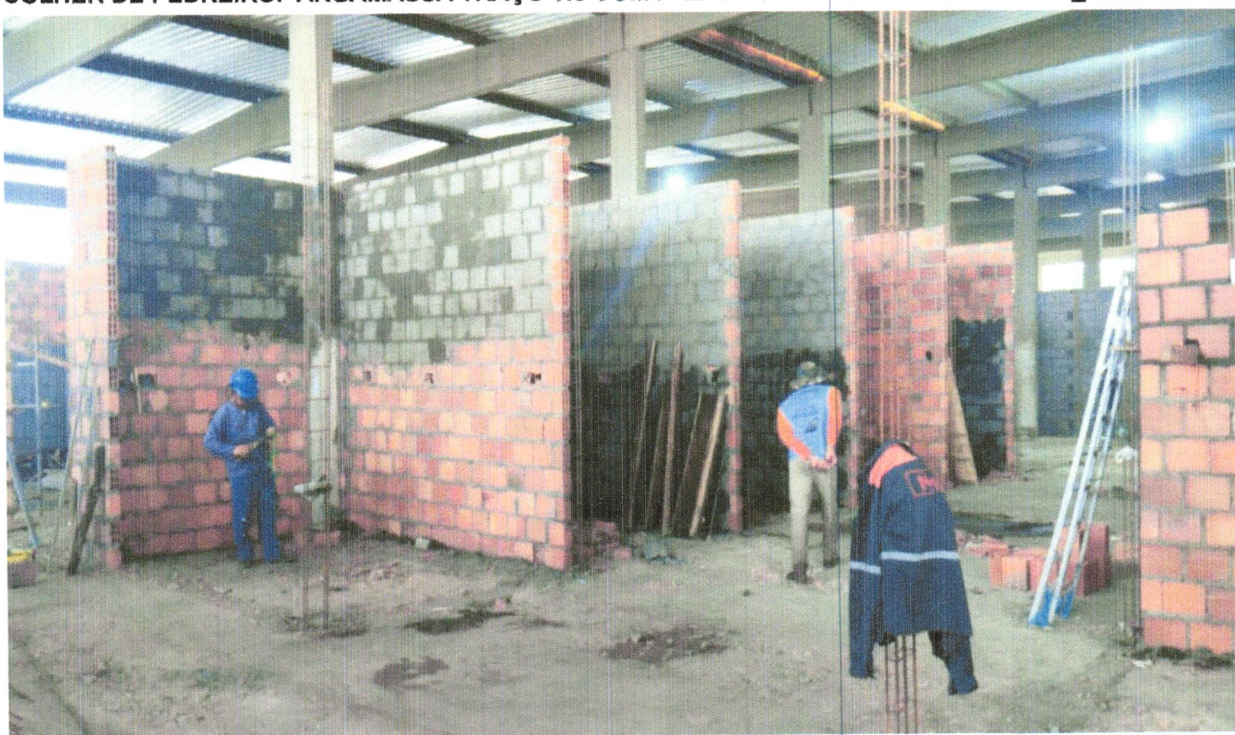

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 35 – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



FOTO 36 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 37 – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



FOTO 38 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 39 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



FOTO 40 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 41 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 20MM, FSUP.=NÃO PINTADA, FINF.=FILME ALUM. BCO, TP40 - 2 X 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILA.



FOTO 42 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 20MM, FSUP.=NÃO PINTADA, FINF.=FILME ALUM. BCO, TP40 - 2 X 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILA.

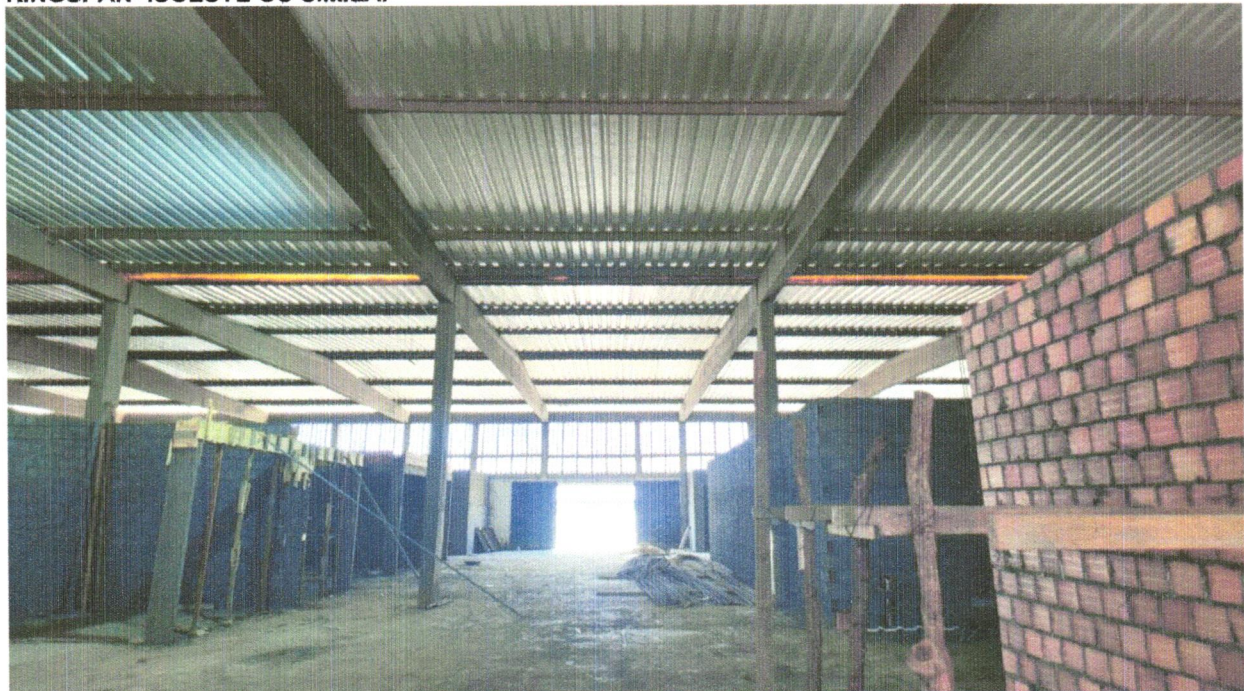

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 43 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 20MM, FSUP.=NÃO PINTADA, FINF.=FILME ALUM. BCO, TP40 - 2 X 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILA.



FOTO 44 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 20MM, FSUP.=NÃO PINTADA, FINF.=FILME ALUM. BCO, TP40 - 2 X 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILA.




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 45 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 20MM, FSUP.=NÃO PINTADA, FINF.=FILME ALUM. BCO, TP40 - 2 X 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILA.



FOTO 46 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 20MM, FSUP.=NÃO PINTADA, FINF.=FILME ALUM. BCO, TP40 - 2 X 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILA.

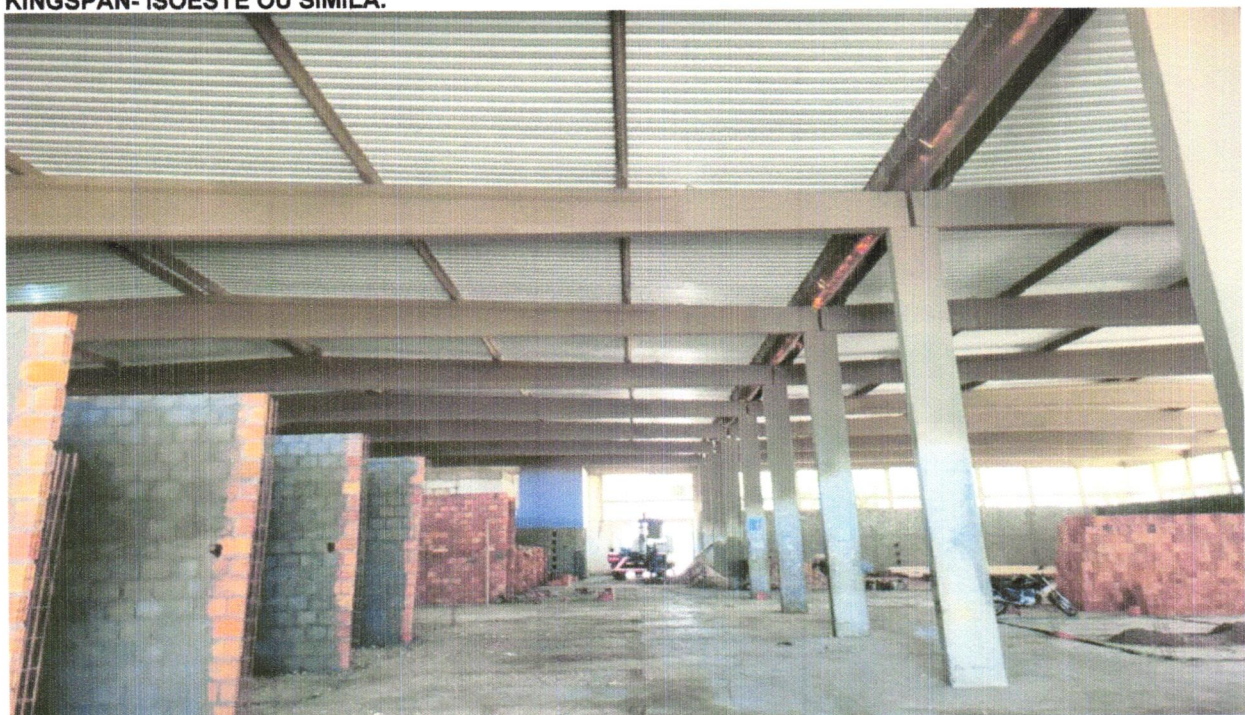

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 47 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 20MM, FSUP.=NÃO PINTADA, FINF.=FILME ALUM. BCO, TP40 - 2 X 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILA.



FOTO 48 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 20MM, FSUP.=NÃO PINTADA, FINF.=FILME ALUM. BCO, TP40 - 2 X 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILA.



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 49 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 20MM, FSUP.=NÃO PINTADA, FINF.=FILME ALUM. BCO, TP40 - 2 X 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILA.


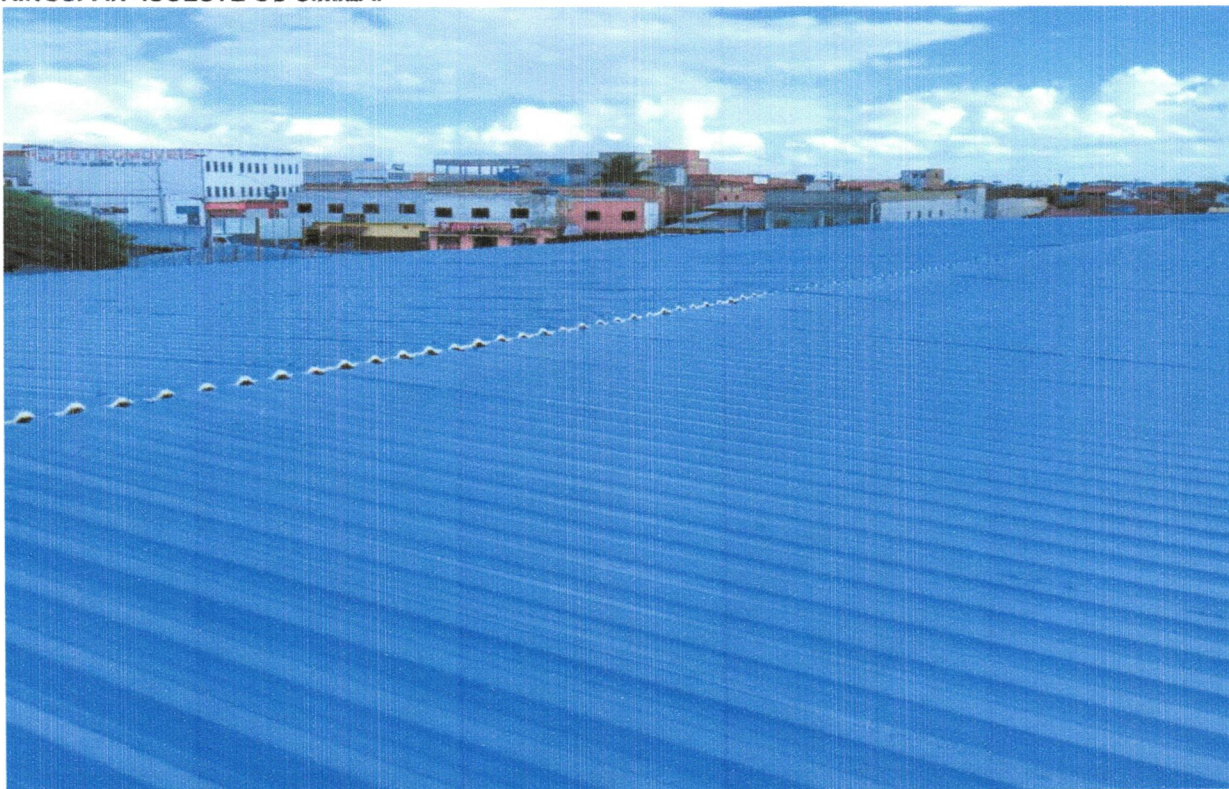


FOTO 50 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 20MM, FSUP.=NÃO PINTADA, FINF.=FILME ALUM. BCO, TP40 - 2 X 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILA.

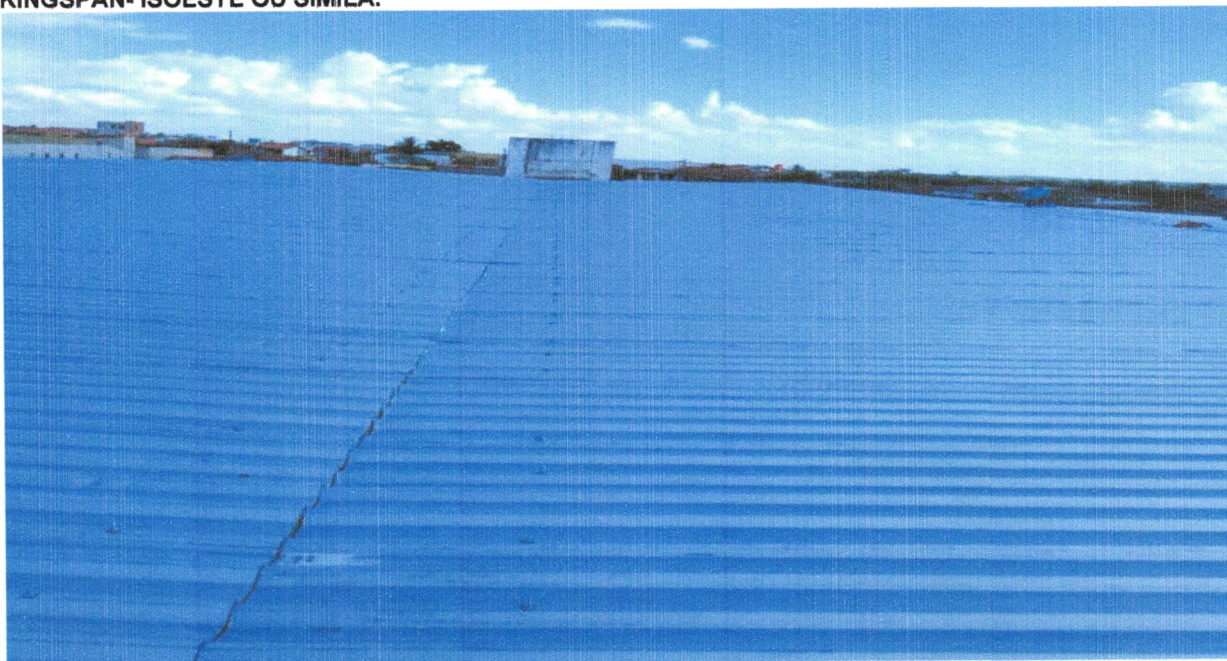


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 51 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 20MM, FSUP.=NÃO PINTADA, FINF.=FILME ALUM. BCO, TP40 - 2 X 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILA.



FOTO 52 - TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 20MM, FSUP.=NÃO PINTADA, FINF.=FILME ALUM. BCO, TP40 - 2 X 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILA.

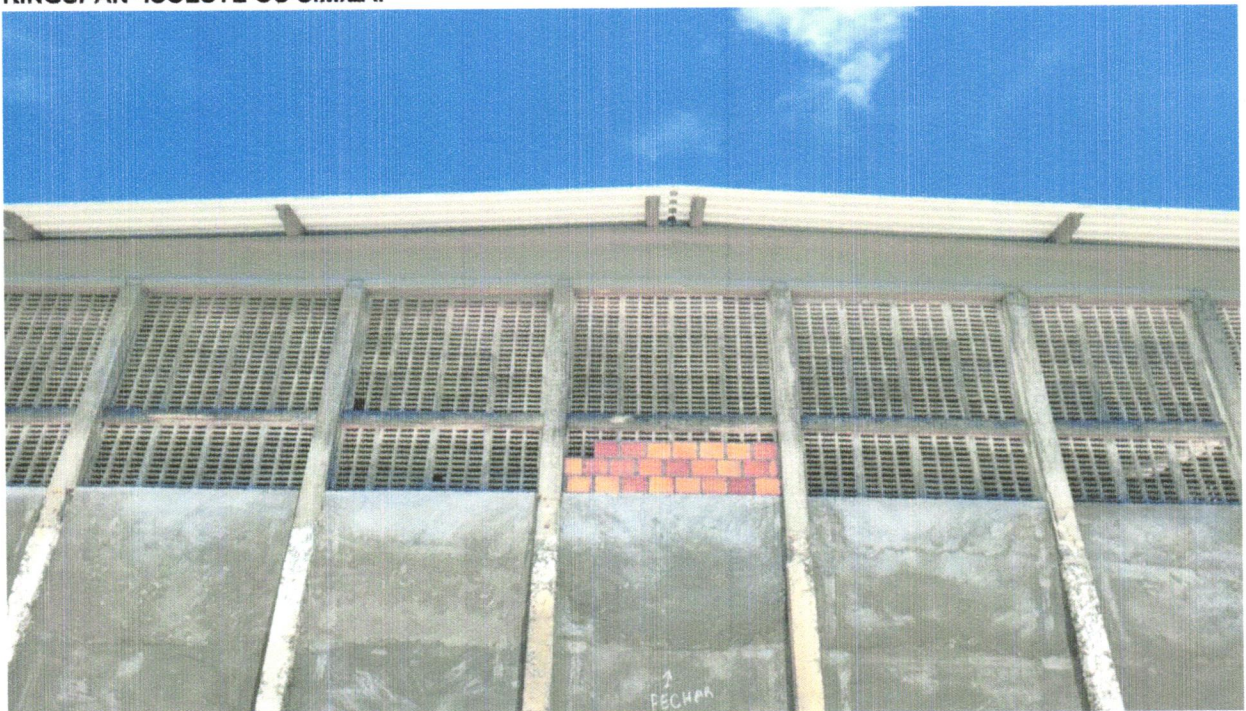

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

**FOTO 53 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_PS**



**FOTO 54 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_PS**



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 55 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017



FOTO 56 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 57 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017



FOTO 58 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

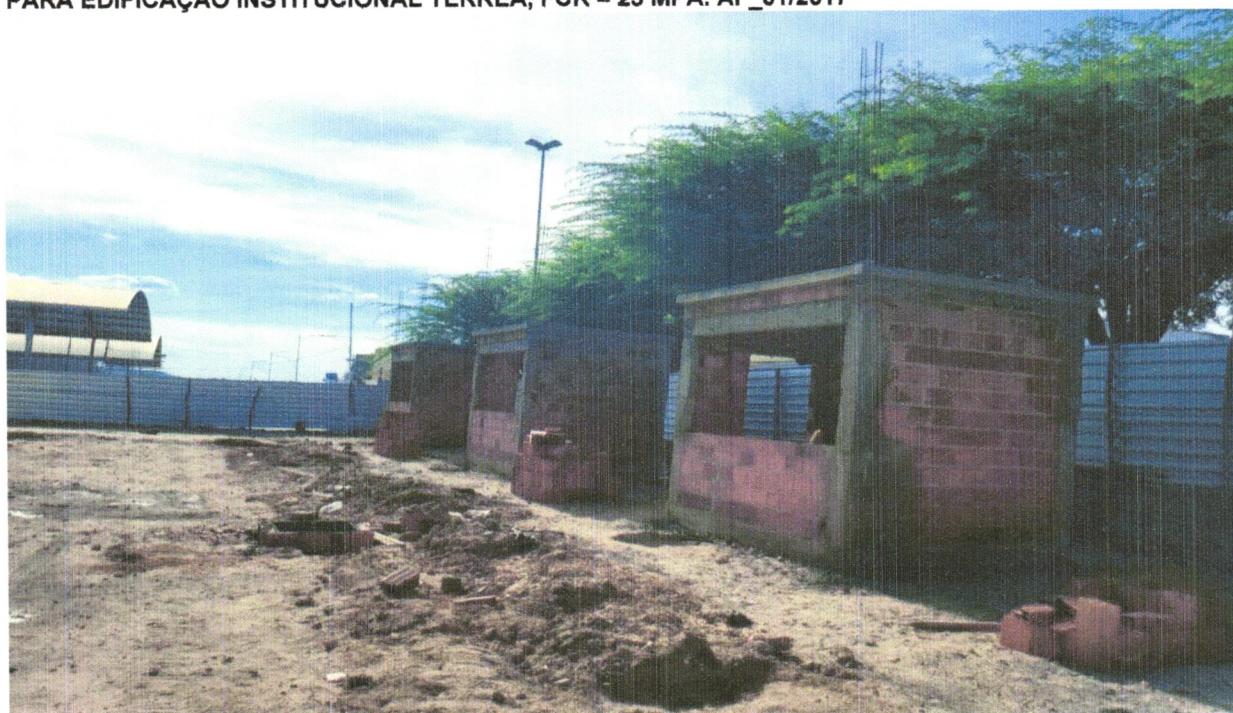


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 59 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014.



FOTO 60 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014.

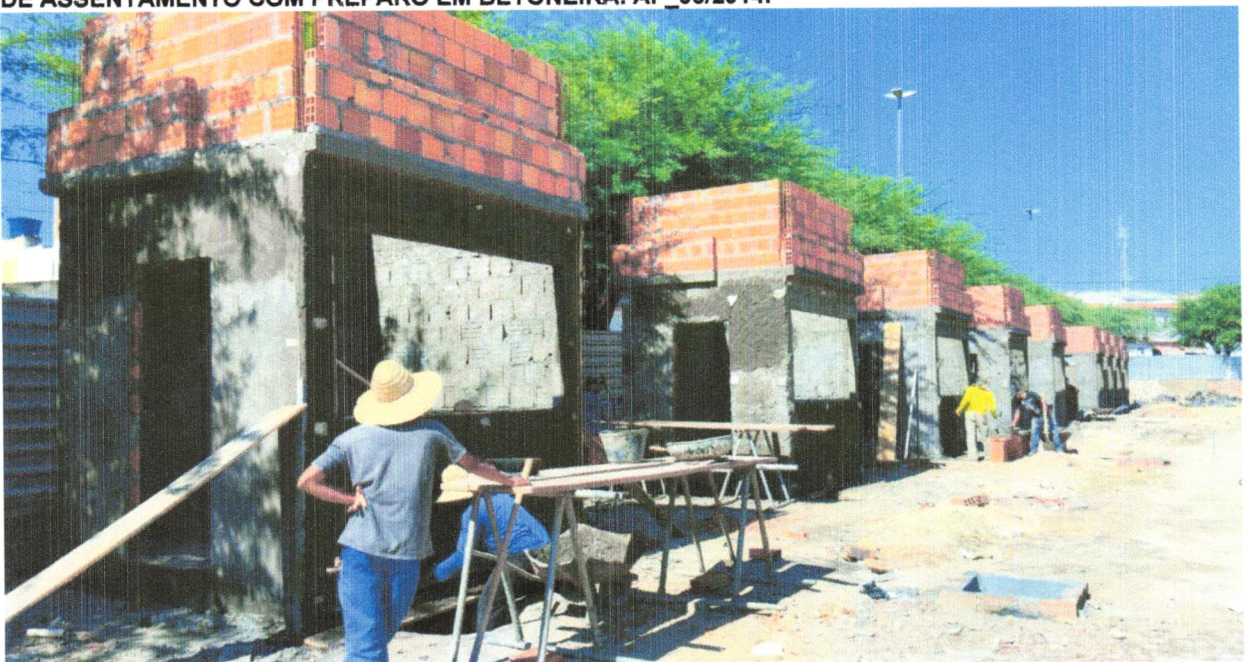


DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 61 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



FOTO 62 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

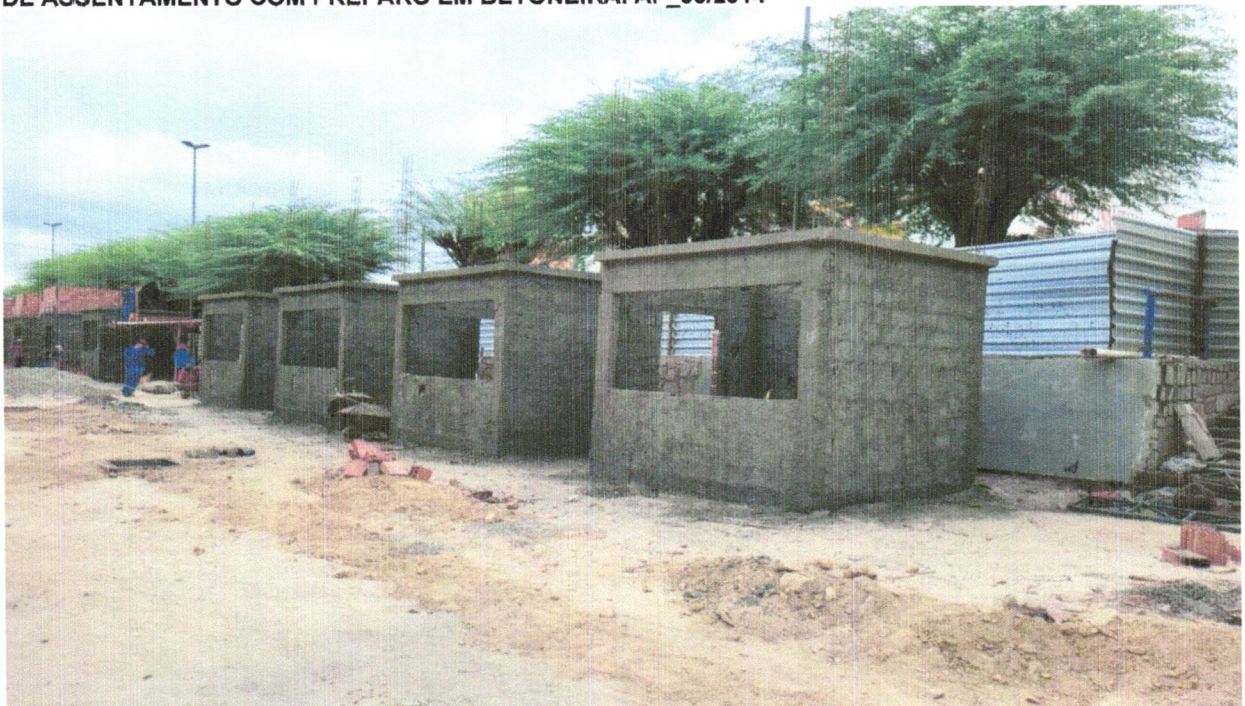

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

FOTO 63 – GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM



FOTO 64 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM




DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/01/2024	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.


FOTO 65 – ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016.




FOTO 66 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016.



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						01/12/2023							S	T
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 178/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 86		EFETIVO PESSOAL					CATEGORIA QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Hh DO DIA							
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME INSTALAÇÃO DO GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC		MÃO DE OBRA DIRETA					Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajudante Geral 25 Calçeteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 1 Pintor Armador 2							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS					TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 01/12/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 01/12/2023												


	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data 02/12/2023		S	T	Q	Q	S	X	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N° 178/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023 RDD: 87			EFETIVO PESSOAL			CATEGORIA		QTDE					
Condições Climáticas:		Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra									
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Engenheiro									
					Tec. de Segurança									
					Aux Adm									
					Mestre de obra									
					Encarregado geral									
					Hh DO DIA									
					MÃO DE OBRA DIRETA									
					Topografo									
					Auxiliar de topografia									
					Pedreiro									
					Ajudante Geral									
					Calçeteiro									
Carpinteiro														
Operador de Motosserra														
Motorista														
Montador														
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor														
Armador														
Hh DO DIA														
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO											
			EFETIVO DO DIA											
			JORNADA DE TRABALHO											
			Hh DO DIA											
			Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS											
			TIPO			QTDE.								
			Veículo Leve											
			Caminhão Muncck											
			Caminhão Toco											
			Escavadeira											
			Pá carregadeira											
			Caçamba											
			Patrol											
PC 200														
Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:											
Data: 02/12/2023			Data: 02/12/2023											


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



FORM NO. 1	
Sl. No.	Description
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						03/12/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR		CONTRATO N° 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023	RDO: 88	EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 03/12/2023		Data: 03/12/2023										


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
 2023-12-03 14:55:00


NO.	NAME	GRADE	STATUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						X						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N° 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023 RDO: 89					04/12/2023 S T Q Q S S D							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME INSTALAÇÃO DO GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC					Gerente de Obra							
					Engenheiro 1							
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm 1							
					Mestre de obra 1							
					Encarregado geral							
					Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topografo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro 20							
					Ajudante Geral 25							
					Calcetelro							
					Carpintelro 3							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador							
					Montador/Eletricista							
OBSERVAÇÕES					Eletricista							
					Operador de Patrol							
					Operador de Escavadeira 1							
					Operador de Pé carregadeira							
					Motorista de caçamba 1							
					Pintor							
					Armador 2							
					Hh DO DIA							
					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO QTDE.							
					Veículo Leve							
					Caminhão MuncK							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pé carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/12/2023					Data: 04/12/2023							



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Data: 04/12/2023
 RNP 2489-94110-0000

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																								
						05/12/2023							S	X	T	Q	Q	S	S	D										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 178/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 90		EFETIVO PESSOAL																												
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE																									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME INSTALAÇÃO DO GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC		MÃO DE OBRA INDIRETA																												
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA																												
		MÃO DE OBRA DIRETA																												
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajudante Geral 25 Calceiteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pé carregadeira Motorista de caçamba 1 Pintor Armador 2 Hh DO DIA																												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO																												
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																												
		EFETIVO EQUIPAMENTOS																												
OBSERVAÇÕES		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão MuncK</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pé carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>									TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão MuncK		Caminhão Toco		Escavadeira		Pé carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
		TIPO	QTDE.																											
Veículo Leve																														
Caminhão MuncK																														
Caminhão Toco																														
Escavadeira																														
Pé carregadeira																														
Caçamba																														
Patrol																														
PC 200																														
Placa Vibratória																														
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																												
Data: 05/12/2023		Data: 05/12/2023																												



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data														
					06/12/2023														
CONDICIONES CLIMÁTICAS		CONTRATO N° 178/2023			CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023			RDO: 91		EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()					CATEGORIA		QTDE						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.									MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra		Engenheiro		Tec. de Segurança		Aux Adm		Mestre de obra		Encarregado geral		Hh DO DIA					
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME INSTALAÇÃO DO GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC																			
CONSIDERAÇÕES											RESUMO DO EFETIVO								
											EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO			Hh DO DIA		Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES											EFETIVO EQUIPAMENTOS								
											TIPO		QTDE.						
											Veículo Leve								
											Caminhão Muncck								
											Caminhão Toco								
											Escavadeira								
											Pá carregadeira								
											Caçamba								
											Patrol								
											PC 200								
											Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																	
Data: 06/12/2023		Data: 06/12/2023																	



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Manoel de Sá
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				07/12/2023							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023				RDO: 92							
Condições Climáticas:		Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				CATEGORIA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME INSTALAÇÃO DO GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC						MÃO DE OBRA INDIRETA							
						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajudante Geral 25 Calceteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 1 Pintor Armador 2 Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
						OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS	
						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
						GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:			
Data: 07/12/2023				Data: 07/12/2023									


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data			
						08/12/2023			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		CONTRATO N° 178/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023		RDO: 93			
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR		CATEGORIA		QTDE		EFETIVO PESSOAL			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA					
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME INSTALAÇÃO DO GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC		Gerente de Obra							
		Engenheiro		1					
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm		1					
		Mestre de obra		1					
		Encarregado geral							
		Hh DO DIA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro		20					
		Ajudante Geral		25					
		Calceiteiro							
		Carpinteiro		3					
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
Montador									
Montador/Eletricista									
Eletricista									
Operador de Patrol									
Operador de Escavadeira		1							
Operador de Pá carregadeira									
Motorista de caçamba		1							
Pintor									
Armador		2							
Hh DO DIA									
RESUMO DO EFETIVO									
EFETIVO DO DIA									
JORNADA DE TRABALHO									
Hh DO DIA									
Hh ACUMULADO									
EFETIVO EQUIPAMENTOS									
TIPO									
QTDE.									
Veículo Leve									
Caminhão Muncck									
Caminhão Toco									
Escavadeira									
Pá carregadeira									
Caçamba									
Patrol									
PC 200									
Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/12/2023		Data: 08/12/2023							


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 DANIELA...
 RNP 24.590.244.5237-00



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data							X
09/12/2023	S	T	Q	Q	S	S	D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

EFETIVO PESSOAL

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR

CATEGORIA QTDE

CONTRATO N° 178/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023 RDO: 94

MÃO DE OBRA INDIRETA

Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()

SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS

Gerente de Obra

Engenheiro

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calçeteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Armador

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA
Hh ACUMULADO

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES


EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Muncck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	


GERENTE DE OBRA:
Data: 09/12/2023


FISCALIZAÇÃO:
Data: 09/12/2023


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						10/12/2023							S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N° 178/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023 RDO: 95		EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA											
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		Gerente de Obra											
		Engenheiro											
		Tec. de Segurança											
		Aux Adm											
		Mestre de obra											
		Encarregado geral											
		Hh DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA									
		Topografo											
		Auxiliar de topografia											
		Pedreiro											
		Ajudante Geral											
		Calceteiro											
		Carpinteiro											
		Operador de Motosserra											
		Motorista											
		Montador											
		Montador/Eletricista											
		Eletricista											
		Operador de Patrol											
		Operador de Escavadeira											
		Operador de Pá carregadeira											
		Motorista de caçamba											
		Pintor											
		Armador											
		Hh DO DIA											
		CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO									
		EFETIVO DO DIA											
		JORNADA DE TRABALHO											
		Hh DO DIA											
		Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS											
		TIPO			QTDE.								
		Veículo Leve											
		Caminhão Muncck											
		Caminhão Toco											
		Escavadeira											
		Pá carregadeira											
		Caçamba											
		Patrol											
		PC 200											
		Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 10/12/2023		Data: 10/12/2023											



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Carlos Eduardo
 Engenheiro Civil
 RNP 24.59.841.201-7

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data												
						12/12/2023							X					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ									EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR									CATEGORIA									
CONTRATO N° 178/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023			RDO: 97				MÃO DE OBRA INDIRETA									
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()												
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.										Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA										Engenheiro 1						
		EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS										Tec. de Segurança						
		EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO										Aux Adm 1						
		EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS										Mestre de obra 1						
		EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA										Encarregado geral						
		INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME																
		INSTALAÇÃO DO GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO																
		TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO																
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO																
		EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL																
		INSTALAÇÃO DE FERRO DE PVC																
												Hh DO DIA						
												MÃO DE OBRA DIRETA						
												Topografo						
												Auxiliar de topografia						
												Pedreiro 20						
												Ajudante Geral 25						
												Caloteiro						
												Carpinteiro 3						
												Operador de Motosserra						
												Motorista						
												Montador						
												Montador/Eletricista						
												Eletricista						
												Operador de Patrol						
												Operador de Escavadeira 1						
												Operador de Pá carregadeira						
												Motorista de caçamba 1						
												Pintor						
												Armador 2						
												Hh DO DIA						
												RESUMO DO EFETIVO						
												EFETIVO DO DIA						
												JORNADA DE TRABALHO						
												Hh DO DIA						
												Hh ACUMULADO						
												EFETIVO EQUIPAMENTOS						
												TIPO						
												QTDE.						
												Veículo Leve						
												Caminhão Munck						
												Caminhão Toco						
												Escavadeira						
												Pá carregadeira						
												Caçamba						
												Patrol						
												PC 200						
												Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																
Data: 12/12/2023		Data: 12/12/2023																



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 CARVALHO
 12/12/2023

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
						13/12/2023									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 178/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 98		CATEGORIA				QTDE					
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro								1					
		Tec. de Segurança													
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME INSTALAÇÃO DO GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC		Aux Adm								1					
		Mestre de obra								1					
Encarregado geral															
Hh DO DIA															
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA													
		Topografo													
Auxiliar de topografia															
Pedreiro								20							
Ajudante Geral								25							
Calceteiro															
Carpinteiro								3							
Operador de Motosserra															
Motorista															
Montador															
Montador/Eletricista															
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira								1							
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba								1							
Pintor															
Armador								2							
Hh DO DIA															
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO													
		EFETIVO DO DIA													
JORNADA DE TRABALHO															
Hh DO DIA															
Hh ACUMULADO															
GERENTE DE OBRA:		EFETIVO EQUIPAMENTOS													
		TIPO				QTDE.									
Veículo Leve															
Caminhão Munck															
Caminhão Toco															
Escavadeira															
Pá carregadeira															
Caçamba															
Patrol															
PC 200															
Placa Vibratória															
FISCALIZAÇÃO:		Data: 13/12/2023													



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Prefeitura Municipal de Santaluz
 Rua 24 de Abril, 244 - Santaluz
 CEP: 35.700-000 - Minas Gerais

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data								
			14/12/2023		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 178/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 99			EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			CATEGORIA		QTDE						
SIMBOLOGIA			1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra								
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME INSTALAÇÃO DO GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC			Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA								
			MÃO DE OBRA DIRETA								
			Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajudante Geral 25 Calceteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 1 Pintor Armador 2								
			Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO								
			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS								
			TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA: Data: 14/12/2023			FISCALIZAÇÃO: Data: 14/12/2023								


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


DANIELA COSTA
 CPF nº 044.171.930-01
 CNH nº 24.639.547-020-91


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data: 15/12/2023 <table border="1"> <tr> <td>S</td> <td>T</td> <td>Q</td> <td>Q</td> <td>X</td> <td>S</td> <td>S</td> <td>D</td> </tr> </table>							S	T	Q	Q	X	S	S	D
S	T	Q	Q	X	S	S	D											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				EFETIVO PESSOAL														
CONTRATO N° 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023		RDO: 100			CATEGORIA		QTDE									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA														
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra		1												
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro		1												
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME INSTALAÇÃO DO GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC				Tec. de Segurança		1												
				Aux Adm		1												
				Mestre de obra		1												
				Encarregado geral		1												
				Hh DO DIA		1												
				MÃO DE OBRA DIRETA														
				Topografo														
				Auxiliar de topografia														
				Pedreiro		20												
				Ajudante Geral		25												
				Calceteiro														
				Carpinteiro		3												
				Operador de Motosserra														
				Motorista														
				Montador														
				Montador/Eletricista														
				Eletricista														
				Operador de Patrol														
				Operador de Escavadeira		1												
				Operador de Pé carregadeira														
				Motorista de caçamba		1												
				Pintor														
				Armador		2												
				Hh DO DIA														
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO														
				EFETIVO DO DIA														
				JORNADA DE TRABALHO														
				Hh DO DIA														
				Hh ACUMULADO														
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS														
				TIPO		QTDE.												
				Veículo Leve														
				Caminhão Munk														
				Caminhão Toco														
				Escavadeira														
				Pé carregadeira														
				Caçamba														
				Patrol														
				PC 200														
				Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:														
Data: 15/12/2023				Data: 15/12/2023														



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 GABRIEL
 ENGENHEIRO
 CIVIL
 CREA 024.097.244/02-7

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data																										
							16/12/2023																										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ							<table border="1"> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>							S	T	Q	Q	S	S	D	X												
S	T	Q	Q	S	S	D	X																										
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR							EFETIVO PESSOAL																										
CONTRATO N° 178/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023			RDO: 101	CATEGORIA							QTDE																				
Condições Climáticas:							MÃO DE OBRA INDIRETA																										
SIMBOLOGIA		Manhã: (1)		Tarde: (1)							Noite: ()																						
		1- Tempo Bom			2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra																					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS					Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA																										
							MÃO DE OBRA DIRETA																										
							Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador																										
							Hh DO DIA																										
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO																										
							EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																										
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS																										
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																																
Veículo Leve																																	
Caminhão Munck																																	
Caminhão Toco																																	
Escavadeira																																	
Pá carregadeira																																	
Caçamba																																	
Patrol																																	
PC 200																																	
Placa Vibratória																																	
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																															
Data: 16/12/2023		Data: 16/12/2023																															



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Nº 24.931.34401/2017

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						17/12/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR						CATEGORIA						
CONTRATO N° 178/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023		RDO: 102		QTDE						
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra				
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
						Engenheiro						
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Calceteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Armador						
						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QTDE.						
						Veiculo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/12/2023						Data: 17/12/2023						



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Rua 24 de Abril, 544 - Centro
 CEP: 13.240-000 - Santaluz, SP

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data																
	18/12/2023	X																		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	EFETIVO PESSOAL																			
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR	CATEGORIA										QTDE									
CONTRATO N° 176/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023	RDO: 103	MÃO DE OBRA INDIRETA																	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.																			
SIMBOLOGIA	SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										Gerente de Obra									
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA											Engenheiro	1								
EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS											Tec. de Segurança									
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO											Aux Adm	1								
EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS											Mestre de obra	1								
EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA											Encarregado geral									
INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME																				
INSTALAÇÃO DO GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO																				
TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO																				
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO																				
EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL																				
INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC											Hh DO DIA									
											MÃO DE OBRA DIRETA									
											Topografo									
											Auxiliar de topografia									
											Pedreiro	20								
											Ajudante Geral	25								
											Calceteiro									
											Carpinteiro	3								
											Operador de Motosserra									
											Motorista									
											Montador									
											Montador/Eletricista									
											Eletricista									
											Operador de Patrol									
											Operador de Escavadeira	1								
											Operador de Pá carregadeira									
											Motorista de caçamba	1								
											Pintor									
											Armador	2								
											Hh DO DIA									
											RESUMO DO EFETIVO									
											EFETIVO DO DIA									
											JORNADA DE TRABALHO									
											Hh DO DIA									
											Hh ACUMULADO									
											EFETIVO EQUIPAMENTOS									
											TIPO	QTDE.								
											Veículo Leve									
											Caminhão Muncck									
											Caminhão Toco									
											Escavadeira									
											Pá carregadeira									
											Caçamba									
											Patrol									
											PC 200									
											Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:	FISCALIZAÇÃO:																			
Data: 18/12/2023	Data: 18/12/2023																			



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Instituto de Engenharia e Arquitetura do Brasil
 Rua... 24 591 344 - 02061-070

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				19/12/2023							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 104		QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME INSTALAÇÃO DO GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							1
				Mestre de obra							1
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA			
Topografo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro								20			
Ajudante Geral								25			
Calceteiro											
Carpinteiro								3			
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira								1			
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba							1				
Pintor											
Armador							2				
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
GERENTE DE OBRA:				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
DATA: 19/12/2023				TIPO							QTDE.
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
FISCALIZAÇÃO:				DATA: 19/12/2023							


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

SANTALUZ
 05/12/2023
 Nº 24/2023
 Nº 24/2023

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						20/12/2023							S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 105		EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA											
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME INSTALAÇÃO DO GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO MANUAL INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC		Gerente de Obra			1								
		Tec. de Segurança											
		Aux Adm			1								
		Mestre de obra			1								
		Encarregado geral											
		Hh DO DIA											
		MÃO DE OBRA DIRETA											
		Topografo											
		Auxiliar de topografia											
		Pedreiro		20									
Ajudante Geral		25											
Calceteiro													
Carpinteiro		3											
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira		1											
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba		1											
Pintor													
Armador		2											
Hh DO DIA													
RESUMO DO EFETIVO													
EFETIVO DO DIA													
JORNADA DE TRABALHO													
Hh DO DIA													
Hh ACUMULADO													
EFETIVO EQUIPAMENTOS													
TIPO		QTDE.											
Veículo Leve													
Caminhão Munck													
Caminhão Toco													
Escavadeira													
Pá carregadeira													
Caçamba													
Patrol													
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 20/12/2023		Data: 20/12/2023											



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Daniel
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
						21/12/2023										
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL										
		OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				CATEGORIA										
		CONTRATO N° 178/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023		RDO: 106		QTDE								
Condições Climáticas		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom		2 - Chuva al cond. Trab.		3- Chuva al cond. Trab.		Gerente de Obra						
										Engenheiro						
										Tec. de Segurança						
										Aux Adm						
										Mestre de obra						
										Encarregado geral						
										Hh DO DIA						
										MÃO DE OBRA DIRETA						
										Topografo						
										Auxiliar de topografia						
										Pedreiro						
										Ajudante Geral						
										Calceiteiro						
										Carpinteiro						
										Operador de Motosserra						
										Motorista						
										Montador						
										Montador/Eletricista						
										Eletricista						
										Operador de Patrol						
										Operador de Escavadeira						
										Operador de Pá carregadeira						
										Motorista de caçamba						
										Pintor						
										Armador						
										Hh DO DIA						
										RESUMO DO EFETIVO						
										EFETIVO DO DIA						
										JORNADA DE TRABALHO						
										Hh DO DIA						
										Hh ACUMULADO						
										EFETIVO EQUIPAMENTOS						
										TIPO						
										QTDE.						
										Veiculo Leve						
										Caminhão MuncK						
										Caminhão Toco						
										Escavadeira						
										Pá carregadeira						
										Caçamba						
										Patrol						
										PC 200						
										Placa Vibratória						
										Hh DO DIA						
GERENTE DE OBRA:										FISCALIZAÇÃO:						
Data: 21/12/2023										Data: 21/12/2023						
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA																
EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS																
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO																
EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS																
EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA																
INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME																
INSTALAÇÃO DO GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO																
TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO																
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO																
EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL																
INSTALAÇÃO DE FERRO DE PVC																



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Daniel Lins
 Engenheiro Civil
 RNP 24 001 241 001 2


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						22/12/2023							S	T
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 178/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 107		EFETIVO PESSOAL												
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA					QTDE							
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA												
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME INSTALAÇÃO DO GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA												
		MÃO DE OBRA DIRETA												
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajudante Geral 25 Calceteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 1 Pintor Armador 2 Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO												
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS												
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 22/12/2023		Data: 22/12/2023												



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 FISCALIZAÇÃO
 Nome: _____
 CPF: _____
 Data: 24/12/2023


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						23/12/2023							S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023		RDO: 108		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra		
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						CONSIDERAÇÕES		OBSERVAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA	
Topografo													
Auxiliar de topografia													
Pedreiro													
Ajudante Geral													
Calceteiro													
Carpinteiro													
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Armador													
Hh DO DIA													
RESUMO DO EFETIVO		RESUMO DO EFETIVO										EFETIVO DO DIA	
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
EFETIVO EQUIPAMENTOS		EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO		QTDE.					
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 23/12/2023		Data: 23/12/2023											



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Daniel
 RNP 24 501 344 023/047


 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				24/12/2023									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR													
CONTRATO N° 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023		RDO: 109		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra									
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Engenheiro									
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral									
				Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro									
Ajudante Geral													
Calçeteiro													
Carpinteiro													
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Armador													
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO				QTDE.					
				Veículo Leve									
				Caminhão MuncK									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 24/12/2023				Data: 24/12/2023									



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Data: 24/12/2023


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						26/12/2023		S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 111		EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA					QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME INSTALAÇÃO DO GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO MANUAL INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC		MÃO DE OBRA INDIRETA											
		Gerente de Obra											
		Engenheiro					1						
		Tec. de Segurança											
		Aux Adm					1						
		Mestre de obra					1						
		Encarregado geral											
		Hh DO DIA											
		MÃO DE OBRA DIRETA											
		Topógrafo											
		Auxiliar de topografia											
		Pedreiro					20						
		Ajudante Geral					25						
		Calceteiro											
		Carpinteiro					3						
		Operador de Motosserra											
		Motorista											
		Montador											
		Montador/Eletricista											
		Eletricista											
		Operador de Patrol											
		Operador de Escavadeira					1						
		Operador de Pá carregadeira											
		Motorista de caçamba					1						
		Pintor											
		Armador					2						
		Hh DO DIA											
		RESUMO DO EFETIVO											
		EFETIVO DO DIA											
		JORNADA DE TRABALHO											
		Hh DO DIA											
		Hh ACUMULADO											
		EFETIVO EQUIPAMENTOS											
		TIPO					QTDE.						
		Veículo Leve											
		Caminhão Muncck											
		Caminhão Toco											
		Escavadeira											
		Pá carregadeira											
		Caçamba											
		Patrol											
		PC 200											
		Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 26/12/2023		Data: 26/12/2023											



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				28/12/2023							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023				RDO: 113				
CATEGORIA				QTDE								
MÃO DE OBRA INDIRETA				MÃO DE OBRA DIRETA								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva sl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro				1				
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA				Tec. de Segurança								
EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS				Aux Adm				1				
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO				Mestre de obra				1				
EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS				Encarregado geral								
EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA												
INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME												
EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL												
TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO												
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO												
Hh DO DIA												
Hh DO DIA												
RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 28/12/2023				Data: 28/12/2023								



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		29/12/2023							X
		S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 114		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO		MÃO DE OBRA INDIRETA							
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajudante Geral 25 Calceteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 1 Pintor Armador 2 Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
		OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS					
		TIPO				QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 29/12/2023		Data: 29/12/2023							



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
					30/12/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR			ELETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 178/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			RDO: 115						
Condições Climáticas:		Manhã: (1)			Tarde: (1)			Noite: ()			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA						
					MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS			Gerente de Obra						
					Engenheiro						
					Tec. de Segurança						
					Aux Adm						
					Mestre de obra						
					Encarregado geral						
					Hh DO DIA						
					MÃO DE OBRA DIRETA						
					Topógrafo						
					Auxiliar de topografia						
					Pedreiro						
					Ajudante Geral						
					Calceiteiro						
					Carpinteiro						
					Operador de Motosserra						
					Motorista						
					Montador						
					Montador/Eletricista						
					Eletricista						
					Operador de Patrol						
					Operador de Escavadeira						
					Operador de Pá carregadeira						
					Motorista de caçamba						
					Pintor						
					Armador						
					Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hh DO DIA						
					Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO						
					QTDE.						
					Veículo Leve						
					Caminhão Muncck						
					Caminhão Toco						
					Escavadeira						
					Pá carregadeira						
					Caçamba						
					Patrol						
					PC 200						
					Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 30/12/2023		Data: 30/12/2023									



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				31/12/2023						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 178/2023		RDO: 118				CATEGORIA						
Condições Climáticas:		Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				Gerente de Obra						
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Calceiteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Armador						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QTDE.						
						Veículo Leve						
						Caminhão Muncck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 31/12/2023		Data: 31/12/2023										



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
						01/01/2024								X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ															
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR															
CONTRATO Nº 178/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023				RDO: 117				EFETIVO PESSOAL			
CATEGORIA															
QTDE															
MÃO DE OBRA INDIRETA															
Gerente de Obra															
Engenheiro															
Tec. de Segurança															
Aux Adm															
Mestre de obra															
Encarregado geral															
Hh DO DIA															
MÃO DE OBRA DIRETA															
Topografo															
Auxiliar de topografia															
Pedreiro															
Ajudante Geral															
Calceteiro															
Carpinteiro															
Operador de Motosserra															
Motorista															
Montador															
Montador/Eletricista															
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor															
Armador															
Hh DO DIA															
RESUMO DO EFETIVO															
EFETIVO DO DIA															
JORNADA DE TRABALHO															
Hh DO DIA															
Hh ACUMULADO															
EFETIVO EQUIPAMENTOS															
TIPO															
QTDE.															
Veículo Leve															
Caminhão MuncK															
Caminhão Toco															
Escavadeira															
Pá carregadeira															
Caçamba															
Patrol															
PC 200															
Placa Vibratória															
SIMBOLOGIA															
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()															
1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.															
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS															
FERIADO NACIONAL SEM SERVIÇOS															
CONSIDERAÇÕES															
OBSERVAÇÕES															
GERENTE DE OBRA:								FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/01/2024								Data: 01/01/2024							


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3





		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data		X						
						02/01/2024		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N° 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023 RDO: 118		EFETIVO PESSOAL												
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE								
		MÃO DE OBRA INDIRETA												
		Gerente de Obra												
		Engenheiro 1												
		Tec. de Segurança												
		Aux Adm 1												
		Mestre de obra 1												
		Encarregado geral												
		Hh DO DIA												
		MÃO DE OBRA DIRETA												
		Topografo												
		Auxiliar de topografia												
		Pedreiro 20												
		Ajudante Geral 25												
		Calceteiro												
		Carpinteiro 3												
		Operador de Motosserra												
		Motorista												
		Montador												
		Montador/Eletricista												
		Eletricista												
		Operador de Patrol												
		Operador de Escavadeira 1												
		Operador de Pé carregadeira												
		Motorista de caçamba 1												
		Pintor												
		Armador 2												
		Hh DO DIA												
		RESUMO DO EFETIVO												
		EFETIVO DO DIA												
		JORNADA DE TRABALHO												
		Hh DO DIA												
		Hh ACUMULADO												
		EFETIVO EQUIPAMENTOS												
		TIPO				QTDE.								
		Veículo Leve												
		Caminhão Munck												
		Caminhão Toco												
		Escavadeira												
		Pé carregadeira												
		Caçamba												
		Patrol												
		PC 200												
		Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 02/01/2024		Data: 02/01/2024												


SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS
 EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
 EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
 EXECUÇÃO DE CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS
 EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA
 INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME
 EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO
 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



 Data: 02/01/2024
 RNP: 24.091.044.13-11


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																			
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				03/01/2024																			
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023				<table border="1"> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>							S	T	Q	Q	S	S	D	X					
S	T	Q	Q	S	S	D	X																		
CONTRATO N° 178/2023		RDO: 119				EFETIVO PESSOAL																			
Condições Climáticas:		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA																			
SIMBOLOGIA		Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				QTDE																			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO						MÃO DE OBRA INDIRETA																			
						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral																			
						MÃO DE OBRA DIRETA																			
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajudante Geral 25 Calceteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 1 Pintor Armador 2																			
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO																			
						EFETIVO DO DIA																			
						JORNADA DE TRABALHO																			
						Hh DO DIA																			
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS																			
						TIPO																			
						Veículo Leve																			
						Caminhão Muncck																			
						Caminhão Toco																			
						Escavadeira																			
						Pá carregadeira																			
						Caçamba																			
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:																			
Data: 03/01/2024						Data: 03/01/2024																			



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 DANIEL
 CPF: 030.441.100-00
 RNP: 24.504.44.1000-00


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 178/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 120						04/01/2024											
						S	T	Q	Q	S	S	D	X				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						EFETIVO PESSOAL											
SIMBOLOGIA						CATEGORIA				QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO						MÃO DE OBRA INDIRETA											
						Gerente de Obra											
						Engenheiro											
						Tec. de Segurança											
						Aux Adm											
						Mestre de obra											
						Encarregado geral											
						Hh DO DIA											
						MÃO DE OBRA DIRETA											
						Topógrafo											
						Auxiliar de topografia											
						Pedreiro											
						Ajudante Geral											
						Calceteiro											
						Carpinteiro											
						Operador de Motosserra											
						Motorista											
						Montador											
						Montador/Eletricista											
						Eletricista											
						Operador de Patrol											
						Operador de Escavadeira											
						Operador de Pé carregadeira											
						Motorista de caçamba											
						Pintor											
						Armador											
						Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO											
						EFETIVO DO DIA											
						JORNADA DE TRABALHO											
						Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS											
						TIPO				QTDE.							
						Veículo Leve											
						Caminhão Munck											
						Caminhão Toco											
						Escavadeira											
						Pé carregadeira											
Caçamba																	
Patrol																	
PC 200																	
Placa Vibratória																	
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:											
Data: 04/01/2024						Data: 04/01/2024											



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 24/01/2024

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
						05/01/2024							X			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR		CONTRATO Nº 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 121		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		CATEGORIA				QTDE				
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva cf cond. Trab.		3- Chuva sf cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra		Engenheiro		1		Tec. de Segurança								
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO		Aux Adm		1		Mestre de obra				1						
		Encarregado geral														
		Hh DO DIA														
		MÃO DE OBRA DIRETA		Topografo												
		Auxiliar de topografia														
		Pedreiro		20												
		Ajudante Geral		25												
		Calceteiro														
		Carpinteiro		3												
		Operador de Motosserra														
Motorista																
Montador																
Montador/Eletricista																
Eletricista																
Operador de Patrol																
Operador de Escavadeira		1														
Operador de Pá carregadeira																
Motorista de caçamba		1														
Pintor																
Armador		2														
Hh DO DIA																
RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA														
JORNADA DE TRABALHO																
Hh DO DIA																
Hh ACUMULADO																
EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO		QTDE.												
Veículo Leve																
Caminhão Munck																
Caminhão Toco																
Escavadeira																
Pá carregadeira																
Caçamba																
Patrol																
PC 200																
Placa Vibratória																
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:		Data: 05/01/2024		Data: 05/01/2024										



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						08/01/2024						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 122		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA					QTDE					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		Gerente de Obra										
		Engenheiro										
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral										
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topógrafo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro										
		Ajudante Geral										
		Calçeteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
		Armador										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO					QTDE.					
		Veículo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 08/01/2024		Data: 08/01/2024										



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
						07/01/2024									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR						CATEGORIA				QTDE					
CONTRATO N° 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023		RDO: 123		MÃO DE OBRA INDIRETA									
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()									
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										Gerente de Obra			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												Engenheiro			
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS												Tec. de Segurança			
												Aux Adm			
												Mestre de obra			
												Encarregado geral			
												Hh DO DIA			
												Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES												RESUMO DO EFETIVO			
												EFETIVO DO DIA			
												JORNADA DE TRABALHO			
												Hh DO DIA			
												Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES												EFETIVO EQUIPAMENTOS			
												TIPO			
												QTDE.			
												Veículo Leve			
												Caminhão Muncck			
												Caminhão Toco			
												Escavadeira			
												Pá carregadeira			
												Caçamba			
												Patrol			
												PC 200			
										Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 07/01/2024				Data: 07/01/2024											



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
						08/01/2024								x	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO N° 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023		RDO: 124		CATEGORIA				QTDE					
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva s/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA				Engenheiro				1					
		EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS				Tec. de Segurança									
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS				Aux Adm				1					
		EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA				Mestre de obra				1					
INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME		TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO				Encarregado geral									
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS													
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO						Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA									
						Topografo									
OBSERVAÇÕES						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro				20					
GERENTE DE OBRA:						Ajudante Geral				25					
						Calceteiro									
FISCALIZAÇÃO:						Carpinteiro				3					
						Operador de Motosserra									
Data: 08/01/2024						Motorista									
						Montador									
Data: 08/01/2024						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Patrol									
						Operador de Escavadeira				1					
						Operador de Pá carregadeira									
						Motorista de caçamba				1					
						Pintor									
						Armador				2					
RESUMO DO EFETIVO						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
EFETIVO EQUIPAMENTOS						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
TIPO						Veículo Leve									
						Caminhão Muncck									
QTDE.						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Rua 24 de Abril, 444 - Santa Luzia - SP

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				09/01/2024											
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023				RDO: 125											
Condições Climáticas:		Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA				MÃO DE OBRA DIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO						Gerente de Obra				Engenheiro				1			
						Tec. de Segurança				Aux Adm				Mestre de obra			
						Encarregado geral											
						Hh DO DIA											
						MÃO DE OBRA DIRETA											
						Topografo											
						Auxiliar de topografia											
						Pedreiro				20							
						Ajudante Geral				25							
						Calceteiro											
						Carpinteiro				3							
						Operador de Motosserra											
						Motorista											
						Montador											
						Montador/Eletricista											
						Eletricista											
						Operador de Patrol											
						Operador de Escavadeira				1							
						Operador de Pá carregadeira											
						Motorista de caçamba				1							
						Pintor											
						Armador				2							
						Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO											
						EFETIVO DO DIA											
						JORNADA DE TRABALHO											
						Hh DO DIA											
						Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS											
						TIPO				QTDE.							
						Veículo Leve											
						Caminhão Muncck											
						Caminhão Toco											
						Escavadeira											
						Pá carregadeira											
						Caçamba											
						Patrol											
						PC 200											
						Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:											
Data: 09/01/2024						Data: 09/01/2024											



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



 Daniel
 Engenheiro Civil
 RNP 24101414141414

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						10/01/2024							S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 126		EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.		CATEGORIA					QTDE						
		MÃO DE OBRA INDIRETA											
		Gerente de Obra											
		Engenheiro											
		Tec. de Segurança											
		Aux Adm											
		Mestre de obra											
		Encarregado geral											
		Hh DO DIA											
		MÃO DE OBRA DIRETA											
		Topografo											
		Auxiliar de topografia											
		Pedreiro											
		Ajudante Geral											
		Calceteiro											
		Carpinteiro											
		Operador de Motosserra											
		Motorista											
		Montador											
		Montador/Eletricista											
		Eletricista											
		Operador de Patrol											
		Operador de Escavadeira											
		Operador de Pá carregadeira											
		Motorista de caçamba											
		Pintor											
		Armador											
		Hh DO DIA											
		RESUMO DO EFETIVO											
		EFETIVO DO DIA											
		JORNADA DE TRABALHO											
		Hh DO DIA											
		Hh ACUMULADO											
		EFETIVO EQUIPAMENTOS											
		TIPO					QTDE.						
		Veículo Leve											
		Caminhão Munck											
		Caminhão Toco											
		Escavadeira											
		Pá carregadeira											
		Caçamba											
		Patrol											
		PC 200											
		Placa Vibratória											
		Hh DO DIA											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 10/01/2024		Data: 10/01/2024											



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Data: 10/01/2024
 Hora: 14:59:44

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data		X			
						12/01/2024	S	T	Q	Q	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N° 178/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023 RDO: 128		EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA					QTDE				
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA									
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO		Engenheiro									
		Tec. de Segurança									
		Aux Adm									
		Mestre de obra									
		Encarregado geral									
		Hh DO DIA									
		MÃO DE OBRA DIRETA									
		Topografo									
		Auxiliar de topografia									
		Pedreiro									
Ajudante Geral											
Calceteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pé carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Armador											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO									
		EFETIVO DO DIA									
		JORNADA DE TRABALHO									
		Hh DO DIA									
		Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO					QTDE.				
		Veículo Leve									
		Caminhão MuncK									
		Caminhão Toco									
		Escavadeira									
		Pé carregadeira									
		Caçamba									
		Patrol									
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 12/01/2024		Data: 12/01/2024									


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data		X						
		13/01/2024		S	T	Q	Q	S	S	D
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 178/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 063/2023 RDO: 129		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE			
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Armador						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão MuncK						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 13/01/2024		Data: 13/01/2024								



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				15/01/2024											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				X											
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				S T Q Q S S D											
CONTRATO Nº 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023				RDO: 131							
Condições Climáticas:				Manhã: (1)				Tarde: (1)				Noite: ()			
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom				2 - Chuva e/ cond. Trab.				3- Chuva s/ cond. Trab.			
				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
				MÃO DE OBRA INDIRETA											
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 15/01/2024				Data: 15/01/2024											
<p>EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA</p> <p>EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS</p> <p>EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</p> <p>EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS</p> <p>EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA</p> <p>INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME</p> <p>TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO</p> <p>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</p> <p>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO</p>				<p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Tec. de Segurança</p> <p>Aux Adm 1</p> <p>Mestre de obra 1</p> <p>Encarregado geral</p>				<p>Hh DO DIA</p>							
CONSIDERAÇÕES				<p>Topografo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro 20</p> <p>Ajudante Geral 25</p> <p>Calceteiro</p> <p>Carpinteiro 3</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motorista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Patrol</p> <p>Operador de Escavadeira 1</p> <p>Operador de Pá carregadeira</p> <p>Motorista de caçamba 1</p> <p>Pinor</p> <p>Armador 2</p>				<p>Hh DO DIA</p>							
OBSERVAÇÕES				<p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Munk</p> <p>Caminhão Toco</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pá carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p> <p>Placa Vibratória</p>				<p>Hh DO DIA</p>							


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

[Handwritten Signature]


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data 16/01/2024							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR						EFETIVO PESSOAL							
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CONTRATO N° 176/2023 1-Tempo Bom	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023 2 - Chuva c/ cond. Trab.	RDO: 132 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 20							
						Ajudante Geral 25							
						Calceteiro							
						Carpinteiro 3							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira 1													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba 1													
Pintor													
Armador 2													
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
Hh ACUMULADO													
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTDE.							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
		Pá carregadeira											
Caçamba													
Patrol													
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 16/01/2024						Data: 16/01/2024							



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3


Manoel
CPF: 24.086.341/0001-11


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
					17/01/2024		S	T	X	Q	Q
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR											
CONTRATO Nº 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 133	CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO					Gerente de Obra						
					Engenheiro						
Tec. de Segurança											
Aux Adm							1				
Mestre de obra							1				
Encarregado geral											
Hh DO DIA											
					MÃO DE OBRA DIRETA						
					Topógrafo						
Auxiliar de topografia											
Pedreiro							20				
Ajudante Geral							25				
Calçeteiro											
Carpinteiro							3				
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira							1				
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba							1				
Pintor											
Armador							2				
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hh DO DIA						
					Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO		QTDE.				
					Veículo Leve						
					Caminhão Munck						
					Caminhão Toco						
					Escavadeira						
					Pá carregadeira						
					Caçamba						
					Patrol						
					PC 200						
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/01/2024				Data: 17/01/2024							


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Data: 17/01/2024

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
					18/01/2024						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR			EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023			RDO: 134		CATEGORIA			QTDE	
Condições Climáticas:		Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro							1		
		Téc. de Segurança									
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO		Aux Adm							1		
		Mestre de obra							1		
		Encarregado geral									
		Hh DO DIA									
		MÃO DE OBRA DIRETA									
		Topografo									
		Auxiliar de topografia									
		Pedreiro							20		
		Ajudante Geral							25		
		Calceteiro									
		Carpinteiro							3		
		Operador de Motosserra									
		Motorista									
		Montador									
		Montador/Eletricista									
		Eletricista									
		Operador de Patrol									
		Operador de Escavadeira							1		
		Operador de Pá carregadeira									
		Motorista de caçamba							1		
		Pintor									
		Armador							2		
		Hh DO DIA									
		RESUMO DO EFETIVO									
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DO DIA									
		JORNADA DE TRABALHO									
		Hh DO DIA									
		Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO							QTDE.		
		Veículo Leve									
		Caminhão Muncck									
		Caminhão Toco									
		Escavadeira									
		Pá carregadeira									
		Caçamba									
		Patrol									
		PC 200									
		Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/01/2024				Data: 18/01/2024							


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data					X		
19/01/2024	S	T	Q	Q	S	S	D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR

CONTRATO Nº 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 135

Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()

SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
 EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
 EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
 EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA
 INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO
 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA	QTDE
-----------	------

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	1
Mestre de obra	1
Encarregado geral	
Hh DO DIA	

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Padreiro	20
Ajudante Geral	25
Calceteiro	
Carpinteiro	3
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	1
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	1
Pintor	
Armador	2
Hh DO DIA	

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
 JORNADA DE TRABALHO
 Hh DO DIA
 Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES


EFETIVO EQUIPAMENTOS


TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Muncck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:
 Data: 19/01/2024

FISCALIZAÇÃO:
 Data: 19/01/2024


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data									
			20/01/2024									
			S	T	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N° 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023 RDD: 136			EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA QTDE <hr/> MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral <hr/> Hh DO DIA									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA DIRETA									
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS			Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pé carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador									
			RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO									
			EFETIVO EQUIPAMENTOS									
			TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pé carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória									
			CONSIDERAÇÕES 			RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
			OBSERVAÇÕES 			RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
			GERENTE DE OBRA: Data: 20/01/2024			FISCALIZAÇÃO: Data: 20/01/2024						



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



 FISCALIZAÇÃO
 DATA: 20/01/2024

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						21/01/2024								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR						CATEGORIA								
CONTRATO N° 178/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023		RDO: 137		QTDE								
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro								
						Tec. de Segurança								
						Aux Adm								
						Mestre de obra								
						Encarregado geral								
						Hh DO DIA								
						MÃO DE OBRA DIRETA								
						Topografo								
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro								
						Ajudante Geral								
						Calçeteiro								
						Carpinteiro								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
						Montador/Eletricista								
						Eletricista								
						Operador de Patrol								
						Operador de Escavadeira								
						Operador de Pá carregadeira								
						Motorista de caçamba								
						Pintor								
						Armador								
						Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
						Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO								
						QTDE.								
						Veículo Leve								
						Caminhão Muncck								
						Caminhão Toco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
						Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:								
Data: 21/01/2024						Data: 21/01/2024								



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data 22/01/2024 <table border="1"> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td><td></td></tr> </table>							X									S	T	Q	Q	S	S	D		
	X																											
S	T	Q	Q	S	S	D																						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N° 178/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023 RDO: 138				EFETIVO PESSOAL																								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE																					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO				MÃO DE OBRA INDIRETA																								
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA																								
				MÃO DE OBRA DIRETA																								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 20 Ajudante Geral 25 Calceteiro Carpinteiro 3 Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 1 Pintor Armador 2 Hh DO DIA																								
				RESUMO DO EFETIVO																								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200	
TIPO	QTDE.																											
Veículo Leve																												
Caminhão Munck																												
Caminhão Toco																												
Escavadeira																												
Pá carregadeira																												
Caçamba																												
Patrol																												
PC 200																												
Placa Vibratória																												
GERENTE DE OBRA: Data: 22/01/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 22/01/2024																								



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						23/01/2024	S	T	Q	Q	S	S	D	
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
		OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR												
		CONTRATO Nº 178/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 139					CATEGORIA		QTDE	
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										Gerente de Obra		
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										Engenheiro		1
		EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA										Tec. de Segurança		
		EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS										Aux Adm		1
		EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO										Mestre de obra		1
		EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS										Encarregado geral		
		EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA												
		TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO												
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO												
		Hh DO DIA												
		MÃO DE OBRA DIRETA										Topografo		
												Auxiliar de topografia		
												Pedreiro		20
												Ajudante Geral		25
												Calçeteiro		
												Carpinteiro		3
												Operador de Motosserra		
												Motorista		
												Montador		
												Montador/Eletricista		
												Eletricista		
												Operador de Patrol		
												Operador de Escavadeira		1
												Operador de Pá carregadeira		
												Motorista de caçamba		1
												Pintor		
												Armador		2
		Hh DO DIA												
		RESUMO DO EFETIVO										EFETIVO DO DIA		
												JORNADA DE TRABALHO		
												Hh DO DIA		
												Hh ACUMULADO		
		OBSERVAÇÕES										EFETIVO EQUIPAMENTOS		
												TIPO		QTDE.
												Veículo Leve		
												Caminhão MuncK		
												Caminhão Toco		
												Escavadeira		
												Pá carregadeira		
												Caçamba		
												Patrol		
												PC 200		
												Placa Vibratória		
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:									
Data: 23/01/2024					Data: 23/01/2024									



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 FISCALIZAÇÃO
 Data: 23/01/2024


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						24/01/2024							S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023		RDO: 140		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO						Engenheiro 1							
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm 1							
						Mestre de obra 1							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 20							
						Ajudante Geral 25							
						Calceteiro							
						Carpinteiro 3							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira 1									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba 1									
				Pintor									
				Armador 2									
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/01/2024						Data: 24/01/2024							



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data: 25/01/2024 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>X</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td></tr> </table>							S	T	Q	Q	X	S	S	D
S	T	Q	Q	X	S	S	D												
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO N° 178/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023 RDO: 141		EFETIVO PESSOAL		CATEGORIA		QTDE													
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA		Gerente de Obra															
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro		1													
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO				Tec. de Segurança															
				Aux Adm		1													
				Mestre de obra		1													
				Encarregado geral															
				Hh DO DIA															
				MÃO DE OBRA DIRETA															
				Topografo															
				Auxiliar de topografia															
				Pedreiro		20													
				Ajudante Geral		25													
				Calceiteiro															
				Carpinteiro		3													
				Operador de Motosserra															
				Motorista															
				Montador															
				Montador/Eletricista															
				Eletricista															
				Operador de Patrol															
				Operador de Escavadeira		1													
				Operador de Pá carregadeira															
				Motorista de caçamba		1													
				Pintor															
				Armador		2													
				Hh DO DIA															
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO															
				EFETIVO DO DIA															
				JORNADA DE TRABALHO															
				Hh DO DIA															
				Hh ACUMULADO															
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS															
				TIPO		QTDE.													
				Veículo Leve															
				Caminhão Muncck															
				Caminhão Toco															
				Escavadeira															
				Pá carregadeira															
				Caçamba															
				Patrol															
				PC 200															
				Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																	
Data: 25/01/2024		Data: 25/01/2024																	



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Rafael de Jesus
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data									
			28/01/2024									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR			EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO N° 178/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023 RDO: 142			CATEGORIA				QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf/ cond. Trab. 3- Chuva sf/ cond. Trab.			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO			Gerente de Obra									
			Engenheiro							1		
			Tec. de Segurança									
			Aux Adm							1		
			Mestre de obra							1		
			Encarregado geral									
			Hh DO DIA									
			MÃO DE OBRA DIRETA									
			Topografo									
			Auxiliar de topografia									
			Pedreiro							20		
			Ajudante Geral							25		
			Calçeteiro									
			Carpinteiro							3		
			Operador de Motosserra									
			Motorista									
			Montador									
			Montador/Eletricista									
			Eletricista									
			Operador de Patrol									
			Operador de Escavadeira							1		
			Operador de Pá carregadeira									
Motorista de caçamba							1					
Pintor												
Armador							2					
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO									
			EFETIVO DO DIA									
			JORNADA DE TRABALHO									
			Hh DO DIA									
			Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS									
			TIPO				QTDE.					
			Veículo Leve									
			Caminhão Muncck									
			Caminhão Toco									
			Escavadeira									
			Pá carregadeira									
			Caçamba									
			Patrol									
			PC 200									
			Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:									
Data: 28/01/2024			Data: 28/01/2024									



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



 FISCALIZAÇÃO
 Engenheiro Civil

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				27/01/2024									
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 063/2023				RDO: 143									
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()					EFETIVO PESSOAL				
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA		QTDE		
MÃO DE OBRA INDIRETA															
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										Gerente de Obra			
												Engenheiro			
												Tec. de Segurança			
												Aux Adm			
												Mestre de obra			
												Encarregado geral			
												Hh DO DIA			
												MÃO DE OBRA DIRETA			
												Topografo			
										Auxiliar de topografia					
										Pedreiro					
										Ajudante Geral					
										Calçeteiro					
										Carpinteiro					
										Operador de Motosserra					
										Motorista					
										Montador					
										Montador/Eletricista					
										Eletricista					
										Operador de Patrol					
										Operador de Escavadeira					
										Operador de Pá carregadeira					
										Motorista de caçamba					
										Pintor					
										Armador					
										Hh DO DIA					
CONSIDERAÇÕES												RESUMO DO EFETIVO			
												EFETIVO DO DIA			
												JORNADA DE TRABALHO			
												Hh DO DIA			
												Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES												EFETIVO EQUIPAMENTOS			
												TIPO		QTDE.	
												Veículo Leve			
												Caminhão Muncck			
												Caminhão Toco			
												Escavadeira			
												Pá carregadeira			
												Caçamba			
												Patrol			
										PC 200					
										Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:													
Data: 27/01/2024		Data: 27/01/2024													



 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							X	
						28/01/2024								S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR		CONTRATO N° 178/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023		RDO: 144		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		CATEGORIA				QTDE		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
								MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO						
								EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS						
								TIPO Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 28/01/2024		Data: 28/01/2024												


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data													
						29/01/2024							X						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR		CONTRATO N° 178/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023		RDO: 145		EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		CATEGORIA											
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		QTDE											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO										MÃO DE OBRA INDIRETA			Gerente de Obra				1		
										Téc. de Segurança									
Aux Adm							1												
Mestre de obra							1												
Encarregado geral																			
Hh DO DIA																			
CONSIDERAÇÕES										MÃO DE OBRA DIRETA			Topógrafo						
										Auxiliar de topografia									
Pedreiro							20												
Ajudante Geral							25												
Calçeteiro																			
Carpinteiro							3												
Operador de Motosserra																			
Motorista																			
Montador																			
Montador/Eletricista																			
Eletricista																			
Operador de Patrol																			
Operador de Escavadeira							1												
Operador de Pá carregadeira																			
Motorista de caçamba							1												
Pintor																			
Armador							2												
Hh DO DIA																			
OBSERVAÇÕES										RESUMO DO EFETIVO			EFETIVO DO DIA						
										JORNADA DE TRABALHO									
Hh DO DIA																			
Hh ACUMULADO																			
EFETIVO EQUIPAMENTOS										TIPO			QTDE.						
										Veículo Leve									
Caminhão Munck																			
Caminhão Toco																			
Escavadeira																			
Pá carregadeira																			
Caçamba																			
Patrol																			
PC 200																			
Placa Vibratória																			
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:														
Data: 29/01/2024					Data: 29/01/2024														


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				30/01/2024						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 176/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023 RDO: 146				CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO				Engenheiro			1			
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm			1			
				Mestre de obra			1			
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro			20			
				Ajudante Geral			25			
				Calceteiro						
				Carpinteiro			3			
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira			1			
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba			1			
				Pintor						
				Armador			2			
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 30/01/2024				Data: 30/01/2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data		x						
						31/01/2024		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 178/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 RDO: 147		EFETIVO PESSOAL												
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA												
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRANSPORTE COM CAMINHÃO MATERIAL INTERNO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO		Gerente de Obra												
		Engenheiro 1												
		Tec. de Segurança												
		Aux Adm 1												
		Mestre de obra 1												
		Encarregado geral												
		Hh DO DIA												
		MÃO DE OBRA DIRETA												
Topógrafo														
Auxiliar de topografia														
Pedreiro 20														
Ajudante Geral 25														
Calceteiro														
Carpinteiro 3														
Operador de Motosserra														
Motorista														
Montador														
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira 1														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba 1														
Pintor														
Armador 2														
Hh DO DIA														
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO												
		EFETIVO DO DIA												
		JORNADA DE TRABALHO												
		Hh DO DIA												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS												
		TIPO												
		Veículo Leve												
		Caminhão Munck												
		Caminhão Toco												
		Escavadeira												
		Pá carregadeira												
		Caçamba												
		Patrol												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 31/01/2024		Data: 31/01/2024												


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

