



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 215-2022

EMPENHO: 45 / 2024

Data do Empenho: 26/01/2024

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: 4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25 Complemento: CASA
Bairro: CONTORNO Cidade: Estado:
CNPJ: 19.650.110/0001-27 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 39975113-4 Agência: 0001 Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1001.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 365 - Educação Infantil
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Regime Diferenciado de Contratação Pública - RC	Nº Lic.:	008-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	255-2022	471.000,00	117.391,65	353.608,35
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. CONTRATO 255-2020, LICITAÇÃO 008-2022RDC. OBRA 047/2022. MEDIÇÃO Nº 11. PERÍODO 13/01/2024 A 26/01/2024. NF 20243.

Data do Empenho: 26/01/2024

Data do Liquidação: 26/01/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.007	IRRF - Fonte 1540	1.408,70
2.1.8.8.1.01.08.00.00.007	ISS - Fonte 1540	3.521,75
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	7.747,85
## Cento e quatro mil e setecentos e treze reais e trinta e cinco centavos ##		Valor Retido 12.678,30
		Valor Líquido 104.713,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/01/2024	20243	U			117.391,65

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	117.391,65

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 26/01/2024.

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Educação
Matrícula: 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 26/01/2024, podendo efetuar o pagamento.

WALDSON LOPES DE GÓES FILHO
Contador(a)
CPF: 024.127.355-22

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 19/02/24

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 215-2022

EMPENHO: 45 / 2024 Data do Empenho: **26/01/2024** TIPO DO EMPENHO: **Ordinário/Normal**

FORNECEDOR

Nome: 4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25	Complemento: CASA
Bairro: CONTORNO	Cidade: Estado:
CNPJ: 19.650.110/0001-27 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 39975113-4 Agência: 0001	Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1001.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 365 - Educação Infantil
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RL	Nº Lic.: 008-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 255-2022	471.000,00	117.391,65	353.608,35
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONTRATO Nº255-2022, LICITAÇÃO Nº008-2022RDC.

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	UND	1	117.391,65	117.391,65

Cento e dezessete mil e trezentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos

117.391,65

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 26/01/2024.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 26/01/2024

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Educação
Matrícula: 0598

WALDSON LOPES DE GÓES FILHO
Contador(a)
CPF: 024.127.355-22





PREFEITURA DE
QUEIMADAS
FLOR PRIMEIRA DO SISAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20243**
Data da Competência: **Janeiro/2024**
Data e Hora da Emissão: **26/01/2024 22:04:00**
Código Verificação: **BDC8AF5DB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.650.110/0001-27** Inscrição Municipal: **154100189**
Telefone: **753644155...** Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** Nome Fantasia: *********
Endereço: **RUA ALTO DA CHACRINHA N° 25 BAIRRO CENTRO CIDADE: QUEIMADAS - BA**
E-mail: **ARCOCONSTRUCOESEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM**



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13807870000119** Inscrição Municipal:
Telefone: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**
Endereço: **AV GETULIO VARGAS N° SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000**
E-mail: **secretariafinancas2021@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO N° 255/2022, SENDO 60 % SERVIÇOS (R\$ 70.434,99) E 40 % MATERIAIS (R\$ 46.956,66) PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 215/2022 NUMERO DA OBRA 047/2022 PERÍODO 12/01/2024 A 26/01/2024 BM 11

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 26/01/24 *Tony Felix*
Assinatura
Tony Felix
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.038.677.8

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 117.391,65

CNAE - 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG



VALOR SERVIÇOS: R\$ 117.391,65	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 70.434,99	DESC. INCOND: BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00 R\$ 46.956,66	ALÍQUOTA: 5%	VALOR ISS: R\$ 0,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 2.347,83	DESC. COND: R\$ 0,00
VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 7.747,85	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 107.295,97

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS


EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO EIRELI	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO SANTALUZ - BA	LOCAL INCIDÊNCIA SANTALUZ - BA	ISS Retido Sim
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	-----------------------------------	-------------------

Observação:

- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19



À
Prefeitura Municipal de Santaluz/BA
Av. Getulio Vargas s/n
Centro
CEP 48880-000 – Santaluz/BA
13.807.870/0001-19



Prezado (s) Senhor(es):

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

NOTA FISCAL Nº 20243 de 26 de janeiro de 2024
DE NOSSA EMISSÃO

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação	Código	Especificação	Código	Especificação
01	Razão Social	x 14	Descrição dos Serviços	27	Termo de Isenção do IPI
02	Endereço	15	Preço Total	28	Termo de Isenção do ICMS
03	Município	16	Valor do Produto	29	Peso – Bruto/Líquido
04	Estado	17	Classificação Fiscal	30	Volumes – Marca/Num/Quant
05	Nº de Inscrição no CNPJ/MF	18	Alíquota do IPI	31	Rasuras
06	Nº de Inscrição Estadual	19	Valor do IPI	32	Valor por Extenso
07	Natureza da Operação	20	Base de Cálculo do IPI	33	Nº Documento
08	Código Fiscal da Operação	21	Valor Total da Nota	34	Inclusão de Fornecedor
09	Via de Transporte	22	Alíquota do ICMS	35	VENCIMENTO
10	Data de Emissão	23	Valor do ICMS	36	CEP
11	Data de Saída	24	Base de Cálculo do ICMS	37	TIPO – MÊS/ANO
12	Unidade (produto)	25	Nome do Transportador	38	PRODUTO
13	Quantidade (produto)	26	Endereço do Transportador	39	Valor e percentual do IRRF
				40	Valor e percentual do INSS

CÓDIGO	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	No campo onde se ler: Período 12/01/2024 a 26/01/2024, LER-SE período 13/01/2024 a 26/01/2024

Solicitamos que acusem o recebimento desta cópia que a acompanha, devendo a via de V.S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Queimadas/BA, 19 de fevereiro de 2024


ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:19.650.110/0001-27

Fabio da Silva Oliveira
Sócio Administrador



Tony Felix Andrade

Engenheiro Civil

CREA-BA: 052.069.677.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 End.: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000
 19.650.110/0001-27

CONTRATO: 255/2022
 P. ADM: 215/2022
 N DA OBRA: 047/2022



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022
 MODALIDADE – RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
 TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL
 OBJETO – Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção da Creche de Várzea da Pedra, no Município de Santaluz -Ba

B.D.I.
 23,54%

PERÍODO: 13/01/2024 A 26/01/2024

PLANILHA DE MEDIÇÃO						MEDIÇÃO 11		ACUMULADO		SALDO		%
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m²	6,00	R\$ 416,49	R\$ 2.498,94		R\$ -	6,00	R\$ 2.498,94	0,00	R\$ -	100%
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	320,00	R\$ 86,42	R\$ 27.654,40		R\$ -	320,00	R\$ 27.654,40	0,00	R\$ -	100%
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.398,76	R\$ 1.398,76		R\$ -	1,00	R\$ 1.398,76	0,00	R\$ -	100%
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.096,31	R\$ 1.096,31		R\$ -	1,00	R\$ 1.096,31	0,00	R\$ -	100%
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 809,66	R\$ 809,66		R\$ -	1,00	R\$ 809,66	0,00	R\$ -	100%
1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,52	R\$ 1.149,04	R\$ 2.895,58		R\$ -	2,52	R\$ 2.895,58	0,00	R\$ -	100%
1.7	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20,00	R\$ 1.312,27	R\$ 26.245,40		R\$ -	20,00	R\$ 26.245,40	0,00	R\$ -	100%
1.9	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	891,68	R\$ 6,80	R\$ 6.063,42		R\$ -	891,68	R\$ 6.063,42	0,00	R\$ -	100%
1.10	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	1575,00	R\$ 0,23	R\$ 362,25		R\$ -	1575,00	R\$ 362,25	0,00	R\$ -	100%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							0,00				
2.1	EDIFICAÇÃO							0,00				
2.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	713,77	R\$ 105,08	R\$ 75.002,95		R\$ -	713,77	R\$ 75.002,95	0,00	R\$ -	100%
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	174,70	R\$ 89,52	R\$ 15.639,14		R\$ -	174,70	R\$ 15.639,14	0,00	R\$ -	100%
2.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	93,47	R\$ 8,12	R\$ 758,98		R\$ -	93,47	R\$ 758,98	0,00	R\$ -	100%
2.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	129,38	R\$ 41,63	R\$ 5.386,09		R\$ -	129,38	R\$ 5.386,09	0,00	R\$ -	100%
2.2	MURETA E ABRIGO GÁS							0,00				
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	15,68	R\$ 89,52	R\$ 1.403,67		R\$ -	15,68	R\$ 1.403,67	0,00	R\$ -	100%
2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	13,87	R\$ 8,12	R\$ 112,62		R\$ -	13,87	R\$ 112,62	0,00	R\$ -	100%
2.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	11,42	R\$ 41,63	R\$ 475,41		R\$ -	11,42	R\$ 475,41	0,00	R\$ -	100%
2.3	CASTELO D'ÁGUA							0,00				
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,65	R\$ 89,52	R\$ 326,75	3,65	R\$ 326,75	3,65	R\$ 326,75	0,00	R\$ -	100%
2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	4,84	R\$ 8,12	R\$ 39,30	4,84	R\$ 39,30	4,84	R\$ 39,30	0,00	R\$ -	100%
2.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,23	R\$ 41,63	R\$ 51,20	1,23	R\$ 51,20	1,23	R\$ 51,20	0,00	R\$ -	100%
3	FUNDAÇÕES							0,00				
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS							0,00				
3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM - FUNDO DE VALA	m²	46,65	R\$ 34,18	R\$ 1.594,68		R\$ -	46,65	R\$ 1.594,68	0,00	R\$ -	100%
3.1.3	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	m²	131,71	R\$ 168,14	R\$ 22.145,66		R\$ -	131,71	R\$ 22.145,66	0,00	R\$ -	100%

Tony Felix A. ...
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000.077.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 End.: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000
 19.650.110/0001-27

CONTRATO: 255/2022
 P. ADM: 215/2022
 N DA OBRA: 047/2022



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022
 MODALIDADE – RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
 TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL
 OBJETO – Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção da Creche de Várzea da Pedra, no Município de Santaluz -Ba

B.D.I.
 23,54%


PERÍODO: 12/01/2024 A 26/01/2024

PLANILHA DE MEDIÇÃO						MEDIÇÃO 11		ACUMULADO		SALDO		%
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES											
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 416,49	R\$ 2.498,94		R\$ -	6,00	R\$ 2.498,94	0,00	R\$ -	100%
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	320,00	R\$ 86,42	R\$ 27.654,40		R\$ -	320,00	R\$ 27.654,40	0,00	R\$ -	100%
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.398,76	R\$ 1.398,76		R\$ -	1,00	R\$ 1.398,76	0,00	R\$ -	100%
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.096,31	R\$ 1.096,31		R\$ -	1,00	R\$ 1.096,31	0,00	R\$ -	100%
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 809,66	R\$ 809,66		R\$ -	1,00	R\$ 809,66	0,00	R\$ -	100%
1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,52	R\$ 1.149,04	R\$ 2.895,58		R\$ -	2,52	R\$ 2.895,58	0,00	R\$ -	100%
1.7	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20,00	R\$ 1.312,27	R\$ 26.245,40		R\$ -	20,00	R\$ 26.245,40	0,00	R\$ -	100%
1.9	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	891,68	R\$ 6,80	R\$ 6.063,42		R\$ -	891,68	R\$ 6.063,42	0,00	R\$ -	100%
1.10	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	1575,00	R\$ 0,23	R\$ 362,25		R\$ -	1575,00	R\$ 362,25	0,00	R\$ -	100%
								0,00				
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							0,00				
2.1	EDIFICAÇÃO							0,00				
2.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	713,77	R\$ 105,08	R\$ 75.002,95		R\$ -	713,77	R\$ 75.002,95	0,00	R\$ -	100%
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	174,70	R\$ 89,52	R\$ 15.639,14		R\$ -	174,70	R\$ 15.639,14	0,00	R\$ -	100%
2.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	93,47	R\$ 8,12	R\$ 758,98		R\$ -	93,47	R\$ 758,98	0,00	R\$ -	100%
2.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	129,38	R\$ 41,63	R\$ 5.386,09		R\$ -	129,38	R\$ 5.386,09	0,00	R\$ -	100%
								0,00				
2.2	MURETA E ABRIGO GÁS							0,00				
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	15,68	R\$ 89,52	R\$ 1.403,67		R\$ -	15,68	R\$ 1.403,67	0,00	R\$ -	100%
2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	13,87	R\$ 8,12	R\$ 112,62		R\$ -	13,87	R\$ 112,62	0,00	R\$ -	100%
2.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	11,42	R\$ 41,63	R\$ 475,41		R\$ -	11,42	R\$ 475,41	0,00	R\$ -	100%
								0,00				
2.3	CASTELO D'ÁGUA							0,00				
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,65	R\$ 89,52	R\$ 326,75	3,65	R\$ 326,75	3,65	R\$ 326,75	0,00	R\$ -	100%
2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	4,84	R\$ 8,12	R\$ 39,30	4,84	R\$ 39,30	4,84	R\$ 39,30	0,00	R\$ -	100%
2.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,23	R\$ 41,63	R\$ 51,20	1,23	R\$ 51,20	1,23	R\$ 51,20	0,00	R\$ -	100%
								0,00				
3	FUNDAÇÕES							0,00				
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS							0,00				
3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM - FUNDO DE VALA	m²	46,65	R\$ 34,18	R\$ 1.594,68		R\$ -	46,65	R\$ 1.594,68	0,00	R\$ -	100%
3.1.3	FORMA DE MADEIRA EM TABUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	m²	131,71	R\$ 168,14	R\$ 22.145,66		R\$ -	131,71	R\$ 22.145,66	0,00	R\$ -	100%


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.039.677.8

3.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 6.3MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	317,20	R\$	19,21	R\$	6.092,94		R\$	-	317,20	R\$	6.092,94	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.1.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	41,25	R\$	18,03	R\$	743,85		R\$	-	41,25	R\$	743,85	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.1.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 10.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	366,94	R\$	16,11	R\$	5.911,14		R\$	-	366,94	R\$	5.911,14	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.1.7	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 12.5MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	225,00	R\$	13,58	R\$	3.055,77		R\$	-	225,00	R\$	3.055,77	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.1.8	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 5.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	134,38	R\$	20,38	R\$	2.738,12		R\$	-	134,38	R\$	2.738,12	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.1.9	CONCRETO BOMBADO FCK=25 MPA: INCLUSO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	15,55	R\$	680,42	R\$	10.580,53		R\$	-	15,55	R\$	10.580,53	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES																	
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	60,44	R\$	33,31	R\$	2.013,26		R\$	-	60,44	R\$	2.013,26	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.2.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	55,45	R\$	735,61	R\$	40.789,57		R\$	-	55,45	R\$	40.789,57	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	349,55	R\$	90,76	R\$	31.725,16		R\$	-	349,55	R\$	31.725,16	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	660,10	R\$	17,62	R\$	11.630,96		R\$	-	660,10	R\$	11.630,96	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	113,60	R\$	15,65	R\$	1.777,84		R\$	-	113,60	R\$	1.777,84	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,41	R\$	13,11	R\$	346,24		R\$	-	28,41	R\$	346,24	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	356,91	R\$	20,55	R\$	7.334,50		R\$	-	356,91	R\$	7.334,50	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.2.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m²	24,18	R\$	636,71	R\$	15.395,65		R\$	-	24,18	R\$	15.395,65	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA																	
3.3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	35,00	R\$	81,63	R\$	2.857,05	35,00	R\$	2.857,05	35,00	R\$	2.857,05	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.3.2	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5,00	R\$	22,38	R\$	111,90	5,00	R\$	111,90	5,00	R\$	111,90	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	4,84	R\$	33,31	R\$	161,22	4,84	R\$	161,22	4,84	R\$	161,22	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,40	R\$	105,02	R\$	462,09	4,40	R\$	462,09	4,40	R\$	462,09	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,61	R\$	15,65	R\$	1.824,95	116,61	R\$	1.824,95	116,61	R\$	1.824,95	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,78	R\$	13,11	R\$	1.098,36	83,78	R\$	1.098,36	83,78	R\$	1.098,36	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,87	R\$	13,30	R\$	184,47	13,87	R\$	184,47	13,87	R\$	184,47	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.3.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,08	R\$	20,55	R\$	268,79	13,08	R\$	268,79	13,08	R\$	268,79	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.3.9	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	2,42	R\$	645,38	R\$	1.561,82	2,42	R\$	1.561,82	2,42	R\$	1.561,82	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.4	ARRIO DE GAS - BLOCOS																	

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8




3.4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO. DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	17,50	R\$ 144,77	R\$ 2.533,48	R\$ -	17,50	R\$ 2.533,48	0,00	R\$ -	100%
3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,25	R\$ 33,31	R\$ 41,64	R\$ -	1,25	R\$ 41,64	0,00	R\$ -	100%
3.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,00	R\$ 105,02	R\$ 525,10	R\$ -	5,00	R\$ 525,10	0,00	R\$ -	100%
3.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,19	R\$ 20,55	R\$ 209,40	R\$ -	10,19	R\$ 209,40	0,00	R\$ -	100%
3.4.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	0,63	R\$ 645,38	R\$ 406,59	R\$ -	0,63	R\$ 406,59	0,00	R\$ -	100%
3.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME						0,00				
3.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	12,12	R\$ 33,31	R\$ 403,72	R\$ -	12,12	R\$ 403,72	0,00	R\$ -	100%
3.5.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	1,13	R\$ 735,61	R\$ 831,24	R\$ -	1,13	R\$ 831,24	0,00	R\$ -	100%
3.5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	44,47	R\$ 90,76	R\$ 4.036,10	R\$ -	44,47	R\$ 4.036,10	0,00	R\$ -	100%
3.5.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	84,20	R\$ 17,62	R\$ 1.483,60	R\$ -	84,20	R\$ 1.483,60	0,00	R\$ -	100%
3.5.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	3,64	R\$ 645,38	R\$ 2.349,18	R\$ -	3,64	R\$ 2.349,18	0,00	R\$ -	100%
4	SUPERESTRUTURA						0,00				
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES						0,00				
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	333,34	R\$ 63,75	R\$ 21.250,43	R\$ -	333,34	R\$ 21.250,43	0,00	R\$ -	100%
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	839,33	R\$ 16,41	R\$ 13.773,41	R\$ -	839,33	R\$ 13.773,41	0,00	R\$ -	100%
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	312,88	R\$ 13,66	R\$ 4.273,94	R\$ -	312,88	R\$ 4.273,94	0,00	R\$ -	100%
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	450,22	R\$ 22,34	R\$ 10.057,91	R\$ -	450,22	R\$ 10.057,91	0,00	R\$ -	100%
4.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	18,25	R\$ 604,92	R\$ 11.039,79	R\$ -	18,25	R\$ 11.039,79	0,00	R\$ -	100%
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS						0,00				
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	344,10	R\$ 98,83	R\$ 34.007,40	R\$ -	344,10	R\$ 34.007,40	0,00	R\$ -	100%
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	675,91	R\$ 18,65	R\$ 12.605,72	R\$ -	675,91	R\$ 12.605,72	0,00	R\$ -	100%
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,64	R\$ 16,41	R\$ 158,19	R\$ -	9,64	R\$ 158,19	0,00	R\$ -	100%



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	365,31	R\$ 13,66	R\$ 4.990,13	R\$ -	365,31	R\$ 4.990,13	0,00	R\$ -	100%
4.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	24,55	R\$ 584,99	R\$ 14.361,50	R\$ -	24,55	R\$ 14.361,50	0,00	R\$ -	100%
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS										
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	124,12	R\$ 73,23	R\$ 9.089,31	R\$ -	124,12	R\$ 9.089,31	0,00	R\$ -	100%
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES										
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	18,00	R\$ 63,75	R\$ 1.147,50	R\$ -	18,00	R\$ 1.147,50	0,00	R\$ -	100%
4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,66	R\$ 18,65	R\$ 254,76	R\$ -	13,66	R\$ 254,76	0,00	R\$ -	100%
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,92	R\$ 22,34	R\$ 981,17	R\$ -	43,92	R\$ 981,17	0,00	R\$ -	100%
4.4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,76	R\$ 604,92	R\$ 459,74	R\$ -	0,76	R\$ 459,74	0,00	R\$ -	100%
4.5	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE										
4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	19,24	R\$ 63,75	R\$ 1.226,55	R\$ -	19,24	R\$ 1.226,55	0,00	R\$ -	100%
4.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,26	R\$ 20,40	R\$ 311,30	R\$ -	15,26	R\$ 311,30	0,00	R\$ -	100%
4.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,45	R\$ 18,65	R\$ 362,74	R\$ -	19,45	R\$ 362,74	0,00	R\$ -	100%
4.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,01	R\$ 16,41	R\$ 459,64	R\$ -	28,01	R\$ 459,64	0,00	R\$ -	100%
4.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,06	R\$ 22,34	R\$ 381,12	R\$ -	17,06	R\$ 381,12	0,00	R\$ -	100%
4.5.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,23	R\$ 604,92	R\$ 744,05	R\$ -	1,23	R\$ 744,05	0,00	R\$ -	100%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL										
5.1	ELEMENTOS VAZADOS										
5.1.1	BLOCO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	6,10	R\$ 145,28	R\$ 886,21	R\$ -	6,10	R\$ 886,21	0,00	R\$ -	100%
5.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO										
5.1.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	572,77	R\$ 58,12	R\$ 33.289,39	R\$ -	572,77	R\$ 33.289,39	0,00	R\$ -	100%



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8


5.1.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X18CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	160,33	R\$ 94,87	R\$ 15.210,51	R\$ 15.210,51	R\$ 160,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	100%
5.1.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	496,91	R\$ 78,32	R\$ 38.917,99	R\$ 38.917,99	R\$ 496,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	100%
5.1.2.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	9,72	R\$ 102,11	R\$ 992,51	R\$ 992,51	R\$ 9,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	100%
5.2.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	311,80	R\$ 29,16	R\$ 9.092,09	R\$ 9.092,09	R\$ 311,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	100%
5.2.6	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	8,06	R\$ 471,07	R\$ 3.796,82	R\$ 3.796,82	R\$ 8,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,06	R\$ 3.796,82	0%
5.2.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	3,60	R\$ 195,51	R\$ 703,84	R\$ 703,84	R\$ 3,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,60	R\$ 703,84	0%
5.3	ALVENARIA DA MURETA											
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,95	R\$ 78,32	R\$ 4.930,24	R\$ 4.930,24	R\$ 62,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	100%
6	ESQUADRIAS											
6.1	PORTAS DE MADEIRA											
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 1.091,40	R\$ 6.548,40	R\$ 6.548,40	R\$ 6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 6.548,40	0%
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 2.019,92	R\$ 6.059,76	R\$ 6.059,76	R\$ 3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 6.059,76	0%
6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 1.139,29	R\$ 6.835,74	R\$ 6.835,74	R\$ 6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	100%
6.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 1.139,29	R\$ 9.114,32	R\$ 9.114,32	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	100%
6.1.5	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LÂMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,40	R\$ 847,60	R\$ 2.034,24	R\$ 2.034,24	R\$ 2,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,40	R\$ 2.034,24	0%
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS											
6.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 332,16	R\$ 2.657,28	R\$ 2.657,28	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,00	R\$ 2.657,28	0%
6.2.3	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	4,00	R\$ 57,82	R\$ 231,28	R\$ 231,28	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 231,28	0%
6.2.4	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	12,80	R\$ 147,23	R\$ 1.884,54	R\$ 1.884,54	R\$ 12,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,80	R\$ 1.884,54	0%
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO											
6.3.1	Porta de abrir PA1 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	2,10	R\$ 528,40	R\$ 1.109,64	R\$ 1.109,64	R\$ 2,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,10	R\$ 1.109,64	0%
6.3.2	Porta de abrir PA2 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	1,68	R\$ 528,40	R\$ 887,71	R\$ 887,71	R\$ 1,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,68	R\$ 887,71	0%
6.3.3	Porta de abrir PA3 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	3,36	R\$ 528,40	R\$ 1.775,42	R\$ 1.775,42	R\$ 3,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,36	R\$ 1.775,42	0%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677-8



Tony Felix Almeida
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.000.677.8

6.3.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	83,48	R\$ 493,20	R\$ 41.172,34	R\$ -	0,00	R\$ -	83,48	R\$ 41.172,34	0%
6.3.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,04	R\$ 638,33	R\$ 1.302,19	R\$ -	0,00	R\$ -	2,04	R\$ 1.302,19	0%
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV	UN	1,00	R\$ 1.648,75	R\$ 1.648,75	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.648,75	0%
6.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 1.648,75	R\$ 1.648,75	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.648,75	0%
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA										
6.5.1	JA - 01, 0,70MX1,25M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,88	R\$ 834,69	R\$ 734,53	R\$ -	0,00	R\$ -	0,88	R\$ 734,53	0%
6.5.2	JA - 02, 1,10MX1,95M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,15	R\$ 834,69	R\$ 1.794,58	R\$ -	0,00	R\$ -	2,15	R\$ 1.794,58	0%
6.5.3	JA - 03, 1,40MX1,15M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,61	R\$ 478,30	R\$ 770,06	R\$ -	0,00	R\$ -	1,61	R\$ 770,06	0%
6.5.4	JA - 04, 1,40MX1,95M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,73	R\$ 834,69	R\$ 2.278,70	R\$ -	0,00	R\$ -	2,73	R\$ 2.278,70	0%
6.5.5	JA - 05, 2,00MX1,05M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,16	R\$ 478,30	R\$ 1.033,13	R\$ -	0,00	R\$ -	2,16	R\$ 1.033,13	0%
6.5.6	JA - 06, 2,10MX0,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,05	R\$ 470,16	R\$ 493,69	R\$ -	0,00	R\$ -	1,05	R\$ 493,69	0%
6.5.7	JA - 07, 2,10MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,60	R\$ 470,18	R\$ 5.924,27	R\$ -	0,00	R\$ -	12,60	R\$ 5.924,27	0%
6.5.8	JA - 08, 2,10MX0,80M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,40	R\$ 470,18	R\$ 3.949,51	R\$ -	0,00	R\$ -	8,40	R\$ 3.949,51	0%
6.5.9	JA - 09, 2,10MX1,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,30	R\$ 470,18	R\$ 2.962,13	R\$ -	0,00	R\$ -	6,30	R\$ 2.962,13	0%
6.5.10	JA - 10, 0,70MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,05	R\$ 470,18	R\$ 493,69	R\$ -	0,00	R\$ -	1,05	R\$ 493,69	0%
6.5.11	JA - 11, 1,40MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,25	R\$ 470,18	R\$ 2.468,45	R\$ -	0,00	R\$ -	5,25	R\$ 2.468,45	0%
6.5.12	JA - 12, 4,20MX0,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,20	R\$ 470,18	R\$ 1.974,76	R\$ -	0,00	R\$ -	4,20	R\$ 1.974,76	0%
6.5.13	JA - 13, 5,60MX1,00M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,80	R\$ 470,18	R\$ 7.899,02	R\$ -	0,00	R\$ -	16,80	R\$ 7.899,02	0%
6.5.14	JA - 14, 1,61MX0,85M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,72	R\$ 478,30	R\$ 1.300,98	R\$ -	0,00	R\$ -	2,72	R\$ 1.300,98	0%



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

6.5.15	Tela de nylon para proteção-fixada na esquadria																								
6.6	VIDROS																								
6.6.1	JANELA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO		13,33	R\$	225,10	R\$	3.000,58	R\$		R\$				R\$	13,33	R\$	3.000,58	R\$							0%
6.6.2	BOX - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO		7,20	R\$	350,96	R\$	2.526,91	R\$		R\$				R\$	7,20	R\$	2.526,91	R\$							0%
6.6.3	ESPELHO CRISTAL - ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA		7,50	R\$	706,17	R\$	5.296,28	R\$		R\$				R\$	7,50	R\$	5.296,28	R\$							0%
6.6.4	INSTALACAO DE VIDRO, TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, AF_012021_PPACHADA		68,22	R\$	433,72	R\$	29.588,38	R\$		R\$				R\$	68,22	R\$	29.588,38	R\$							0%
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METALICO																								0%
6.7.1	GRADIL TIPO MORLAN INCLUSIVE PINTURA		95,08	R\$	346,12	R\$	32.909,09	R\$		R\$				R\$	95,08	R\$	32.909,09	R\$							0%
6.7.2	Gradil telado para substituição, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca		6,72	R\$	346,12	R\$	2.325,93	R\$		R\$				R\$	6,72	R\$	2.325,93	R\$							0%
7	SISTEMAS DE COBERTURA																								100%
7.1.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/ Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10 01 a 20,0m, pintada 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada		881,21	R\$	223,07	R\$	196.571,51	R\$	100,18	R\$	22.347,15	R\$	881,21	R\$	881,21	R\$	196.571,51	R\$	196.571,51	R\$	22.347,15	R\$	881,21	R\$	100%
7.1.2	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_072019		850,66	R\$	261,07	R\$	222.081,81	R\$	122,54	R\$	31.991,52	R\$	850,66	R\$	850,66	R\$	222.081,81	R\$	222.081,81	R\$	31.991,52	R\$	850,66	R\$	100%
7.1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_072019		M	R\$	105,47	R\$	7.293,25	R\$		R\$				R\$	69,15	R\$	7.293,25	R\$	7.293,25	R\$					100%
7.1.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_072019		M	R\$	61,43	R\$	5.749,85	R\$		R\$				R\$	93,60	R\$	5.749,85	R\$	5.749,85	R\$					0%
7.1.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_072019		M	R\$	61,43	R\$	2.807,35	R\$	45,70	R\$	2.807,35	R\$	45,70	R\$	45,70	R\$	2.807,35	R\$	2.807,35	R\$					100%
7.1.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 32CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_072019		M	R\$	61,43	R\$	7.777,04	R\$		R\$				R\$	126,60	R\$	7.777,04	R\$	7.777,04	R\$					100%
7.1.7	PINGADEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.		M	R\$	46,68	R\$	10.904,45	R\$		R\$				R\$	233,60	R\$	10.904,45	R\$	10.904,45	R\$					100%
7.1.8	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" e estrutura de apoio - fornecimento e montagem		m²	R\$	493,50	R\$	12.811,26	R\$		R\$				R\$	25,96	R\$	12.811,26	R\$	12.811,26	R\$					0%
8	IMPERMEABILIZACAO																								
8.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO.		m²	R\$	14,65	R\$	5.772,98	R\$		R\$				R\$	394,06	R\$	5.772,98	R\$	5.772,98	R\$					100%
8.2	IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_062018		m²	R\$	55,81	R\$	7.001,92	R\$		R\$				R\$	125,46	R\$	7.001,92	R\$	7.001,92	R\$					100%
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO																								
9.1	EDIFICACAO																								
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_082014		m²	R\$	5,23	R\$	13.439,01	R\$		R\$				R\$	2569,60	R\$	13.439,01	R\$	13.439,01	R\$					100%
9.1.2	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_062014		m²	R\$	37,28	R\$	59.267,00	R\$		R\$				R\$	1589,78	R\$	59.267,00	R\$	59.267,00	R\$					100%
9.1.3	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_062014		m²	R\$	44,89	R\$	43.788,16	R\$		R\$				R\$	979,82	R\$	43.788,16	R\$	43.788,16	R\$					100%




Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.044.677.8

9.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1024,77	R\$	25,48	R\$	26.111,14		R\$	-	1024,77	R\$	26.111,14	0,00	R\$	-	100%
9.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	376,80	R\$	66,26	R\$	24.966,77		R\$	-	376,80	R\$	24.966,77	0,00	R\$	-	100%
9.1.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04	m²	176,57	R\$	58,34	R\$	10.301,09		R\$	-	0,00	R\$	-	176,57	R\$	10.301,09	0%
9.1.7	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04	m²	33,90	R\$	58,34	R\$	1.977,73		R\$	-	0,00	R\$	-	33,90	R\$	1.977,73	0%
9.1.10	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA	M	127,20	R\$	21,40	R\$	2.722,08		R\$	-	0,00	R\$	-	127,20	R\$	2.722,08	0%
9.1.11	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	697,80	R\$	56,16	R\$	39.188,45	236,87	R\$	13.302,62	236,87	R\$	13.302,62	460,93	R\$	25.885,83	34%
9.2	MURETA																
9.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	98,05	R\$	5,23	R\$	512,80		R\$	-	98,05	R\$	512,80	0,00	R\$	-	100%
9.2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	98,05	R\$	37,28	R\$	3.655,30		R\$	-	98,05	R\$	3.655,30	0,00	R\$	-	100%
10	SISTEMAS DE PISOS																
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA																
10.1.1	CONTRAPOSO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	408,38	R\$	43,59	R\$	17.801,28		R\$	-	204,38	R\$	8.908,92	204,00	R\$	8.892,36	50%
10.1.2	CONTRAPOSO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	130,16	R\$	34,15	R\$	4.444,96		R\$	-	56,80	R\$	1.939,72	73,36	R\$	2.505,24	44%
10.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ÁREA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	375,34	R\$	40,27	R\$	15.114,94		R\$	-	56,80	R\$	2.287,34	318,54	R\$	12.827,61	15%
10.1.4	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,42	R\$	61,18	R\$	2.289,36		R\$	-	0,00	R\$	-	37,42	R\$	2.289,36	0%
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	148,95	R\$	50,09	R\$	7.460,91	82,39	R\$	4.126,92	82,39	R\$	4.126,92	66,56	R\$	3.333,99	55%
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	42,90	R\$	88,67	R\$	3.803,94	42,90	R\$	3.803,94	42,90	R\$	3.803,94	0,00	R\$	-	100%
10.1.7	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M	68,00	R\$	16,14	R\$	1.097,52	35,54	R\$	573,62	35,54	R\$	573,62	32,46	R\$	523,90	52%
10.1.10	SOLEIRA DE GRANITO L=15cm	M	53,45	R\$	65,45	R\$	3.498,30		R\$	-	53,45	R\$	3.498,30	0,00	R\$	-	100%
10.1.11	SOLEIRA DE GRANITO L=25cm	M	1,75	R\$	94,94	R\$	165,45		R\$	-	1,75	R\$	165,45	0,00	R\$	-	100%
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA																
10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	254,80	R\$	138,78	R\$	35.361,14		R\$	-	0,00	R\$	-	254,80	R\$	35.361,14	0%
10.2.2	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	17,38	R\$	455,75	R\$	7.920,94		R\$	-	0,00	R\$	-	17,38	R\$	7.920,94	0%
10.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m²	27,74	R\$	71,35	R\$	1.979,25		R\$	-	0,00	R\$	-	27,74	R\$	1.979,25	0%




10.2.4	DIRECIONAL - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	7,50	R\$ 120,42	R\$ 903,15		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	7,50	R\$ 903,15	0%
10.2.5	ALERTA - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	4,88	R\$ 120,42	R\$ 587,65		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	4,88	R\$ 587,65	0%
10.2.6	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSF)	m²	21,96	R\$ 10,87	R\$ 234,31		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	21,96	R\$ 234,31	0%
10.2.7	PLANTIO DE GRAMA BATAIBS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	344,81	R\$ 13,15	R\$ 4.534,25		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	344,81	R\$ 4.534,25	0%
10.2.8	GUIA (MEO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8,06	R\$ 35,61	R\$ 287,02		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	8,06	R\$ 287,02	0%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS												
11.1	EDIFICAÇÃO												
11.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	2004,59	R\$ 20,91	R\$ 41.915,98	559,51	R\$ 11.699,41	1059,51	R\$ 22.154,41	R\$ 19.761,57	945,08	R\$ 19.761,57	53%
11.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1902,86	R\$ 15,46	R\$ 29.419,76		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	1902,86	R\$ 29.419,76	0%
11.1.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	442,55	R\$ 14,66	R\$ 6.487,78		R\$ -	440,00	R\$ 6.450,40	R\$ 37,38	2,55	R\$ 37,38	99%
11.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	442,55	R\$ 14,73	R\$ 6.518,76		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	442,55	R\$ 6.518,76	0%
11.1.5	PINTURA ESMALTE ACE TINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	123,61	R\$ 31,05	R\$ 3.838,09		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	123,61	R\$ 3.838,09	0%
11.1.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO), APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	421,23	R\$ 26,77	R\$ 11.276,33		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	421,23	R\$ 11.276,33	0%
11.1.8	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	12,72	R\$ 30,95	R\$ 393,68		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	12,72	R\$ 393,68	0%
11.1.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO), APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	172,13	R\$ 26,77	R\$ 4.607,92		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	172,13	R\$ 4.607,92	0%
11.1.10	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	m²	101,63	R\$ 54,20	R\$ 5.508,35		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	101,63	R\$ 5.508,35	0%
11.1.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO), APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	172,13	R\$ 26,77	R\$ 4.607,92		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	172,13	R\$ 4.607,92	0%
11.2	MURETA												
11.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	98,05	R\$ 20,91	R\$ 2.050,23		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	98,05	R\$ 2.050,23	0%
11.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	99,05	R\$ 15,46	R\$ 1.515,85		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	99,05	R\$ 1.515,85	0%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA												
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO												
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	27,60	R\$ 9,10	R\$ 251,16		R\$ -	27,60	R\$ 251,16	R\$ -	0,00	R\$ -	100%
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	166,90	R\$ 5,76	R\$ 961,34		R\$ -	166,90	R\$ 961,34	R\$ -	0,00	R\$ -	100%
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	81,05	R\$ 20,07	R\$ 1.626,67		R\$ -	81,05	R\$ 1.626,67	R\$ -	0,00	R\$ -	100%
12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,00	R\$ 33,05	R\$ 363,55		R\$ -	11,00	R\$ 363,55	R\$ -	0,00	R\$ -	100%
12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	134,60	R\$ 54,57	R\$ 7.345,12		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	134,60	R\$ 7.345,12	0%
12.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	54,55	R\$ 67,89	R\$ 3.703,40		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	54,55	R\$ 3.703,40	0%
12.1.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$ 38,30	R\$ 114,90		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 114,90	0%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8




12.1.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R\$ 243,73	R\$ 1.462,38	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.462,38	0%
12.1.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 330,49	R\$ 660,98	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 660,98	0%
12.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 4,55	R\$ 18,20	R\$ -	4,00	R\$ 18,20	0,00	R\$ -	100%
12.1.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	72,00	R\$ 4,32	R\$ 311,04	R\$ -	72,00	R\$ 311,04	0,00	R\$ -	100%
12.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	R\$ 12,25	R\$ 490,00	R\$ -	40,00	R\$ 490,00	0,00	R\$ -	100%
12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 34,03	R\$ 204,18	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 204,18	0%
12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 49,86	R\$ 99,72	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 99,72	0%
12.1.15	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 22,87	R\$ 137,22	R\$ -	6,00	R\$ 137,22	0,00	R\$ -	100%
12.1.16	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm)	UN	2,00	R\$ 31,16	R\$ 62,32	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 62,32	0%
12.1.17	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2 1/2" (85X75mm)	UN	4,00	R\$ 38,79	R\$ 155,16	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 155,16	0%
12.1.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	R\$ 12,81	R\$ 384,30	R\$ -	30,00	R\$ 384,30	0,00	R\$ -	100%
12.1.19	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm)	UN	1,00	R\$ 14,55	R\$ 14,55	R\$ -	1,00	R\$ 14,55	0,00	R\$ -	100%
12.1.20	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm)	UN	5,00	R\$ 29,58	R\$ 147,90	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 147,90	0%
12.1.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 6,17	R\$ 18,51	R\$ -	3,00	R\$ 18,51	0,00	R\$ -	100%
12.1.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 17,92	R\$ 35,84	R\$ -	2,00	R\$ 35,84	0,00	R\$ -	100%
12.1.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 97,39	R\$ 779,12	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 779,12	0%
12.1.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 152,90	R\$ 305,80	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 305,80	0%
12.1.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 8,51	R\$ 34,04	R\$ -	4,00	R\$ 34,04	0,00	R\$ -	100%
12.1.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	88,00	R\$ 10,11	R\$ 889,68	R\$ -	88,00	R\$ 889,68	0,00	R\$ -	100%
12.1.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00	R\$ 15,70	R\$ 439,60	R\$ -	28,00	R\$ 439,60	0,00	R\$ -	100%
12.1.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 41,29	R\$ 165,16	R\$ -	4,00	R\$ 165,16	0,00	R\$ -	100%
12.1.29	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	R\$ 54,56	R\$ 1.418,56	R\$ -	0,00	R\$ -	26,00	R\$ 1.418,56	0%
12.1.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 152,90	R\$ 917,40	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 917,40	0%
12.1.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	47,00	R\$ 16,87	R\$ 792,89	R\$ -	47,00	R\$ 792,89	0,00	R\$ -	100%
12.1.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 16,87	R\$ 202,44	R\$ -	12,00	R\$ 202,44	0,00	R\$ -	100%




Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

12.1.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	R\$ 14,05	R\$ 238,85		R\$ -	17,00	R\$ 238,85	0,00	R\$ -	100%
12.1.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 24,64	R\$ 344,96		R\$ -	14,00	R\$ 344,96	0,00	R\$ -	100%
12.1.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 96,69	R\$ 676,83		R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 676,83	0%
12.1.36	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 148,06	R\$ 592,24		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 592,24	0%
12.1.37	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 23,16	R\$ 231,60		R\$ -	10,00	R\$ 231,60	0,00	R\$ -	100%
12.1.38	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 83,40	R\$ 166,80		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 166,80	0%
12.1.39	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 83,40	R\$ 1.084,20		R\$ -	0,00	R\$ -	13,00	R\$ 1.084,20	0%
12.1.40	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 83,40	R\$ 250,20		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 250,20	0%
12.1.41	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	9,00	R\$ 26,28	R\$ 236,52		R\$ -	9,00	R\$ 236,52	0,00	R\$ -	100%
12.1.42	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	8,00	R\$ 26,28	R\$ 210,24		R\$ -	8,00	R\$ 210,24	0,00	R\$ -	100%
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS							0,00				
12.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 289,97	R\$ 869,91		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 869,91	0%
12.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 352,10	R\$ 352,10		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 352,10	0%
12.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 83,01	R\$ 166,02		R\$ -	2,00	R\$ 166,02	0,00	R\$ -	100%
12.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 167,14	R\$ 1.337,12		R\$ -	8,00	R\$ 1.337,12	0,00	R\$ -	100%
12.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	R\$ 94,47	R\$ 2.834,10		R\$ -	30,00	R\$ 2.834,10	0,00	R\$ -	100%
12.2.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 89,77	R\$ 538,62		R\$ -	6,00	R\$ 538,62	0,00	R\$ -	100%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							0,00				
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC							0,00				
13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	246,60	R\$ 34,17	R\$ 8.426,32		R\$ -	246,60	R\$ 8.426,32	0,00	R\$ -	100%
13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	R\$ 66,60	R\$ 199,80		R\$ -	3,00	R\$ 199,80	0,00	R\$ -	100%
13.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	R\$ 27,17	R\$ 298,87		R\$ -	11,00	R\$ 298,87	0,00	R\$ -	100%
13.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	47,00	R\$ 27,24	R\$ 1.280,28		R\$ -	47,00	R\$ 1.280,28	0,00	R\$ -	100%
13.1.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 83,82	R\$ 335,28		R\$ -	4,00	R\$ 335,28	0,00	R\$ -	100%
13.1.6	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 66,37	R\$ 66,37		R\$ -	1,00	R\$ 66,37	0,00	R\$ -	100%




Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.030.677.8

Item	Descrição	Un	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total
13.2	ACESSÓRIOS										
13.2.1	Rolo hemisférico em F. tipo abacaxi Ø 100mm.	un	11,00	R\$ 46,01	R\$ 506,11	R\$ 46,01	R\$ 506,11	R\$ 46,01	R\$ 506,11	R\$ 46,01	R\$ 506,11
13.2.2	CAIXA DE ÁREA 60X60X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	9,00	R\$ 119,80	R\$ 1.078,20	R\$ 119,80	R\$ 1.078,20	R\$ 119,80	R\$ 1.078,20	R\$ 119,80	R\$ 1.078,20
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA										
14.1	TUBO PVC-SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	149,30	R\$ 63,96	R\$ 9.549,23	R\$ 63,96	R\$ 9.549,23	R\$ 63,96	R\$ 9.549,23	R\$ 63,96	R\$ 9.549,23
14.2	TUBO PVC-SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	115,30	R\$ 22,39	R\$ 2.581,57	R\$ 22,39	R\$ 2.581,57	R\$ 22,39	R\$ 2.581,57	R\$ 22,39	R\$ 2.581,57
14.3	TUBO PVC-SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	173,10	R\$ 32,96	R\$ 5.705,38	R\$ 32,96	R\$ 5.705,38	R\$ 32,96	R\$ 5.705,38	R\$ 32,96	R\$ 5.705,38
14.4	TUBO PVC-SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	69,55	R\$ 46,59	R\$ 3.240,33	R\$ 46,59	R\$ 3.240,33	R\$ 46,59	R\$ 3.240,33	R\$ 46,59	R\$ 3.240,33
14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 27,17	R\$ 163,02	R\$ 27,17	R\$ 163,02	R\$ 27,17	R\$ 163,02	R\$ 27,17	R\$ 163,02
14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 22,00	R\$ 198,00	R\$ 22,00	R\$ 198,00	R\$ 22,00	R\$ 198,00	R\$ 22,00	R\$ 198,00
14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	31,00	R\$ 12,88	R\$ 399,28	R\$ 12,88	R\$ 399,28	R\$ 12,88	R\$ 399,28	R\$ 12,88	R\$ 399,28
14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	R\$ 8,32	R\$ 266,24	R\$ 8,32	R\$ 266,24	R\$ 8,32	R\$ 266,24	R\$ 8,32	R\$ 266,24
14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 27,24	R\$ 326,88	R\$ 27,24	R\$ 326,88	R\$ 27,24	R\$ 326,88	R\$ 27,24	R\$ 326,88
14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	28,00	R\$ 31,14	R\$ 871,92	R\$ 31,14	R\$ 871,92	R\$ 31,14	R\$ 871,92	R\$ 31,14	R\$ 871,92
14.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00	R\$ 12,21	R\$ 219,78	R\$ 12,21	R\$ 219,78	R\$ 12,21	R\$ 219,78	R\$ 12,21	R\$ 219,78
14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	106,00	R\$ 11,18	R\$ 1.185,08	R\$ 11,18	R\$ 1.185,08	R\$ 11,18	R\$ 1.185,08	R\$ 11,18	R\$ 1.185,08
14.14	JUNGAO SIMPLIS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 79,22	R\$ 1.109,08	R\$ 79,22	R\$ 1.109,08	R\$ 79,22	R\$ 1.109,08	R\$ 79,22	R\$ 1.109,08
14.15	JUNGAO SIMPLIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 50,31	R\$ 402,48	R\$ 50,31	R\$ 402,48	R\$ 50,31	R\$ 402,48	R\$ 50,31	R\$ 402,48
14.16	JUNGAO SIMPLIS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 53,33	R\$ 53,33	R\$ 53,33	R\$ 53,33	R\$ 53,33	R\$ 53,33	R\$ 53,33	R\$ 53,33
14.17	JUNGAO SIMPLIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 23,79	R\$ 214,11	R\$ 23,79	R\$ 214,11	R\$ 23,79	R\$ 214,11	R\$ 23,79	R\$ 214,11
14.18	REDUÇAO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 29,99	R\$ 29,99	R\$ 29,99	R\$ 29,99	R\$ 29,99	R\$ 29,99	R\$ 29,99	R\$ 29,99
14.19	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 66,93	R\$ 267,72	R\$ 66,93	R\$ 267,72	R\$ 66,93	R\$ 267,72	R\$ 66,93	R\$ 267,72
14.20	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 66,93	R\$ 803,16	R\$ 66,93	R\$ 803,16	R\$ 66,93	R\$ 803,16	R\$ 66,93	R\$ 803,16
14.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 21,85	R\$ 284,05	R\$ 21,85	R\$ 284,05	R\$ 21,85	R\$ 284,05	R\$ 21,85	R\$ 284,05



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.005.677.8

14.22	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 45,47	R\$ 45,47	R\$ -	1,00	R\$ 45,47	0,00	R\$ -	100%
14.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 20,53	R\$ 246,36	R\$ -	12,00	R\$ 246,36	0,00	R\$ -	100%
14.24	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00	R\$ 37,66	R\$ 715,54	R\$ -	19,00	R\$ 715,54	0,00	R\$ -	100%
14.25	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 179,93	R\$ 719,72	R\$ -	4,00	R\$ 719,72	0,00	R\$ -	100%
14.26	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	R\$ 314,08	R\$ 3.768,96	R\$ -	12,00	R\$ 3.768,96	0,00	R\$ -	100%
14.27	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 12,14	R\$ 182,10	R\$ -	15,00	R\$ 182,10	0,00	R\$ -	100%
14.28	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha alumínio	un	3,00	R\$ 94,14	R\$ 282,42	R\$ -	3,00	R\$ 282,42	0,00	R\$ -	100%
14.29	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	9,00	R\$ 12,03	R\$ 108,27	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 108,27	0%
14.30	TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM	UN	9,00	R\$ 13,15	R\$ 118,35	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 118,35	0%
14.31	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,50 x 1,00 x 1,50 m	un	1,00	R\$ 3.570,15	R\$ 3.570,15	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 3.570,15	0%
14.32	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	1,00	R\$ 8.367,68	R\$ 8.367,68	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 8.367,68	0%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS										
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	R\$ 272,64	R\$ 1.090,56	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 1.090,56	0%
15.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 456,55	R\$ 4.108,95	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 4.108,95	0%
15.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	9,70	R\$ 108,45	R\$ 1.051,97	R\$ -	0,00	R\$ -	9,70	R\$ 1.051,97	0%
15.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	R\$ 347,93	R\$ 4.523,09	R\$ -	13,00	R\$ 4.523,09	0,00	R\$ -	100%
15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 130,08	R\$ 1.691,04	R\$ -	0,00	R\$ -	13,00	R\$ 1.691,04	0%
15.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 202,92	R\$ 1.217,52	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.217,52	0%
15.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 423,60	R\$ 2.118,00	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 2.118,00	0%
15.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 260,39	R\$ 260,39	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 260,39	0%
15.9	banheira embutir em plástico tipo pvc, 77 x 45 x 20 cm	un	2,00	R\$ 325,13	R\$ 650,26	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 650,26	0%
15.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 138,30	R\$ 414,90	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 414,90	0%
15.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 138,30	R\$ 414,90	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 414,90	0%
15.12	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 783,52	R\$ 2.350,56	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 2.350,56	0%
15.13	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 89,41	R\$ 715,28	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 715,28	0%
15.14	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 32,23	R\$ 290,07	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 290,07	0%
15.15	Cabo de plástico, Akros ou similar	un	107,00	R\$ 14,87	R\$ 1.591,09	R\$ -	0,00	R\$ -	107,00	R\$ 1.591,09	0%
15.16	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	3,00	R\$ 66,57	R\$ 199,71	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 199,71	0%
15.17	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 134,26	R\$ 268,52	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 268,52	0%
15.18	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 134,26	R\$ 268,52	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 268,52	0%




Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

15.19	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 ,PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$	103,55	R\$	931,95	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	9,00	R\$	931,95	0%
15.20	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$	52,88	R\$	370,16	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	7,00	R\$	370,16	0%
15.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R\$	59,63	R\$	954,08	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	16,00	R\$	954,08	0%
15.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$	59,63	R\$	178,89	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	178,89	0%
15.23	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$	69,07	R\$	966,98	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	14,00	R\$	966,98	0%
15.24	DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO)	UN	10,00	R\$	67,82	R\$	678,20	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	10,00	R\$	678,20	0%
15.25	Dispenser para toalha interfolhada	un	14,00	R\$	45,79	R\$	641,06	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	14,00	R\$	641,06	0%
15.26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$	360,56	R\$	2.523,92	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	7,00	R\$	2.523,92	0%
15.27	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$	349,21	R\$	1.746,05	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	5,00	R\$	1.746,05	0%
15.28	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$	332,16	R\$	2.989,44	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	9,00	R\$	2.989,44	0%
15.29	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$	1.027,87	R\$	1.027,87	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	1.027,87	0%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL																	
16.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,14	R\$	482,23	R\$	549,74	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,14	R\$	549,74	0%
16.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,24	R\$	638,33	R\$	153,20	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,24	R\$	153,20	0%
16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMIAS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	37,60	R\$	50,37	R\$	1.893,91	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	37,60	R\$	1.893,91	0%
16.4	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	37,60	R\$	18,46	R\$	694,10	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	37,60	R\$	694,10	0%
16.5	Fita anticorrosiva	Un	4,00	R\$	8,20	R\$	32,80	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	32,80	0%
16.6	REGULADOR 1º ESTÁGIO COM MANOMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$	159,05	R\$	159,05	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	159,05	0%
16.7	REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO	un	2,00	R\$	45,98	R\$	91,96	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	91,96	0%
16.8	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45KG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$	408,53	R\$	408,53	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	408,53	0%
16.8.2	Placa de proibido fumar	Un	1,00	R\$	76,94	R\$	76,94	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	76,94	0%
16.8.3	Placa de perigo inflamável	Un	1,00	R\$	76,94	R\$	76,94	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	76,94	0%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO																	
17.1	EXTINTOR DE PÓIS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$	227,04	R\$	1.362,24	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	6,00	R\$	1.362,24	0%
17.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$	761,41	R\$	1.522,82	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	1.522,82	0%
17.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R\$	132,05	R\$	924,35	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	7,00	R\$	924,35	0%
17.4	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$	140,35	R\$	140,35	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	140,35	0%
17.5	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$	84,55	R\$	169,10	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	169,10	0%
17.6	INSTALAÇÃO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$	183,90	R\$	735,60	R\$	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	735,60	0%




17.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	63,00	R\$ 147,13	R\$ 9.269,19	R\$ -	0,00	R\$ -	63,00	R\$ 9.269,19	0%
17.8	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 1.525,01	R\$ 3.050,02	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 3.050,02	0%
17.9	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 370,36	R\$ 370,36	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 370,36	0%
17.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 289,97	R\$ 1.449,85	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 1.449,85	0%
17.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 191,86	R\$ 575,58	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 575,58	0%
17.12	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 179,17	R\$ 716,68	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 716,68	0%
17.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36,00	R\$ 24,70	R\$ 889,20	R\$ -	0,00	R\$ -	36,00	R\$ 889,20	0%
17.14	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	10,00	R\$ 18,46	R\$ 184,60	R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 184,60	0%
17.15	Bomba para incêndio a diesel 05 cv, recalque/sucção de 2", vazão max. de 36,00 m³/h, hman= 08 m.c.a	un	1,00	R\$ 2.826,84	R\$ 2.826,84	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.826,84	0%
17.16	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1,00	R\$ 219,18	R\$ 219,18	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 219,18	0%
17.17	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2,00	R\$ 219,18	R\$ 438,36	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 438,36	0%
17.18	Placa de sinalizacao de seguranga contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	34,00	R\$ 27,31	R\$ 928,54	R\$ -	0,00	R\$ -	34,00	R\$ 928,54	0%
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V						0,00				
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO						0,00				
18.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 597,68	R\$ 597,68	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 597,68	0%
18.1.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 769,98	R\$ 1.539,96	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.539,96	0%
18.1.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 883,24	R\$ 2.649,72	R\$ -	2,00	R\$ 1.766,48	1,00	R\$ 883,24	67%
18.1.4	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 99,54	R\$ 99,54	R\$ -	1,00	R\$ 99,54	0,00	R\$ -	100%
18.2	DISJUNTORES						0,00				
18.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	66,00	R\$ 11,69	R\$ 771,54	R\$ -	0,00	R\$ -	66,00	R\$ 771,54	0%
18.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 12,39	R\$ 37,17	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 37,17	0%
18.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 12,39	R\$ 24,78	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 24,78	0%
18.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	R\$ 13,67	R\$ 218,72	R\$ -	0,00	R\$ -	16,00	R\$ 218,72	0%
18.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 15,23	R\$ 60,92	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 60,92	0%
18.2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 22,11	R\$ 22,11	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 22,11	0%
18.2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 73,28	R\$ 146,56	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 146,56	0%
18.2.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 81,82	R\$ 327,28	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 327,28	0%




Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

18.2.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 89,46	R\$ 178,92		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 178,92	0%
18.2.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 99,19	R\$ 198,38		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 198,38	0%
18.2.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 132,13	R\$ 264,26		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 264,26	0%
18.2.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 569,56	R\$ 1.139,12		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.139,12	0%
18.2.13	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	R\$ 132,81	R\$ 132,81		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 132,81	0%
18.2.14	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	2,00	R\$ 248,90	R\$ 497,80		R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 497,80	0%
18.2.15	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3,00	R\$ 132,81	R\$ 398,43		R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 398,43	0%
18.2.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	24,00	R\$ 104,15	R\$ 2.499,60		R\$ -	0,00	R\$ -	24,00	R\$ 2.499,60	0%
18.2.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	8,00	R\$ 104,15	R\$ 833,20		R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 833,20	0%
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							0,00				
18.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	408,30	R\$ 9,84	R\$ 4.017,67		R\$ -	408,30	R\$ 4.017,67	0,00	R\$ -	100%
18.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	174,40	R\$ 12,81	R\$ 2.234,06		R\$ -	174,40	R\$ 2.234,06	0,00	R\$ -	100%
18.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	334,90	R\$ 17,40	R\$ 5.827,26		R\$ -	0,00	R\$ -	334,90	R\$ 5.827,26	0%
18.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,20	R\$ 25,44	R\$ 259,49		R\$ -	0,00	R\$ -	10,20	R\$ 259,49	0%
18.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R\$ 42,95	R\$ 1.718,00		R\$ -	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 1.718,00	0%
18.3.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	29,80	R\$ 22,66	R\$ 675,27		R\$ -	0,00	R\$ -	29,80	R\$ 675,27	0%
18.3.7	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11,00	R\$ 244,68	R\$ 2.691,48		R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 2.691,48	0%
18.3.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	170,00	R\$ 16,01	R\$ 2.721,70		R\$ -	120,00	R\$ 1.921,20	50,00	R\$ 800,50	71%
18.3.9	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00	R\$ 10,97	R\$ 1.097,00		R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	R\$ 1.097,00	0%
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)							0,00				
18.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5871,30	R\$ 4,26	R\$ 25.011,74	2198,65	R\$ 9.366,25	5771,85	R\$ 24.588,08	99,45	R\$ 423,66	98%
18.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	253,90	R\$ 6,88	R\$ 1.746,83	126,03	R\$ 867,09	253,90	R\$ 1.746,83	0,00	R\$ -	100%
18.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1472,40	R\$ 9,37	R\$ 13.796,39	558,98	R\$ 5.237,64	1341,12	R\$ 12.566,29	131,28	R\$ 1.230,09	91%
18.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,50	R\$ 23,52	R\$ 811,44		R\$ -	34,50	R\$ 811,44	0,00	R\$ -	100%
18.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,30	R\$ 27,00	R\$ 1.574,10		R\$ -	0,00	R\$ -	58,30	R\$ 1.574,10	0%
18.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,60	R\$ 36,28	R\$ 3.214,41		R\$ -	0,00	R\$ -	88,60	R\$ 3.214,41	0%
18.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	282,80	R\$ 78,17	R\$ 22.106,48		R\$ -	0,00	R\$ -	282,80	R\$ 22.106,48	0%



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

18.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	R\$ 94,31	R\$ 3.772,40	R\$ -	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 3.772,40	0%
18.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	159,80	R\$ 162,56	R\$ 25.977,09	R\$ -	0,00	R\$ -	159,80	R\$ 25.977,09	0%
18.5	ELETROCALHAS						0,00				
18.5.1	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	75,20	R\$ 100,10	R\$ 7.527,52	R\$ -	0,00	R\$ -	75,20	R\$ 7.527,52	0%
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS						0,00				
18.6.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	95,00	R\$ 30,71	R\$ 2.917,45	R\$ -	0,00	R\$ -	95,00	R\$ 2.917,45	0%
18.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00	R\$ 32,41	R\$ 745,43	R\$ -	0,00	R\$ -	23,00	R\$ 745,43	0%
18.6.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 43,10	R\$ 129,30	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 129,30	0%
18.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	R\$ 45,20	R\$ 1.536,80	R\$ -	0,00	R\$ -	34,00	R\$ 1.536,80	0%
18.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 25,33	R\$ 75,99	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 75,99	0%
18.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 59,75	R\$ 119,50	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 119,50	0%
18.6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 54,43	R\$ 54,43	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 54,43	0%
18.6.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 30,71	R\$ 307,10	R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 307,10	0%
18.6.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R\$ 221,24	R\$ 1.769,92	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 1.769,92	0%
18.6.10	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W)	UN	11,00	R\$ 102,83	R\$ 1.131,13	R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 1.131,13	0%
18.6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	UN	56,00	R\$ 118,28	R\$ 6.623,68	R\$ -	0,00	R\$ -	56,00	R\$ 6.623,68	0%
18.6.12	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	25,00	R\$ 165,86	R\$ 4.146,50	R\$ -	0,00	R\$ -	25,00	R\$ 4.146,50	0%
18.6.13	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9,00	R\$ 205,96	R\$ 1.853,64	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 1.853,64	0%
18.6.14	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	4,00	R\$ 410,44	R\$ 1.641,76	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 1.641,76	0%
18.6.15	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	1,00	R\$ 410,44	R\$ 410,44	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 410,44	0%
18.6.16	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	8,00	R\$ 152,18	R\$ 1.217,44	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 1.217,44	0%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO						0,00				
19.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	63,90	R\$ 15,20	R\$ 971,28	R\$ -	63,90	R\$ 971,28	0,00	R\$ -	100%
19.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 6,17	R\$ 74,04	R\$ -	12,00	R\$ 74,04	0,00	R\$ -	100%
19.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 5,75	R\$ 80,50	R\$ -	14,00	R\$ 80,50	0,00	R\$ -	100%
19.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 9,10	R\$ 27,30	R\$ -	3,00	R\$ 27,30	0,00	R\$ -	100%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA						0,00				
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS						0,00				
20.1.1	RATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 948,33	R\$ 2.844,99	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 2.844,99	0%
20.1.2	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	1,00	R\$ 507,92	R\$ 507,92	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 507,92	0%
20.1.3	GUIA DE CABO SIMPLES	UN	2,00	R\$ 41,83	R\$ 83,66	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 83,66	0%
20.1.4	GUIA DE CABOS DE VERTICAL, FECHADO	UN	1,00	R\$ 41,83	R\$ 41,83	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 41,83	0%
20.1.5	GUIA DE CABO VERTICAL	UN	2,00	R\$ 41,83	R\$ 83,66	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 83,66	0%



Tony Félix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.018.877.8

20.1.6	GUIA DE CABOS SUPERIOR FECHADO	UN	1,00	R\$ 41,83	R\$ 41,83	R\$ 41,83	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 41,83	0%
20.1.7	BANDEJA MOVEL, PADRAO 19"	UN	2,00	R\$ 65,67	R\$ 131,34	R\$ 131,34	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 131,34	0%
20.1.8	Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm	un	1,00	R\$ 726,43	R\$ 726,43	R\$ 726,43	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 726,43	0%
20.1.9	ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHZ - 300 MPBS	UN	2,00	R\$ 634,89	R\$ 1.269,78	R\$ 1.269,78	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.269,78	0%
20.2	CABOS EM PAR TRANCADOS												
20.2.1	CABO LOGICO 4 PARES - CATEGORIA 6 - UTP	M	579,00	R\$ 14,57	R\$ 8.436,03	R\$ 8.436,03	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	579,00	R\$ 8.436,03	0%
20.2.2	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	113,00	R\$ 13,66	R\$ 1.543,58	R\$ 1.543,58	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	113,00	R\$ 1.543,58	0%
20.2.3	PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 2.50m	UN	19,00	R\$ 17,77	R\$ 337,63	R\$ 337,63	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	19,00	R\$ 337,63	0%
20.3	TOMADAS												
20.3.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 11/2019	UN	19,00	R\$ 39,49	R\$ 750,31	R\$ 750,31	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	19,00	R\$ 750,31	0%
20.3.2	Tomada completa TV/SAT	un	8,00	R\$ 72,64	R\$ 581,12	R\$ 581,12	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 581,12	0%
20.3.3	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (para-rato)	Un	10,00	R\$ 42,93	R\$ 429,30	R\$ 429,30	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 429,30	0%
20.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS												
20.4.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	R\$ 244,68	R\$ 978,72	R\$ 978,72	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 978,72	0%
20.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2015	UN	27,00	R\$ 16,01	R\$ 432,27	R\$ 432,27	0,00	R\$ -	27,00	R\$ 432,27	0,00	R\$ -	100%
20.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS												
20.5.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2015	M	15,20	R\$ 10,38	R\$ 157,78	R\$ 157,78	0,00	R\$ -	15,20	R\$ 157,78	0,00	R\$ -	100%
20.5.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2015	M	112,05	R\$ 9,84	R\$ 1.102,57	R\$ 1.102,57	0,00	R\$ -	112,05	R\$ 1.102,57	0,00	R\$ -	100%
20.5.3	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2015	M	4,80	R\$ 18,01	R\$ 86,45	R\$ 86,45	0,00	R\$ -	4,80	R\$ 86,45	0,00	R\$ -	100%
20.5.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 11/2016_P	M	55,20	R\$ 28,10	R\$ 1.551,12	R\$ 1.551,12	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	55,20	R\$ 1.551,12	0%
20.5.5	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (60X50)mm	M	51,65	R\$ 57,43	R\$ 2.966,26	R\$ 2.966,26	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	51,65	R\$ 2.966,26	0%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA												
21.1	Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm. Multinox ou similar	un	1,00	R\$ 1.920,13	R\$ 1.920,13	R\$ 1.920,13	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.920,13	0%
21.2	EXAUSTOR ELETROMECANICO INDUSTRIAL D= 400MM	UN	1,00	R\$ 1.468,08	R\$ 1.468,08	R\$ 1.468,08	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.468,08	0%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)												
22.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2017	UN	1,00	R\$ 113,47	R\$ 113,47	R\$ 113,47	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 113,47	0%
22.2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	108,60	R\$ 11,47	R\$ 1.245,64	R\$ 1.245,64	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	108,60	R\$ 1.245,64	0%
22.3	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2017	UN	11,00	R\$ 24,49	R\$ 269,39	R\$ 269,39	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 269,39	0%
22.4	Abracadela-guia reforçada 2"	un	4,00	R\$ 9,62	R\$ 38,48	R\$ 38,48	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 38,48	0%
22.5	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2017	UN	33,00	R\$ 24,49	R\$ 808,17	R\$ 808,17	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	33,00	R\$ 808,17	0%
22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00	R\$ 307,60	R\$ 307,60	R\$ 307,60	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 307,60	0%
22.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	m³	26,18	R\$ 89,52	R\$ 2.343,63	R\$ 2.343,63	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	26,18	R\$ 2.343,63	0%
22.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_ 04/2016	m³	26,18	R\$ 41,63	R\$ 1.089,87	R\$ 1.089,87	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	26,18	R\$ 1.089,87	0%
22.9	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2017	UN	11,00	R\$ 94,61	R\$ 1.040,71	R\$ 1.040,71	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 1.040,71	0%
22.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2017	M	26,00	R\$ 35,07	R\$ 911,82	R\$ 911,82	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	26,00	R\$ 911,82	0%
22.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2017	M	261,00	R\$ 63,70	R\$ 16.625,70	R\$ 16.625,70	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	261,00	R\$ 16.625,70	0%
22.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2017	M	174,50	R\$ 82,38	R\$ 14.375,31	R\$ 14.375,31	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	174,50	R\$ 14.375,31	0%
22.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO DIÁMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_ 12/2020	UN	11,00	R\$ 45,07	R\$ 495,77	R\$ 495,77	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 495,77	0%
22.14	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	251,00	R\$ 13,53	R\$ 3.396,03	R\$ 3.396,03	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	251,00	R\$ 3.396,03	0%
22.15	SOLDA EXO TÉRMICA	UN	22,00	R\$ 37,07	R\$ 815,54	R\$ 815,54	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	22,00	R\$ 815,54	0%



23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							UN	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	% do Total		
	23.1	GERAIS												
23.1.1	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	R\$ 2.036,44	R\$ 2.036,44			R\$	-	0,00	R\$	1,00	R\$ 2.036,44	0%
23.1.2	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	38,34	R\$ 357,31	R\$ 13.699,27			R\$	-	0,00	R\$	38,34	R\$ 13.699,27	0%
23.1.3	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	26,89	R\$ 357,31	R\$ 9.608,07			R\$	-	0,00	R\$	26,89	R\$ 9.608,07	0%
23.1.4	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	m²	30,15	R\$ 126,19	R\$ 3.804,63			R\$	-	0,00	R\$	30,15	R\$ 3.804,63	0%
23.1.5	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	9,32	R\$ 205,07	R\$ 1.911,25			R\$	-	4,50	R\$	9,32	R\$ 988,44	48%
23.1.6	PEITORIL DE GRANITO L=15 cm	M	79,65	R\$ 92,81	R\$ 7.392,32	25,00		R\$	2.320,25	75,43	R\$	4,22	R\$ 391,66	95%
23.1.7	MAÇ-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 11/2016	UN	148,00	R\$ 34,77	R\$ 5.145,96			R\$	-	0,00	R\$	148,00	R\$ 5.145,96	0%
23.1.8	Brinquedo - Gira-gira (carrusel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", serigpark ou similar	un	1,00	R\$ 3.819,30	R\$ 3.819,30			R\$	-	0,00	R\$	1,00	R\$ 3.819,30	0%
23.1.9	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	R\$ 12.775,93	R\$ 12.775,93			R\$	-	0,00	R\$	1,00	R\$ 12.775,93	0%
23.1.10	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Alaiata Nova	un	1,00	R\$ 1.271,21	R\$ 1.271,21			R\$	-	0,00	R\$	1,00	R\$ 1.271,21	0%
23.1.11	Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	R\$ 732,57	R\$ 732,57			R\$	-	0,00	R\$	1,00	R\$ 732,57	0%
23.1.12	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	19,00	R\$ 184,29	R\$ 3.501,51			R\$	-	0,00	R\$	19,00	R\$ 3.501,51	0%
23.2	CAIXA D'ÁGUA - 15.000L													
23.2.1	Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto	UN	1,00	R\$ 46.413,61	R\$ 46.413,61			R\$	-	0,00	R\$	1,00	R\$ 46.413,61	0%
23.2.3	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	4,00	R\$ 106,31	R\$ 425,24			R\$	-	0,00	R\$	4,00	R\$ 425,24	0%
23.2.4	JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	m²	101,80	R\$ 58,96	R\$ 6.002,13			R\$	-	0,00	R\$	101,80	R\$ 6.002,13	0%
23.2.7	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	m²	50,90	R\$ 12,08	R\$ 614,87			R\$	-	0,00	R\$	50,90	R\$ 614,87	0%
24	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
24.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,00	R\$ 151,29	R\$ 19.365,12			R\$	-	127,00	R\$	1,00	R\$ 19.213,83	99%
25	SERVIÇOS FINAIS													
25.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO, AF_ 04/2019	m²	891,68	R\$ 2,18	R\$ 1.942,96			R\$	-	0,00	R\$	891,68	R\$ 1.942,96	0%
25.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	R\$ 1.751,58	R\$ 1.751,58			R\$	-	0,00	R\$	1,00	R\$ 1.751,58	0%
VALOR POR EXTENSÃO: CENTO E DEZESSETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E								R\$	117.391,65		R\$	1.451.722,26	64,08%	
SESSENTA E CINCO CENTAVOS								R\$	2.265.645,95		R\$	813.923,68	64,08%	

Handwritten signature
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ:19.650.110/0001-27
 Fabio da Silva Oliveira
 Sócio Administrador

Handwritten signature
 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LVQY9-6V5G4-NNZ2K-NGRC5

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LVQY9-6V5G4-NNZ2K-NGRC5>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

PRAÇA EVERALDO PROCÓPIO DE OLIVEIRA
QUEIMADAS
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº. 44/2024

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDEIMENTOS EIRELI		CPF/C.N.P.J 19.650.110/0001-27	C.G.A da Empresa 154100189
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA 25			
Bairro: CENTRO	CEP: 48860000	Município: QUEIMADAS	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.queimadas.ba.gov.br/>.
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
25/01/2024

Código de Controle da Certidão:

31680.44.20240125.S302.539

Certidão Válida até:23/07/2024





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20236795257

RAZÃO SOCIAL	
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
114.761.127 - BAIXADO	19.650.110/0001-27


Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 27/12/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.650.110/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:01:56 do dia 12/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2024.

Código de controle da certidão: **5428.A8D8.D542.DA2E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.650.110/0001-27
Certidão nº: 74798939/2023
Expedição: 27/12/2023, às 08:13:11
Validade: 24/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.650.110/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.650.110/0001-27
Razão Social: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA / CONTORNO / QUEIMADAS / BA / 48860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/01/2024 a 14/02/2024

Certificação Número: 2024011607500207961139

Informação obtida em 25/01/2024 08:43:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CNPJ 19.650.110/0001-27	Razão Social ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.23356.7062464-3	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000192444124			Valor Total do Documento 2.469,77

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	100,32			100,32
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	508,60			508,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.363,28			1.363,28
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	170,41			170,41
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	13,63			13,63
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	68,16			68,16
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	102,24			102,24
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	40,89			40,89
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	102,24			102,24
Totais		2.469,77			2.469,77

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

22/12/2023 14:28:36

85800000024 0 69770385240 0 19071623356 0 70624643286 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0 69770385240 0 19071623356 0 70624643286 5



CNPJ: 19.650.110/0001-27
Número: 07.16.23356.7062464-3
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 2.469,77

Pague com o PIX





Pagamento Darf Numerado



R\$ 2.469,77

Pagamento

Outras saídas



Sobre a transação

Data da transação

Segunda-feira, 15/01/2024

Adicione descrição

Ações



Precisa de ajuda?



Ofertas pra você

Cadastre sua chave no Inter e faça um Pix quando e onde quiser!



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período apuração	12/2023	Número do Recibo	50000198291290
Data/Hora da Transmissão	15/01/2024 11:54:49	Identificação da Apuração de Débitos	23443356035 / eSocial 63311444 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000192444124
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ALTO DA CHACRINHA	Número	25
Complemento	CASA	Bairro/Distrito	CONTORNO
Município	QUEIMADAS	UF	BA
CEP	48860000	Telefone	7582366267
Correio Eletrônico	LDACONTABIL@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FABIO DA SILVA OLIVEIRA	CPF	99725533534
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	568,42		
Deduções	Salário Família: 59,82		
Saldo a Pagar	508,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	170,41		
Saldo a Pagar	170,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	68,16		
Saldo a Pagar	68,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	102,24		
Saldo a Pagar	102,24		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	13,63		
Saldo a Pagar	13,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	40,89		
Saldo a Pagar	40,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	102,24		
Saldo a Pagar	102,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.363,28		
Saldo a Pagar	1.363,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	100,32		
Saldo a Pagar	100,32		



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	12/2023	Número do Recibo	0000050000198291290
Data/Hora da Transmissão	15/01/2024 11:54:49	Identificação da Apuração de Débitos	23443356035 / eSocial 63311444 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2023	568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00	0,00	508,60

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	1.363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,28
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,41
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	12/2023	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	12/2023	Número do Recibo	0000050000198291290
Data/Hora da Transmissão	15/01/2024 11:54:49	Identificação da Apuração de Débitos	23443356035 / eSocial 63311444 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 59,82 - Valor Utilizado: 59,82 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2023	568,42	59,82



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	12/2023	Número do Recibo	0000050000198291290
Data/Hora da Transmissão	15/01/2024 11:54:49	Identificação da Apuração de Débitos	23443356035 / eSocial 63311444 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2023	568,42	59,82	508,60

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	1.363,28	0,00	1.363,28
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	102,24	0,00	102,24

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	170,41	0,00	170,41
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	13,63	0,00	13,63
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	68,16	0,00	68,16
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	102,24	0,00	102,24
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	40,89	0,00	40,89

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	12/2023	100,32	0,00	100,32



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	12/2023	Número do Recibo	0000050000198291290
Data/Hora da Transmissão	15/01/2024 11:54:49	Identificação da Apuração de Débitos	23443356035 / eSocial 63311444 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	59,82	59,82	0,00





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 12/01/2024 15:08:29.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo MnQqMLOhRbG00000.SFP é:

534e1148-3d07-48d1-a563-95bffaec5304

Transmissor: CONTABILIDADE E AUDITORIA MANOEL LERCIVALDO LTDA:36858960000134

Inscrição do Transmissor: 36858960000134

Responsável: MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIR

Inscrição do Responsável: 55220762591

Competência: 12/2023

NRA: MnQqMLOhRbG00000

Base de Processamento: Santaluz / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: MANOEL LERCIVALDO CR

Telefone: 007532632584



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 12/01/2024

HORA: 15:07:08

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

10.224,60

DEPÓSITO

817,96

ENCARGOS FGTS

45,18

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

863,14

VALIDADE DO CÁLCULO: 15/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.




MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 12/01/2024
HORA: 15:07:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			19.650.110/0001-27				
577,60	1.567,77	0,00	59,82	0,00	0,00	2100 2.085,55	507 0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 12/01/2024

HORA: 15:07:08

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° CONTROLE: LeOdDk1Pgow0000-1 N° ARQUIVO: MnQqMLOhRbG0000-0
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075-32632584 CNAE: 4120400
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	577,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	1.363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,28
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	204,49
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	2.085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,55
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL						
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES						
TOTAL A RECOLHER	2.085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,55

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000089 631401802408 115684183816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADENILSON ARAUJO DOS SANTOS			128.02888.07-4		01/02/2019		01			07102
3.049,82	1.524,91		0,00	274,97					365,98	0,00
DENIS MARIO DA SILVA BORGES			203.63232.16-2		03/02/2021		01			07152
2.229,58	1.114,79		0,00	182,48					267,54	0,00
SAIONARE DE OLIVEIRA SANTOS			134.10368.42-5		01/10/2019		01			03516
1.537,00	768,50		0,00	120,15					184,44	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 3.408,20 0,00 577,60 817,96 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/01/2024
HORA: 15:07:08
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000089 631401802408 115684183816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507
TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: AHGiy9f1C3g0000-7

Nº ARQUIVO: MnQqMLOhRbG0000-0
INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25
CIDADE: QUEIMADAS

UF: BA

CEP: 48860-000

BAIRRO: CONTORNO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	6.816,40	3.408,20	6.816,40	0,00
TOTAIS:	3	6.816,40	3.408,20	6.816,40	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: AHGiY9f1C3g0000-7
 LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075 3263 2584 CNAE: 4120400

N° ARQUIVO: MnQqMLOhRbG0000-0
 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.085.55	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	577.60
SALÁRIO FAMÍLIA:	59.82	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:					

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA				25 ANOS:	0.00
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0		

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/01/2024
HORA: 15:07:08
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000089 631401802408 115684183816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LeOdDk1Pgow0000-1

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: MnQqMLOhRbG0000-0

INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25
CIDADE: QUEIMADAS

UF: BA


CEP: 48860-000

BAIRRO: CONTORNO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	6.816,40	3.408,20	6.816,40	0,00
TOTAIS:	3	6.816,40	3.408,20	6.816,40	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/01/2024
HORA: 15:07:08
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000089 631401802408 115684183816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: LeOdDk1Pgow0000-1 N° ARQUIVO: MnQqMLOhRbG0000-0
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 6.816,40
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 3.408,20
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 15/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
817,96	45,18	0,00	0,00	863,14



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Nº DE CONTROLE: LeOdDk1Pgow0000-1 N° ARQUIVO: MnQqMLOhRbG0000-0
 COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075 3263 2584 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.085.55	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	577.60
SALÁRIO FAMÍLIA:	59.82	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00


COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000089 631401802408 115684183816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

Nº ARQUIVO: MnQqMLOhRbG0000-0

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

Nº CONTROLE: LeOdDk1Pgow0000-1

COD REC: 150 COMP: 12/2023

TOMADOR/OBRA : ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

Nº CONTROLE: AHGiy9f1C3g0000-7

LOGRADOURO

BAIRRO

CIDADE

CEP

UF

ALTO DA CHACRINHA 25

CONTORNO

QUEIMADAS

48860000

BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	6.816,40	REM SEM 13º SALÁRIO	6.816,40
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	3.408,20
		DEPÓSITO	817,96
		ENCARGOS FGTS	45,18
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	6.816,40	REM SEM 13º SALÁRIO	6.816,40
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	3.408,20
CONTR SEGURADOS DEVIDA	577,60	DEPÓSITO	817,96
VAL DEVIDO PREV SOC	2.085,55	ENCARGOS FGTS	45,18
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8580000000089 631401802408 115684183816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00


Nº ARQUIVO: MnQqMLOhRbG0000-0
Nº CONTROLE: LeOdDk1Pgow0000-1
COD REC: 150 COMP: 12/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13º SALÁRIO	6.816,40
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	577,60
VAL DEVIDO PREV SOC	2.085,55
TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	6.816,40
REM 13º SALÁRIO	3.408,20
DEPÓSITO	817,96
ENCARGOS FGTS	45,18
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAL A RECOLHER 863,14





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 08/02/2024 10:38:36.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Cs2dBX1HqJP00005.SFP é:

61478dd6-b50c-4599-9fb2-24522270410f

Transmissor: CONTABILIDADE E AUDITORIA MANOEL LERCIVALDO LTDA:36858960000134

Inscrição do Transmissor: 36858960000134

Responsável: MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIR

Inscrição do Responsável: 55220762591

Competência: 01/2024

NRA: Cs2dBX1HqJP00005

Base de Processamento: Valente / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: MANOEL LERCIVALDO CR

Telefone: 007532632584



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período apuração	01/2024	Número do Recibo	50000204525815
Data/Hora da Transmissão	08/02/2024 13:03:15	Identificação da Apuração de Débitos	23954156983 / eSocial 64782547 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000200441639
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ALTO DA CHACRINHA	Número	25
Complemento	CASA	Bairro/Distrito	CONTORNO
Município	QUEIMADAS	UF	BA
CEP	48860000	Telefone	7582366267
Correio Eletrônico	LDACONTABIL@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FABIO DA SILVA OLIVEIRA	CPF	99725533534
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	542,24		
Deduções	Salário Família: 45,86 Retenção Lei 9711/98: 496,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.317,17		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.317,17		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	98,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 98,78		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	164,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 164,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	13,17		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13,17		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	65,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 65,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	98,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 98,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	39,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 39,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	50,16		
Saldo a Pagar	50,16		



CNPJ 19.650.110/0001-27	Razão Social ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24026.2821864-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000200441639			Valor Total do Documento 2.344,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	50,16			50,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	496,38			496,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.317,17			1.317,17
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	164,64			164,64
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	13,17			13,17
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	65,85			65,85
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	98,78			98,78
	01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	39,51			39,51
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	98,78			98,78
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		2.344,44			2.344,44

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000023 6 44440385240 1 51071624026 1 28218640750 2



CNPJ: 19.650.110/0001-27
Número: 07.16.24026.2821864-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 2.344,44

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	19.650.110/0001-27
Nome	ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período de apuração	01/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	23954156983 / eSocial 64782547 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 542,24	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.415,95	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 381,95	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 50,16	R\$ 50,16
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.390,30	R\$ 50,16

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.


Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FABIO DA SILVA OLIVEIRA
CPF	997.255.335-34
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/02/2024 13:03:15
Nº do recibo de entrega	0000050000204525815
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	552.207.625-91



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	0000050000204525815
Data/Hora da Transmissão	08/02/2024 13:03:15	Identificação da Apuração de Débitos	23954156983 / eSocial 64782547 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	542,24	542,24	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.317,17	1.317,17	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	98,78	98,78	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	164,64	164,64	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	13,17	13,17	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	65,85	65,85	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	98,78	98,78	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	39,51	39,51	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	01/2024	50,16	0,00	50,16



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	0000050000204525815
Data/Hora da Transmissão	08/02/2024 13:03:15	Identificação da Apuração de Débitos	23954156983 / eSocial 64782547 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	22.711,26	2.294,28	20.416,98
Salário Família	45,86	45,86	0,00



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	0000050000204525815
Data/Hora da Transmissão	08/02/2024 13:03:15	Identificação da Apuração de Débitos	23954156983 / eSocial 64782547 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86	0,00	496,38	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,17	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,64	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	01/2024	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16




**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	0000050000204525815
Data/Hora da Transmissão	08/02/2024 13:03:15	Identificação da Apuração de Débitos	23954156983 / eSocial 64782547 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 45,86 - Valor Utilizado: 45,86 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	542,24	45,86

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 22.711,26 - Valor Utilizado: 2.294,28 = Saldo Disponível: 20.416,98)			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	542,24	496,38
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.317,17	1.317,17
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	164,64	164,64
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	13,17	13,17
118101 - CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	65,85	65,85
118401 - CP TERCEIROS - SESI	01/2024	98,78	98,78
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	39,51	39,51
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	98,78	98,78



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° ARQUIVO: Cs2dBX1HqJP0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: HOov5yxcPbg0000-8
TOMADOR/OBRA : ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° CONTROLE: MvEva084Xo80000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
ALTO DA CHACRINHA 25 CONTORNO QUEIMADAS 48860000 BA

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.457,77	REM SEM 13° SALÁRIO	5.279,40
REM BASE CALC 13° SAL	128,08	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.457,77	REM SEM 13° SALÁRIO	5.279,40
REM BASE CALC 13° SAL	128,08	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	555,42	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.024,30	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	2



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 01/2024

Nº ARQUIVO: Cs2dBX1HqJP0000-5

Nº CONTROLE: HOov5yxcPbg0000-8

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13º SALÁRIO	6.457,77
REM BASE CALC 13º SAL	128,08
CONTR SEGURADOS DEVIDA	555,42
VAL DEVIDO PREV SOC	2.024,30
TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	5.279,40
REM 13º SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	0,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2
TOTAL A RECOLHER	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/02/2024
HORA: 10:37:32
PÁG : 0001/0007


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SAIONARE DE OLIVEIRA SANTOS 1.178,37	128,08	134.10368.42-5 128,08		01/10/2019 97,97	01		23/01/2024 I1 0,00	03516 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADENILSON ARAUJO DOS SANTOS			128.02888.07-4		01/02/2019				07102
		0,00	0,00	274,97				0,00	0,00
DENIS MARIO DA SILVA BORGES			203.63232.16-2		03/02/2021				07152
		0,00	0,00	182,48				0,00	0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 6.457,77

128,08

128,08

555,42

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/02/2024
HORA: 10:37:32
PÁG: 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: MvEva084Xo80000-5
LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000

N° ARQUIVO: Cs2dBX1HqJP0000-5
INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.279,40	0,00	6.457,77	128,08
TOTAIS:	3	5.279,40	0,00	6.457,77	128,08



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: MvEva084Xo80000-5

N° ARQUIVO: Cs2dBX1HqJP0000-5
 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075 3263 2584 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.024.30	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	555.42
SALÁRIO FAMÍLIA:	45.86	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
-------------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	P2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/02/2024
HORA: 10:37:32
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: HOov5yxcPbg0000-8 N° ARQUIVO: Cs2d BX1HqJP0000-5
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FFAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	6.457,77	128,08	6.457,77	128,08
TOTAIS:	3	6.457,77	128,08	6.457,77	128,08



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/02/2024
HORA: 10:37:32
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Nº DE CONTROLE: HOov5yxcPbg0000-8	Nº ARQUIVO: Cs2d BX1HqJP0000-5
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100	FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25	BAIRRO: CONTORNO	CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000		CNAE: 4120400

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	5.279,40
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/02/2024
HORA: 10:37:32
PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: HOov5yxcPbg0000-8 N° ARQUIVO: Cs2dBX1HqJP0000-5
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
TOMADOR/OBRA: FAP:1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075 3263 2584 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.024.30	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	555.42
SALÁRIO FAMÍLIA:	45.86	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:		0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0.00
15 ANOS:	0.00	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 08/02/2024
HORA: 10:37:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			19.650.110/0001-27		0000	2100	507
555,42	1.514,74	0,00	45,86	0,00	0,00	2.024,30	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)


DATA: 08/02/2024
 HORA: 10:37:32
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° ARQUIVO: CsZdBX1HqJF0000-5
 COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,00 FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: N° CONTRÓLE: H00v5yxcPbg0000-8 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075-32632584 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	555,42
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	1.317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	197,57
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	45,86	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,30
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,30

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO REGISTRO DE DÍVIDA DEBIDA DECORRENTE, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE APURAÇÃO DE DÍVIDA DEBIDA DECORRENTE, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 11ª MEDIÇÃO – CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA VÁRZEA DA PEDRA,
CONFORME P. ADM 215/2022, CONTRATO Nº 255/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

DATA: 26/01/2024



FOTO 135: CONTRAPISO



FOTO 136: CONTRAPISO

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.002.177.8





FOTO 137: REDE HIDROSSANITÁRIA

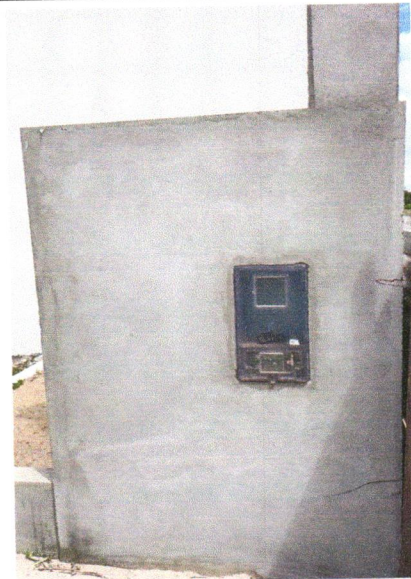


FOTO 138: PADRÃO ENTRADA ENERGIA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.577.8





FOTO 139: SOLEIRA DE GRANITO



FOTO 140: SOLEIRA DE GRANITO

Tony Félix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.000.177.8





Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.000/77.8





FOTO 143: INSTALAÇÃO ELÉTRICA

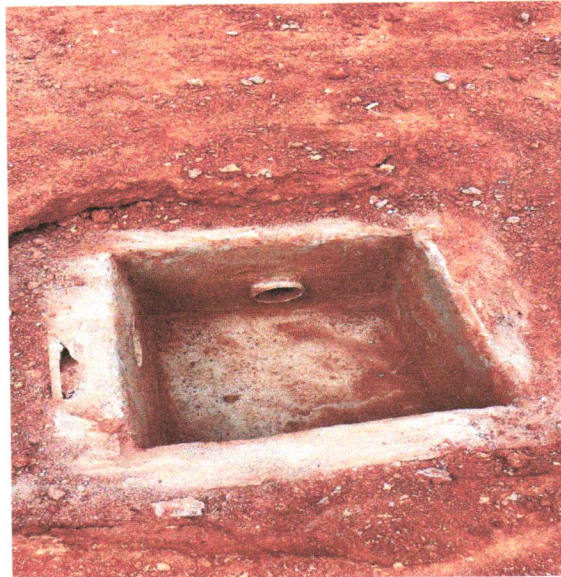


FOTO 144: CAIXA DE PASSAGEM ESGOTO

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.000.377.8





FOTO 145: CAIXA DE PASSAGEM ESGOTO



FOTO 146: CAIXA DE PASSAGEM ESGOTO

Tony Feijó Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.000.277.8



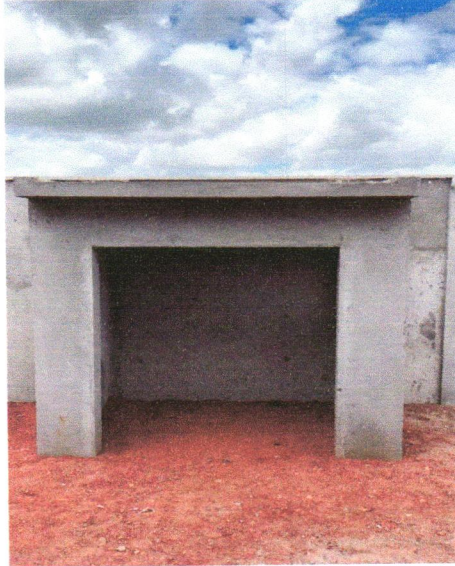


FOTO 147: ABRIGO DE GÁS

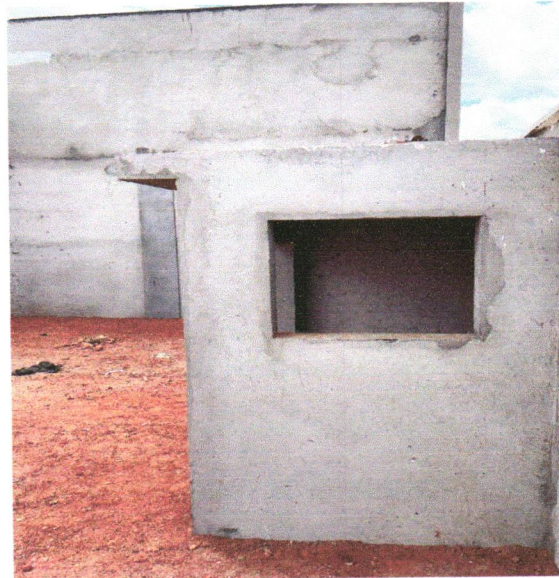


FOTO 148: ABRIGO DE GÁS

Tony F. Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA. 032.000.177.8





FOTO 149: ASSENTAMENTO PISO CERÂMICO



FOTO 150: ASSENTAMENTO PISO CERÂMICO

Ar Trade
CRECI 03200/07.8






FOTO 151: ASSENTAMENTO PISO CERÂMICO E RODAPÉ



FOTO 152: INSTALAÇÃO ELÉTRICA – QUADRO E ATERRAMENTO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8





Tony Félix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.877.8



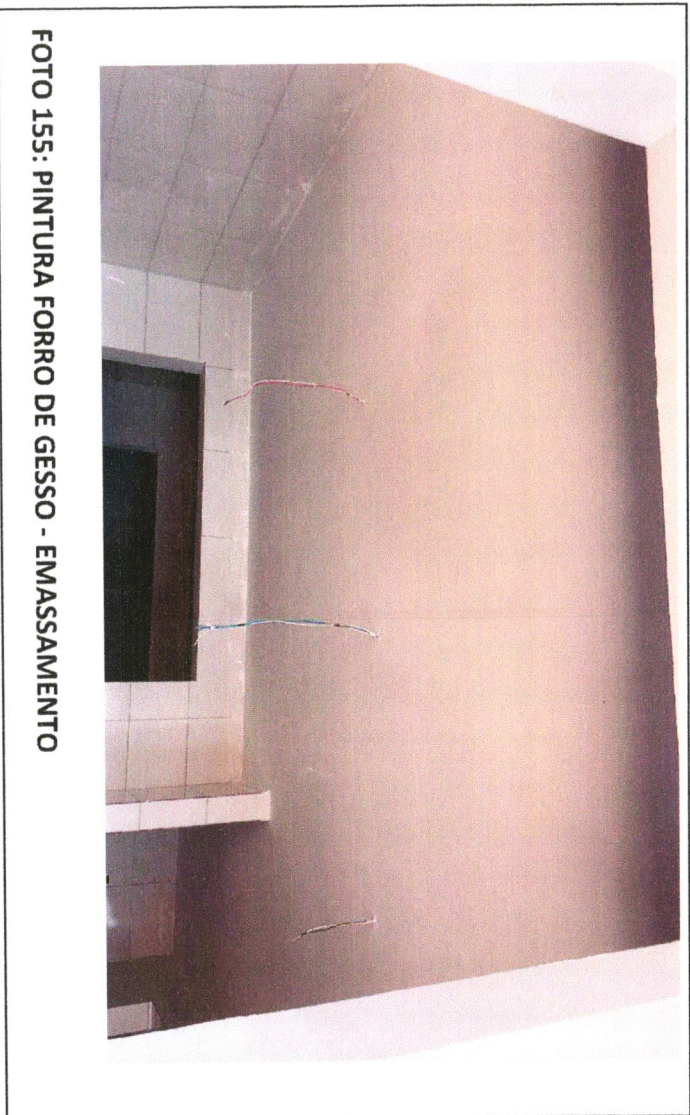


FOTO 155: PINTURA FORRO DE GESSO - EMASSAMENTO

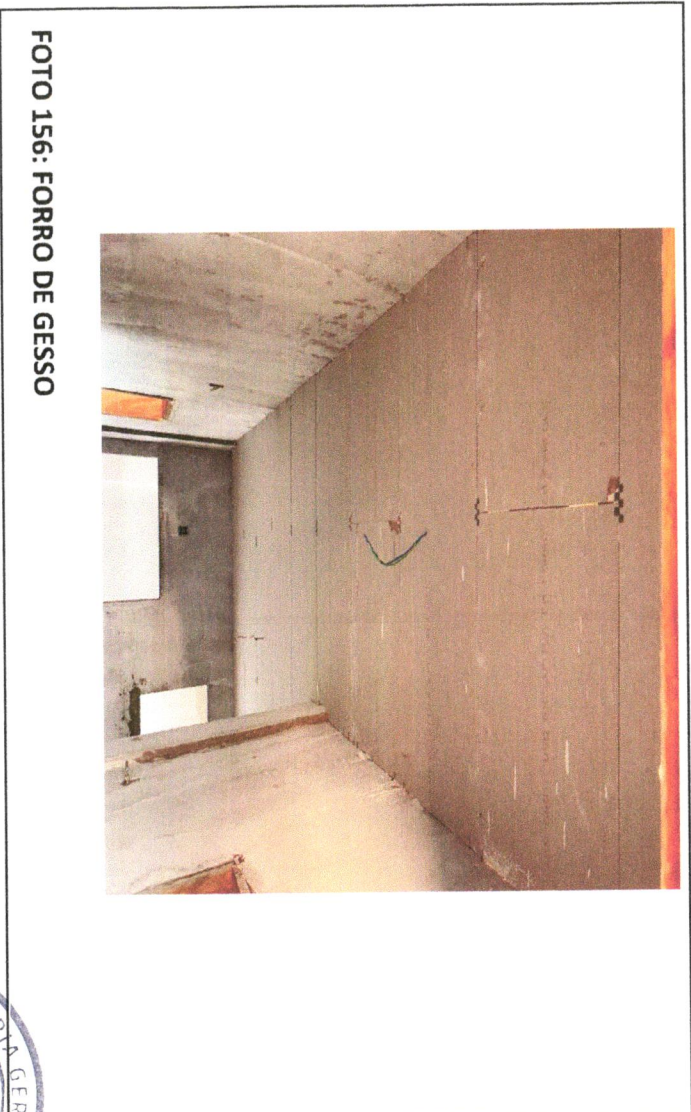



FOTO 156: FORRO DE GESSO

Tomy F. A. Artreide
Engenheiro
CREA/BA: 03416
778



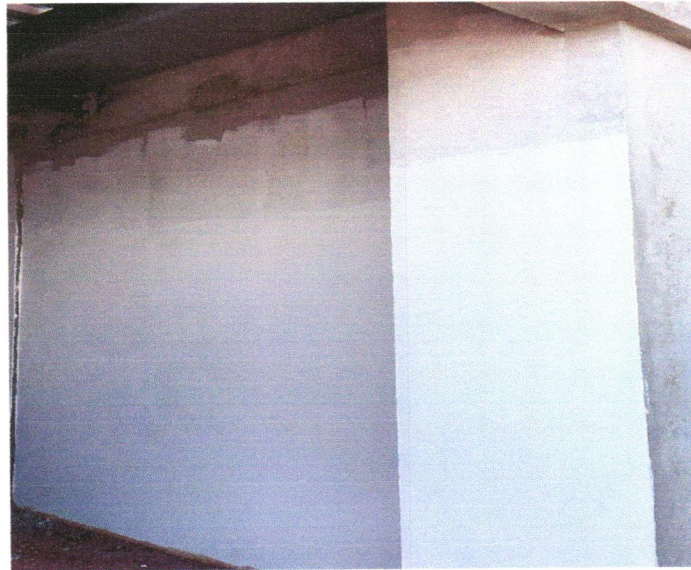


FOTO 157: PINTURA ALVENARIA - EMASSAMENTO

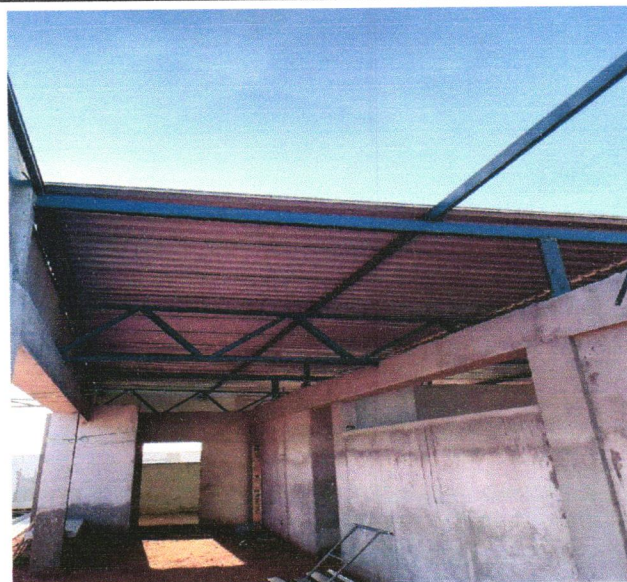


FOTO 158: ESTRUTURA METÁLICA

Tony Felix Almeida
Engenheiro Civil
CREA BA. 052.000/77.8





FOTO 159: ESTRUTURA METÁLICA



FOTO 160: ESTRUTURA METÁLICA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.013-377.8




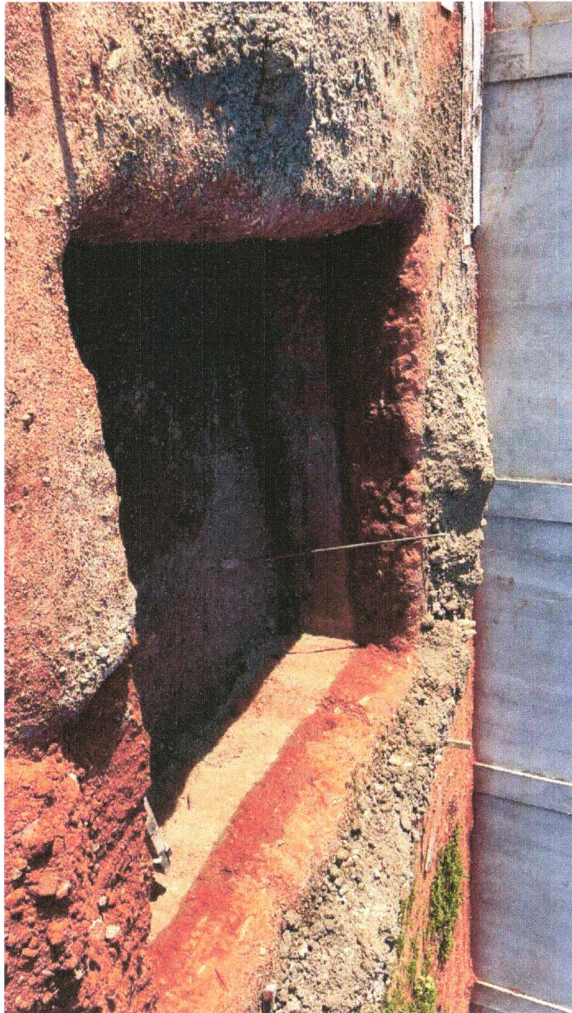


FOTO 161: FUNDAÇÃO CASTELA D'ÁGUA

Tony F. A. Andrede
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.050.577.8





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: K7XWD-ED6BD-ZPYS7-3Z7KV

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/K7XWD-ED6BD-ZPYS7-3Z7KV>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

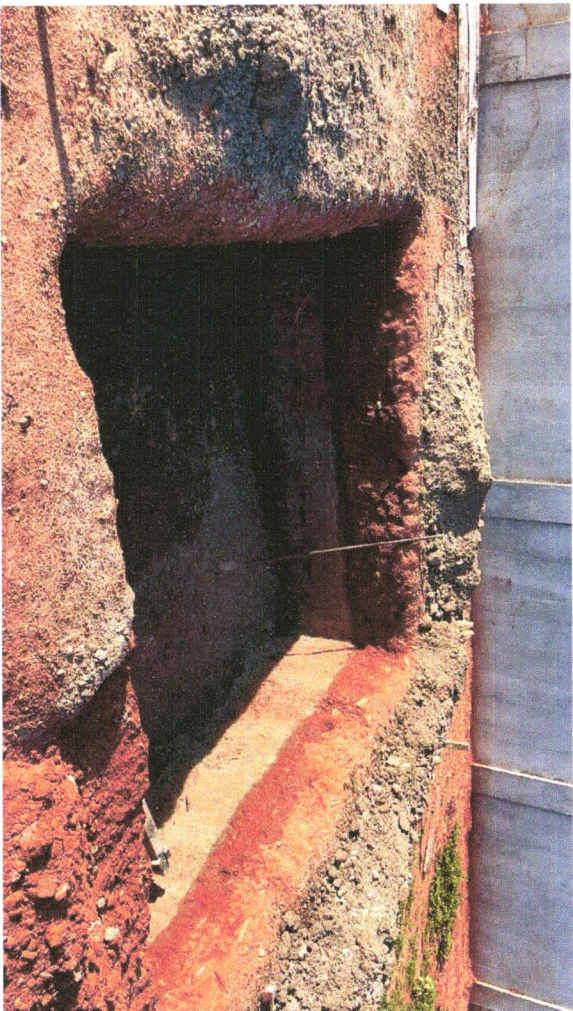


FOTO 161: FUNDAÇÃO CASTELA D'ÁGUA


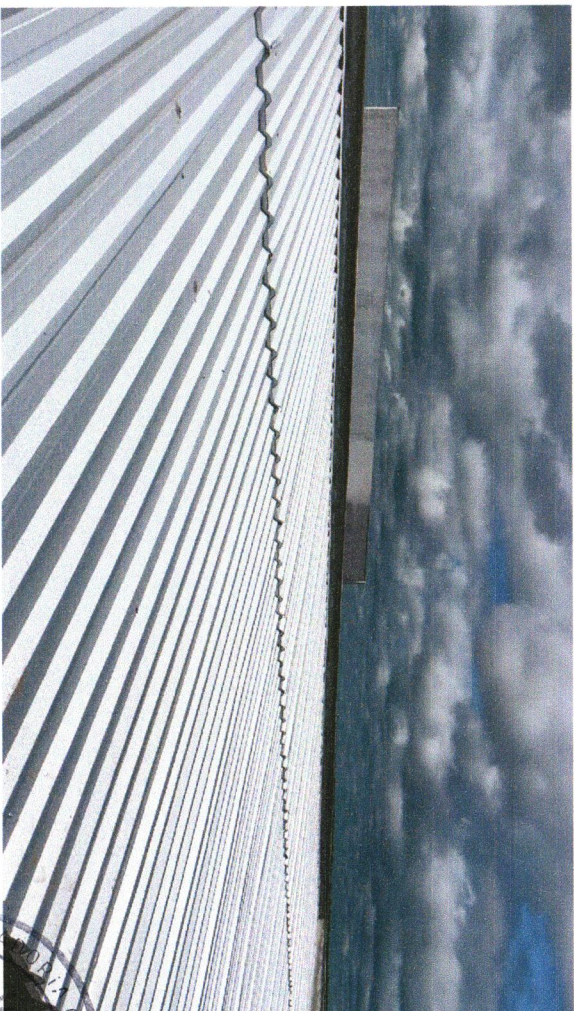


FOTO 162: COBERTURA METÁLICA



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA/BA. 052161-7/78



Tony F. M. André de
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.089.377.8



FOTO 165: PEITORIL

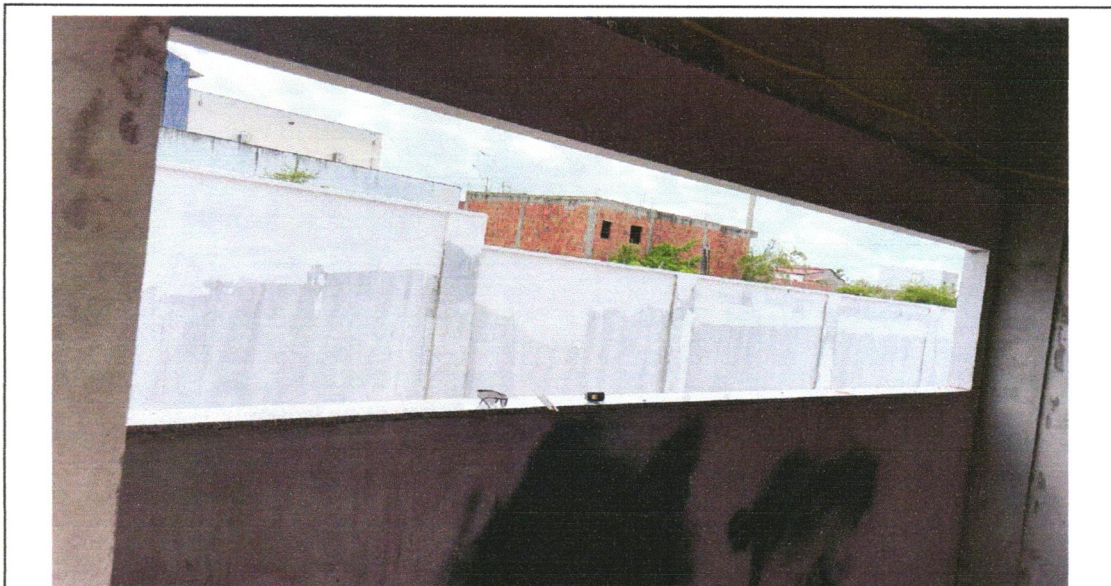


FOTO 166: PEITORIL

Tony Ferreira Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA. 052.000.000/77.8



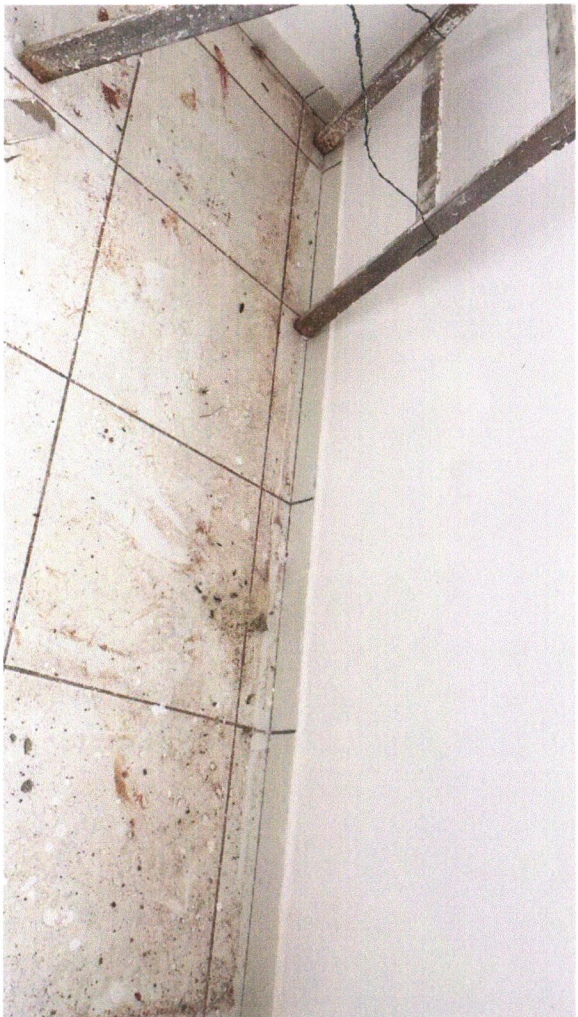


FOTO 167: RODAPÊ



FOTO 168: RODAPÊ



Engenheiro
CNEA-BA 0521
778



FOTO 169: FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA

Taoy Felix N. Costa
Engenheira
CREA-BA 052.033-8/778





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QCDTT-TL5KT-QEWB5-UF6RC

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/QCDTT-TL5KT-QEWB5-UF6RC>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>






RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	438
-----	------------

ANOTAÇÕES
<p>SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA</p>

Período:	13/01/2024
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	0
TOTAL	23



ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 CREA-BA: 052.069.677.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

[19.650.110/0001-27]
 ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **439**

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA


Período: 14/01/2024

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	0
TOTAL	23



ASSINATURAS:

Tony Felly Andrade
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8

Z
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27
**ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI**
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **440**

ANOTAÇÕES

Período: 15/01/2024

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS
- CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA
- CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE KIT PORTA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)
- CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS
- CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
- CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	0
TOTAL	23



ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000.677.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 [19.650.110/0001-27]
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 [48.860-000 - QUEIMADAS-BA]



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	441
-----	------------

ANOTAÇÕES	
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:	<p>CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS</p> <p>CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS</p> <p>CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA</p> <p>CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)</p> <p>CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO</p> <p>CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE KIT PORTA</p> <p>CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)</p> <p>CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS</p> <p>CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</p> <p>CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</p> <p>CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA</p>

Período:	16/01/2024
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	0
TOTAL	23


ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
CREA-BA: 052.055.577.8

8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
48.860-000 - QUEIMADAS-BA



Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/83GEF-H8WCA-EC9BE-PDB6W>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **442**

ANOTAÇÕES

Período: 17/01/2024

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS
- CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA
- CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE KIT PORTA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)
- CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS
- CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
- CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	0
TOTAL	23



ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 CREA-BA: 052.000.077.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **443**

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS
 CONCLUSÃO DO ATERRO DA ÁREA EXTERNA
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE KIT PORTA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA


Período: 18/01/2024

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	0
TOTAL	23



ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA/BA: 052.000.077.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	444
-----	------------

ANOTAÇÕES


Período:	19/01/2024
----------	------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE KIT PORTA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)
 CONCLUSÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	0
TOTAL	23



ASSINATURAS:

Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CPF: 000.000.000-00
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

[Assinatura]
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

[19.650.110/0001-27]
ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 [48.860-000 - QUEIMADAS-BA]

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://validade/83GEF-H8WCA-EC9BE-PDB6W>.
 Registro de Imóveis do Brasil



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **445**

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA


Período: 20/01/2024

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	0
TOTAL	23



ASSINATURAS:

Felix Andrade
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 Engenheiro
 CREA-BA: 052.000.077.8

[Signature]
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI


[19.650.110/0001-27]
ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 [48.860-000 - QUEIMADAS-BA]



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 446
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período:	
DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA		21/01/2024	
		Condição do Tempo	
		Manhã	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		Tarde	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		Noite	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
Função	Qtde.		
Engenheiro Civil	1		
Administrativo	1		
Mestre de Obras	1		
Pedreiro	6		
Ajudante Comum	10		
Armador	2		
Serralheiro	0		
Eletricista	2		
Gesseiro	0		
TOTAL	23		



ASSINATURAS:

 _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA Engenheiro CREA-BA: 052.035.577.8	 _____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
--	--

[19.650.110/0001-27]
ARCO CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 [48.860-000 - QUEIMADAS-BA]





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	447
-----	------------

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)
 CONCLUSÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIL DE GRANITO
 CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE KIT PORTA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 INÍCIO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO


Período:	22/01/2024
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	0
TOTAL	23

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 CREA-BA: 052.099.877.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/83GEF-H8WCA-EC9BE-PDB6W>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **448**

ANOTAÇÕES

Período: 23/01/2024

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:


- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
- CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)
- CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
- CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	0
TOTAL	23



ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CPF: 052.069.677.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 [19.650.110/0001-27]
ARCO CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 [48.860-000 - QUEIMADAS-BA]





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	449
-----	------------

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
 CONTINUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO

Período:	24/01/2024
----------	------------

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	0
TOTAL	23



ASSINATURAS:

 Tony F. Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 152.000/177.8

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

[19.650.110/0001-27]
ARCO CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 [48.860-000 - QUEIMADAS-BA]





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **450**

ANOTAÇÕES

Período: 25/01/2024

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)
 CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
 CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	0
TOTAL	23



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 Tony F...
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **451**

ANOTAÇÕES

Período: 26/01/2024

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RUFOS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO DA PINTURA (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA)
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	25



ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 83GEF-H8WCA-EC9BE-PDB6W

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/83GEF-H8WCA-EC9BE-PDB6W>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

