



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 215-2022

EMPENHO: 59 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 357 Data do Sub-Empenho: 20/03/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR
Nome: 4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25 Complemento: CASA
Bairro: CONTORNO Cidade: Estado:
CNPJ: 19.650.110/0001-27 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 39975113-4 Agência: 0001 Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1001.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 07/03/2024

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 365 - Educação Infantil
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1540 - (CO 1070) - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI	Nº Lic.: 008-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: -	Contrato: 255-2022	289.902,67	165.646,94	124.255,73
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA, CONTRATO Nº255-2022, LICITAÇÃO Nº008-2022RDC, NUMERO DA OBRA 047/2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 13, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/03/2024 A 18/03/2024. NFS-e 20247.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
121.894,56	121.894,56	0,00

Data do Empenho: 07/03/2024 Data do Liquidação: 20/03/2024

RETENÇÕES



Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1540	8.045,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00.007	IRRF - Fonte 1540	1.462,73
2.1.8.8.1.01.08.00.00.007	ISS - Fonte 1540	3.656,84
## Cento e oito mil e setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos ##		Valor Retido 13.164,61
		Valor Líquido 108.729,95

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	19/03/2024	20247	U			121.894,56

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	121.894,56

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/03/2024.</p> <p align="center"></p> <p align="center">ANA QUERCIA COSTA DO SANTOS Secretária de Educação CPF: 042.037.865-09</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/03/2024, podendo efetuar o pagamento.</p> <p align="center"></p> <p align="center">NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408</p>
---	---

3467002





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 215-2022

EMPENHO: 59 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 357	Data do Sub-Empenho: 20/03/2024	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	4260 - ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		
Endereço:	R ALTO DA CHACRINHA, 25	Tipo Pessoa: Jurídica	
Bairro:	CONTORNO	Complemento: CASA	Estado:
CNPJ:	19.650.110/0001-27	Insc. Estadual:	Cidade:
Conta Corrente:	39975113-4	Agência: 0001	CPF:
			RG:
			Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 07/03/2024
Reduzido:	1001.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	

Unidade:	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função:	12 - Educação		
Sub-Função:	365 - Educação Infantil		
Programa:	004 - EDUCALUZ		
Ação:	1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil		
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes		
Fonte:	1540 - (CO 1070) - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)		


Modalidade:	Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC	Nº Lic.:	008-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	-	Contrato:	255-2022	289.902,67	165.646,94	124.255,73
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA, CONTRATO Nº255-2022, LICITAÇÃO Nº008-2022RDC.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	121.894,56	121.894,56	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	121.894,56	121.894,56

## Cento e vinte e um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos ##	121.894,56
--	-------------------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/03/2024. <hr/> ANA QUERCIA COSTA DO SANTOS Secretária de Educação CPF: 042.037.865-09	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/03/2024 <hr/> NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
---	---



3467002



PREFEITURA DE
QUEIMADAS
FLOR PRIMEIRA DO SISAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e


Founden

Número da Nota:
20247
Data da Competência:
Março/2024
Data e Hora da Emissão:
19/03/2024 07:28:00
Código Verificação:
814BEE901

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
19.650.110/0001-27
Telefone:
753644155...
Nome/Razão Social:
ARCO CONSTRUCOES E
EMPREENDIMIENTOS EIRELI
Endereço:
RUA ALTO DA CHACRINHA N° 25 BAIRRO CENTRO CIDADE: QUEIMADAS - BA
E-mail:
ARCOCONSTRUCOESEMPREENDIMIENTOS@GMAIL.COM

Inscrição Municipal:
154100189
Inscrição Estadual:
Nome Fantasia:



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
13807870000119
Telefone:
Nome/Razão Social:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
Endereço:
AV GETULIO VARGAS N° SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000
E-mail:
secretariafinancas2021@outlook.com

Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO N° 255/2022 SENDO 60% SERVIÇOS (R\$ 73.136,74) E 40% MATERIAIS (R\$ 48.757,82) PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 215/2022 NUMERO DA OBRA 047/2022 PERÍODO 01/03/2024 A 18/03/2024. BM 13

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 19/03/24 *Tony Felix Andrade*
Assinatura

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 121.894,56

CNAE - 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG



VALOR SERVIÇOS: R\$ 121.894,56	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 73.136,56	DESC. INCOND: BASE DE R\$ 0,00	CÁLCULO: R\$ 48.758,00	ALÍQUOTA: 5%	VALOR ISS: R\$ 0,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 2.437,90	DESC. COND: R\$ 0,00
VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 5.363,36	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 114.093,30	

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO EIRELI	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO SANTALUZ - BA	LOCAL INCIDÊNCIA SANTALUZ - BA	ISS Retido Sim
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---	-----------------------------------	-------------------

Observação:

- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 381386		CONTRIBUINTE 20260 - Arco Construções Empreendimentos Eireli			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Alto da Chacrinha					NÚMERO: 25	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: QUEIMADAS	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 19.650.110/0001-27			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 73.136,74	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 3.656,84	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 3.656,84		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 30/04/2024	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 20/03/2024 11:35:36	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 20247 - DATA DE EMISSÃO: 19/03/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.656,84		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.656,84		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8175000036 . 6 56843906202 . 3 40430010500 . 8 00038138612 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000036 . 6 56843906202 . 3 40430010500 . 8 00038138612 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Março	Nº DAM: 381386	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 20/03/2024 11:35:36	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.656,84
Arco Construções Empreendimentos Eireli			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.656,84





I.R.R.F

Nº DAM: 381385	CONTRIBUINTE 20260 - Arco Construções Empreendimentos Eireli		INSCRIÇÃO: 20260	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Rua Alto da Chacrinha				NÚMERO: 25
COMPLEMENTO:		BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: QUEIMADAS	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 19.650.110/0001-27	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 1.462,73	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 1.462,73	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 1.462,73
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 20/03/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 20/03/2024 11:27:25	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.462,73
Valor do Tributo: 1.462,73	Vir. Devido sem Desconto (VD): 1.462,73		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Taxa de Expediente: 0,00	Vir. do Desconto: 0,00		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
Valor de Base Cálculo: 1.462,73	Vir. Devido com Desconto: 1.462,73		(+) MULTA DE MORA - R\$	
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 20247 -Data de emissão: 19/03/2024			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(-) VALOR A PAGAR - R\$	1.462,73



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000014 . 6 62733906202 . 8 40430010100 . 7 00038138507 . 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000014 . 6 62733906202 . 8 40430010100 . 7 00038138507 . 9

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 381385	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 20/03/2024 11:27:25	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO: 20260			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.462,73
Arco Construções Empreendimentos Eireli			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.462,73





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

PRAÇA EVERALDO PROCÓPIO DE OLIVEIRA
QUEIMADAS
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 44/2024

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS EIRELI		CPF/C.N.P.J 19.650.110/0001-27	C.G.A da Empresa 154100189
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA 25			
Bairro: CENTRO	CEP: 48860000	Município: QUEIMADAS	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.queimadas.ba.gov.br/>.

Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:

25/01/2024

Código de Controle da Certidão:

31680.44.20240125.S302.539

Certidão Válida até:23/07/2024





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20240878723

RAZÃO SOCIAL	
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
114.761.127 - BAIXADO	19.650.110/0001-27

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/02/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.650.110/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:35:52 do dia 29/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2024.

Código de controle da certidão: **3EC3.10ED.20E0.A98D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.650.110/0001-27
Certidão nº: 13856622/2024
Expedição: 29/02/2024, às 15:34:49
Validade: 27/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.650.110/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.650.110/0001-27
Razão Social: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA / CONTORNO / QUEIMADAS / BA / 48860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/03/2024 a 12/04/2024

Certificação Número: 2024031405090516256560

Informação obtida em 19/03/2024 07:21:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 02/2024

Nome/Razão Social	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF	19.650.110/0001-27
CNO	
Número da Declaração	320240220242692046943
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000209609679
Data da Transmissão	27/02/2024
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	02/2024	Número do Recibo	0000050000209609679
Data/Hora da Transmissão	27/02/2024 15:22:05	Identificação da Apuração de Débitos	24487000875 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2024	511,42	0,00	511,42

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	1.189,65	0,00	1.189,65
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	89,22	0,00	89,22

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	148,70	0,00	148,70
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	11,89	0,00	11,89
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	59,48	0,00	59,48
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	89,22	0,00	89,22
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	35,68	0,00	35,68

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	02/2024	84,51	0,00	84,51



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período apuração	02/2024	Número do Recibo	50000209609679
Data/Hora da Transmissão	27/02/2024 15:22:05	Identificação da Apuração de Débitos	24487000875 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ALTO DA CHACRINHA	Número	25
Complemento	CASA	Bairro/Distrito	CONTORNO
Município	QUEIMADAS	UF	BA
CEP	48860000	Telefone	7582366267
Correio Eletrônico	LDACONTABIL@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FABIO DA SILVA OLIVEIRA	CPF	99725533534
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	148,70		
Saldo a Pagar	148,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	59,48		
Saldo a Pagar	59,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	89,22		
Saldo a Pagar	89,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	11,89		
Saldo a Pagar	11,89		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	35,68		
Saldo a Pagar	35,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	89,22		
Saldo a Pagar	89,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.189,65		
Saldo a Pagar	1.189,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	511,42		
Saldo a Pagar	511,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	84,51		
Saldo a Pagar	84,51		



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	19.650.110/0001-27
Nome	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24487000875 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 511,42	R\$ 511,42
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.278,87	R\$ 1.278,87
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 344,97	R\$ 344,97
IRRF	R\$ 84,51	R\$ 84,51
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.219,77	R\$ 2.219,77

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.


Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FABIO DA SILVA OLIVEIRA
CPF	997.255.335-34
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	27/02/2024 15:22:05
Nº do recibo de entrega	0000050000209609679
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	552.207.625-91



SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 04/03/2024 HORA: 15:50:09

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2024

ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ALTO DA CHACRINHA 25

CONTORNO

48860-000

QUEIMADAS

BA

(0075) 32632584

5 - IDENTIFICADOR 19.650.110/0001-27

6 - VALOR DO INSS(+) 1.899,87

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.899,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000180

998702702100

019650110006

012720240291

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 04/03/2024 HORA: 15:50:09

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2024

ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ALTO DA CHACRINHA 25

CONTORNO

48860-000

QUEIMADAS

BA

(0075) 32632584

5 - IDENTIFICADOR 19.650.110/0001-27

6 - VALOR DO INSS(+) 1.899,87

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.899,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000180

998702702100

019650110006

012720240291



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/03/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 15:50:09

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 150

FPAS: 507


SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	5.948,27
DEPÓSITO	475,86
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	475,86

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:50:09
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA						
531,78	1.368,09	0,00	19.650.110/0001-27	0000	2100	507
			0,00	0,00	1.899,87	0,00



RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8589000000042 758601802400 307686180816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA
 EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA
 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 FAP: 1,00
 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13º SAL
 REM 13º SAL
 BASE CÁL 13º SAL
 PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO CAT
 OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO
 CBO
 JAM

ADENILSON ARAUJO DOS SANTOS	3.049,82	0,00	128.02888.07-4	0,00	01/02/2019	01	274,97	243,99	07102
DENIS MARIO DA SILVA BORGES	2.898,45	0,00	203.63232.16-2	0,00	03/02/2021	01	256,81	231,87	07152

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 5.948,27

0,00

0,00

531,78

475,86

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000042 758601802400 307686180816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° ARQUIVO: OxtCMpRRgz00000-4
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FFAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: F8XcvA01PiL0000-5 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	5.948,27	0,00	5.948,27	0,00
TOTAIS:	2	5.948,27	0,00	5.948,27	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: F8XcVÅ01PiL0000-5
 LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREFONDERANTE: 4120400
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075 3263 2584 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.899.87 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 531.78
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:50:09
PÁG : 0004/0006


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858900000042 758601802400 307686180816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: CU78nFkEpjL0000-9 N° ARQUIVO: OxtCMpRRqz00000-4
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	5.948,27	0,00	5.948,27	0,00
TOTAIS:	2	5.948,27	0,00	5.948,27	0,00





RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000042 758601802400 307686180816 965011000017

Nº ARQUIVO: OxtCMpRRqz00000-4
EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Nº DE CONTROLE: C078nFKepjL0000-9
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO 5.948,27
REMUNERACÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024
DEPÓSITO FGTS 475,86
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 475,86

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:50:09
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

Nº ARQUIVO: oxtcmprRqz00000-4
EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Nº DE CONTROLE: C078nFKepjL0000-9
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075 3263 2584 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.899,87 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 531,78
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAIS: 0,00 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

RETEÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0,00
QUANTIDADE: 0,00 25 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	0	31:	0	32:	0	33:	0	34:	0	35:	0	36:	0	37:	0	38:	0	39:	0	40:	0	41:	0	42:	0	43:	0	44:	0	45:	0	46:	0	47:	0	48:	0	49:	0	50:	0	51:	0	52:	0	53:	0	54:	0	55:	0	56:	0	57:	0	58:	0	59:	0	60:	0	61:	0	62:	0	63:	0	64:	0	65:	0	66:	0	67:	0	68:	0	69:	0	70:	0	71:	0	72:	0	73:	0	74:	0	75:	0	76:	0	77:	0	78:	0	79:	0	80:	0	81:	0	82:	0	83:	0	84:	0	85:	0	86:	0	87:	0	88:	0	89:	0	90:	0	91:	0	92:	0	93:	0	94:	0	95:	0	96:	0	97:	0	98:	0	99:	0	100:	0
---	---	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	------	---



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000042 758601802400 307686180816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° ARQUIVO: 0xTCMprRRqz000000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024 N° CONTROLE: CU78nFkEpjL0000-9
TOMADOR/OBRA : ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° CONTROLE: F8XcvAO1PiL0000-5
LOGRADOURO BAIRO CIDADE CEP UF
ALTO DA CHACRINHA 25 CONTORNO QUEIMADAS 48860000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	5.948,27
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	5.948,27
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	475,86
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	5.948,27
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	531,78
VAL DEVIDO PREV SOC	1.899,87
TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	5.948,27
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	475,86
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2



858900000042 758601802400 307686180816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° ARQUIVO: OxtCMpRRRqz000000-4
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024 N° CONTROLE: CU78nfkEppjL0000-9

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.948,27	REM SEM 13° SALÁRIO	5.948,27		
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	531,78	DEPÓSITO	475,86		
VAL DEVIDO PREV SOC	1.899,87	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2		
		TOTAL A RECOLHER		475,86	



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° ARQUIVO: OxtCmpRRqz00000-4
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: CU78nFKEpjL0000-9 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 3,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075-32632584 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	531,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	1.189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,65
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	178,44
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,87
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,87

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/03/2024 15:50:24.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo OxtCMpRRqz000004.SFP é:

5372c3c3-66d8-4a7d-bf7a-0ed9963e75a7

Transmissor: CONTABILIDADE E AUDITORIA MANOEL LERCIVALDO LTDA:36858960000134

Inscrição do Transmissor: 36858960000134

Responsável: MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIR

Inscrição do Responsável: 55220762591

Competência: 02/2024

NRA: OxtCMpRRqz000004

Base de Processamento: Santaluz / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: MANOEL LERCIVALDO CR

Telefone: 007532632584



CNPJ 19.650.110/0001-27	Razão Social ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24058.5389969-7	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000209609679			Valor Total do Documento 2.219,77

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	84,51			84,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	511,42			511,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.189,65			1.189,65
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	148,70			148,70
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	11,89			11,89
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	59,48			59,48
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	89,22			89,22
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	35,68			35,68
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	89,22			89,22
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	2.219,77			2.219,77

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

27/02/2024 15:22:25

8588000022 9 19770385240 9 80071624058 1 53899697085 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000022 9	19770385240 9	80071624058 1	53899697085 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 19.650.110/0001-27
Número: 07.16.24058.5389969-7
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 2.219,77

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.13
1167301167 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MANOEL L C OLIVEIRA
AGENCIA: 1167-3 CONTA: 15.054-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240305132055639764162
CPF DO PAGADOR: ***.207.625-**
VALOR: 2.219,77
DATA: 05/03/2024 - 10:21:06
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 2bf2nwtDWYEYtq0N9FHBYOI0VM
VALIDO ATE: 20/03/2024 - 23:58:59
DEVEDOR: LUCIANO DE BRITO SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 19.***.***/*-27

PAGO PARA: Ministerio da Economia
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Notificacao enviada em: 05/03/2024 - 10:21:07

=====

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 2.27A.E37.1EA.E81.FBF

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 End.: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000
 19.650.110/0001-27

CONTRATO: 255/2022
 P. ADM: 215/2022
 N DA OBRA: 047/2022



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022
 MODALIDADE – RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
 TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL
 OBJETO – Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção da Creche de Várzea da Pedra, no Município de Santaluz -Ba


B.D.I
 23,54%

PERÍODO: 01/03/2024 A 18/03/2024

PLANILHA DE MEDIÇÃO						MEDIÇÃO 13		ACUMULADO		SALDO		%
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES											
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 416,49	R\$ 2.498,94	R\$ -	6,00	R\$ 2.498,94	0,00	R\$ -	100%	
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	320,00	R\$ 86,42	R\$ 27.654,40	R\$ -	320,00	R\$ 27.654,40	0,00	R\$ -	100%	
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.398,76	R\$ 1.398,76	R\$ -	1,00	R\$ 1.398,76	0,00	R\$ -	100%	
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.096,31	R\$ 1.096,31	R\$ -	1,00	R\$ 1.096,31	0,00	R\$ -	100%	
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 809,66	R\$ 809,66	R\$ -	1,00	R\$ 809,66	0,00	R\$ -	100%	
1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,52	R\$ 1.149,04	R\$ 2.895,58	R\$ -	2,52	R\$ 2.895,58	0,00	R\$ -	100%	
1.7	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20,00	R\$ 1.312,27	R\$ 26.245,40	R\$ -	20,00	R\$ 26.245,40	0,00	R\$ -	100%	
1.9	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	891,68	R\$ 6,80	R\$ 6.063,42	R\$ -	891,68	R\$ 6.063,42	0,00	R\$ -	100%	
1.10	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	1575,00	R\$ 0,23	R\$ 362,25	R\$ -	1575,00	R\$ 362,25	0,00	R\$ -	100%	
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							0,00				
2.1	EDIFICAÇÃO							0,00				
2.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	713,77	R\$ 105,08	R\$ 75.002,95	R\$ -	713,77	R\$ 75.002,95	0,00	R\$ -	100%	
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	174,70	R\$ 89,52	R\$ 15.639,14	R\$ -	174,70	R\$ 15.639,14	0,00	R\$ -	100%	
2.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	93,47	R\$ 8,12	R\$ 758,98	R\$ -	93,47	R\$ 758,98	0,00	R\$ -	100%	
2.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	129,38	R\$ 41,63	R\$ 5.386,09	R\$ -	129,38	R\$ 5.386,09	0,00	R\$ -	100%	
2.2	MURETA E ABRIGO GÁS							0,00				
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	15,68	R\$ 89,52	R\$ 1.403,67	R\$ -	15,68	R\$ 1.403,67	0,00	R\$ -	100%	
2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	13,87	R\$ 8,12	R\$ 112,62	R\$ -	13,87	R\$ 112,62	0,00	R\$ -	100%	
2.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	11,42	R\$ 41,63	R\$ 475,41	R\$ -	11,42	R\$ 475,41	0,00	R\$ -	100%	
2.3	CASTELO D'ÁGUA							0,00				
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,65	R\$ 89,52	R\$ 326,75	R\$ -	3,65	R\$ 326,75	0,00	R\$ -	100%	
2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	4,84	R\$ 8,12	R\$ 39,30	R\$ -	4,84	R\$ 39,30	0,00	R\$ -	100%	
2.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,23	R\$ 41,63	R\$ 51,20	R\$ -	1,23	R\$ 51,20	0,00	R\$ -	100%	
3	FUNDAÇÕES							0,00				
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS							0,00				
3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO NÃO ESTRUTURAL. ESPESURA 5CM - FUNDO DE VALA	m²	46,65	R\$ 34,18	R\$ 1.594,68	R\$ -	46,65	R\$ 1.594,68	0,00	R\$ -	100%	
3.1.3	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	m²	131,71	R\$ 168,14	R\$ 22.145,66	R\$ -	131,71	R\$ 22.145,66	0,00	R\$ -	100%	

Tony Felix Andrade
 Engenharia Civil
 CREA-BA. 052.004/77.8

3.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 6.3MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	317,20	R\$ 19,21	R\$ 6.092,94	R\$ -	317,20	R\$ 6.092,94	0,00	R\$ -	100%
3.1.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	41,25	R\$ 18,03	R\$ 743,85	R\$ -	41,25	R\$ 743,85	0,00	R\$ -	100%
3.1.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 10.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	366,94	R\$ 16,11	R\$ 5.911,14	R\$ -	366,94	R\$ 5.911,14	0,00	R\$ -	100%
3.1.7	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 12.5MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	225,00	R\$ 13,58	R\$ 3.055,77	R\$ -	225,00	R\$ 3.055,77	0,00	R\$ -	100%
3.1.8	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 5.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	134,38	R\$ 20,38	R\$ 2.738,12	R\$ -	134,38	R\$ 2.738,12	0,00	R\$ -	100%
3.1.9	CONCRETO BOMBÉADO FCK=25 MPA: INCLUIDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	15,55	R\$ 680,42	R\$ 10.580,53	R\$ -	15,55	R\$ 10.580,53	0,00	R\$ -	100%
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						0,00				
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	60,44	R\$ 33,31	R\$ 2.013,26	R\$ -	60,44	R\$ 2.013,26	0,00	R\$ -	100%
3.2.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	55,45	R\$ 735,61	R\$ 40.789,57	R\$ -	55,45	R\$ 40.789,57	0,00	R\$ -	100%
3.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	349,55	R\$ 90,76	R\$ 31.725,16	R\$ -	349,55	R\$ 31.725,16	0,00	R\$ -	100%
3.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	660,10	R\$ 17,62	R\$ 11.630,96	R\$ -	660,10	R\$ 11.630,96	0,00	R\$ -	100%
3.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	113,60	R\$ 15,65	R\$ 1.777,84	R\$ -	113,60	R\$ 1.777,84	0,00	R\$ -	100%
3.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,41	R\$ 13,11	R\$ 346,24	R\$ -	26,41	R\$ 346,24	0,00	R\$ -	100%
3.2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	356,91	R\$ 20,55	R\$ 7.334,50	R\$ -	356,91	R\$ 7.334,50	0,00	R\$ -	100%
3.2.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	24,18	R\$ 636,71	R\$ 15.395,65	R\$ -	24,18	R\$ 15.395,65	0,00	R\$ -	100%
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA						0,00				
3.3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	35,00	R\$ 81,63	R\$ 2.857,05	R\$ -	35,00	R\$ 2.857,05	0,00	R\$ -	100%
3.3.2	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5,00	R\$ 22,38	R\$ 111,90	R\$ -	5,00	R\$ 111,90	0,00	R\$ -	100%
3.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	4,84	R\$ 33,31	R\$ 161,22	R\$ -	4,84	R\$ 161,22	0,00	R\$ -	100%
3.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	4,40	R\$ 105,02	R\$ 462,09	R\$ -	4,40	R\$ 462,09	0,00	R\$ -	100%
3.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,61	R\$ 15,65	R\$ 1.824,95	R\$ -	116,61	R\$ 1.824,95	0,00	R\$ -	100%
3.3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,78	R\$ 13,11	R\$ 1.098,36	R\$ -	83,78	R\$ 1.098,36	0,00	R\$ -	100%
3.3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,87	R\$ 13,30	R\$ 184,47	R\$ -	13,87	R\$ 184,47	0,00	R\$ -	100%
3.3.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,08	R\$ 20,55	R\$ 268,79	R\$ -	13,08	R\$ 268,79	0,00	R\$ -	100%
3.3.9	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	13,50	R\$ 645,38	R\$ 8.712,63	R\$ -	13,50	R\$ 8.712,63	0,00	R\$ -	100%
3.4	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS						0,00				



Tony Félix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

3.4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	17,50	R\$ 144,77	R\$ 2.533,48	R\$ -	17,50	R\$ 2.533,48	0,00	R\$ -	100%
3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,25	R\$ 33,31	R\$ 41,64	R\$ -	1,25	R\$ 41,64	0,00	R\$ -	100%
3.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,00	R\$ 105,02	R\$ 525,10	R\$ -	5,00	R\$ 525,10	0,00	R\$ -	100%
3.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,19	R\$ 20,55	R\$ 209,40	R\$ -	10,19	R\$ 209,40	0,00	R\$ -	100%
3.4.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	0,63	R\$ 645,38	R\$ 406,59	R\$ -	0,63	R\$ 406,59	0,00	R\$ -	100%
3.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME						0,00				
3.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	12,12	R\$ 33,31	R\$ 403,72	R\$ -	12,12	R\$ 403,72	0,00	R\$ -	100%
3.5.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,13	R\$ 735,61	R\$ 831,24	R\$ -	1,13	R\$ 831,24	0,00	R\$ -	100%
3.5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	44,47	R\$ 90,76	R\$ 4.036,10	R\$ -	44,47	R\$ 4.036,10	0,00	R\$ -	100%
3.5.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	84,20	R\$ 17,62	R\$ 1.483,60	R\$ -	84,20	R\$ 1.483,60	0,00	R\$ -	100%
3.5.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	3,64	R\$ 645,38	R\$ 2.349,18	R\$ -	3,64	R\$ 2.349,18	0,00	R\$ -	100%
4	SUPERESTRUTURA						0,00				
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES						0,00				
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	333,34	R\$ 63,75	R\$ 21.250,43	R\$ -	333,34	R\$ 21.250,43	0,00	R\$ -	100%
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	839,33	R\$ 16,41	R\$ 13.773,41	R\$ -	839,33	R\$ 13.773,41	0,00	R\$ -	100%
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	312,88	R\$ 13,66	R\$ 4.273,94	R\$ -	312,88	R\$ 4.273,94	0,00	R\$ -	100%
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	450,22	R\$ 22,34	R\$ 10.057,91	R\$ -	450,22	R\$ 10.057,91	0,00	R\$ -	100%
4.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	18,25	R\$ 604,92	R\$ 11.039,79	R\$ -	18,25	R\$ 11.039,79	0,00	R\$ -	100%
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS						0,00				
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	344,10	R\$ 98,83	R\$ 34.007,40	R\$ -	344,10	R\$ 34.007,40	0,00	R\$ -	100%
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	675,91	R\$ 18,65	R\$ 12.605,72	R\$ -	675,91	R\$ 12.605,72	0,00	R\$ -	100%
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,64	R\$ 16,41	R\$ 158,19	R\$ -	9,64	R\$ 158,19	0,00	R\$ -	100%



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.009.677.8

4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	365,31	R\$ 13,66	R\$ 4.990,13	R\$ -	365,31	R\$ 4.990,13	0,00	R\$ -	100%
4.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	24,55	R\$ 584,99	R\$ 14.361,50	R\$ -	24,55	R\$ 14.361,50	0,00	R\$ -	100%
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS						0,00				
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	124,12	R\$ 73,23	R\$ 9.089,31	R\$ -	124,12	R\$ 9.089,31	0,00	R\$ -	100%
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES						0,00				
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	18,00	R\$ 63,75	R\$ 1.147,50	R\$ -	18,00	R\$ 1.147,50	0,00	R\$ -	100%
4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,66	R\$ 18,65	R\$ 254,76	R\$ -	13,66	R\$ 254,76	0,00	R\$ -	100%
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,92	R\$ 22,34	R\$ 981,17	R\$ -	43,92	R\$ 981,17	0,00	R\$ -	100%
4.4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,76	R\$ 604,92	R\$ 459,74	R\$ -	0,76	R\$ 459,74	0,00	R\$ -	100%
4.5	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE						0,00				
4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	19,24	R\$ 63,75	R\$ 1.226,55	R\$ -	19,24	R\$ 1.226,55	0,00	R\$ -	100%
4.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,26	R\$ 20,40	R\$ 311,30	R\$ -	15,26	R\$ 311,30	0,00	R\$ -	100%
4.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,45	R\$ 18,65	R\$ 362,74	R\$ -	19,45	R\$ 362,74	0,00	R\$ -	100%
4.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,01	R\$ 16,41	R\$ 459,64	R\$ -	28,01	R\$ 459,64	0,00	R\$ -	100%
4.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,06	R\$ 22,34	R\$ 381,12	R\$ -	17,06	R\$ 381,12	0,00	R\$ -	100%
4.5.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,23	R\$ 604,92	R\$ 744,05	R\$ -	1,23	R\$ 744,05	0,00	R\$ -	100%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL						0,00				
5.1	ELEMENTOS VAZADOS						0,00				
5.1.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	6,10	R\$ 145,28	R\$ 886,21	R\$ -	6,10	R\$ 886,21	0,00	R\$ -	100%
5.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						0,00				
5.1.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	572,77	R\$ 58,12	R\$ 33.289,39	R\$ -	572,77	R\$ 33.289,39	0,00	R\$ -	100%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA BA 03207/2017-8

5.1.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	160,33	R\$	94,87	R\$	15.210,51	R\$	-	160,33	R\$	15.210,51	R\$	0,00	R\$	-	100%
5.1.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	496,91	R\$	78,32	R\$	38.917,99	R\$	-	496,91	R\$	38.917,99	R\$	0,00	R\$	-	100%
5.1.2.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	9,72	R\$	102,11	R\$	992,51	R\$	-	9,72	R\$	992,51	R\$	0,00	R\$	-	100%
5.2.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIO. AF_03/2016	M	311,80	R\$	29,16	R\$	9.092,09	R\$	-	311,80	R\$	9.092,09	R\$	0,00	R\$	-	100%
5.2.6	DIVISÓRIA DE PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÁOS. AF_06/2017_P	m²	8,06	R\$	471,07	R\$	3.796,82	R\$	-	8,06	R\$	3.796,82	R\$	8,06	R\$	3.796,82	0%
5.2.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÁOS. AF_06/2017_P	m²	3,60	R\$	195,51	R\$	703,84	R\$	3,60	3,60	R\$	703,84	R\$	0,00	R\$	-	100%
5.3	ALVENARIA DA MURETA									0,00							
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,95	R\$	78,32	R\$	4.930,24	R\$	-	62,95	R\$	4.930,24	R\$	0,00	R\$	-	100%
6	ESQUADRIAS									0,00							
6.1	PORTAS DE MADEIRA									0,00							
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIXAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$	1.091,40	R\$	6.548,40	R\$	-	6,00	R\$	6.548,40	R\$	0,00	R\$	-	100%
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIXAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$	2.019,92	R\$	6.059,76	R\$	-	3,00	R\$	6.059,76	R\$	3,00	R\$	6.059,76	0%
6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIXAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$	1.139,29	R\$	6.835,74	R\$	-	6,00	R\$	6.835,74	R\$	0,00	R\$	-	100%
6.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIXAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$	1.139,29	R\$	9.114,32	R\$	-	8,00	R\$	9.114,32	R\$	0,00	R\$	-	100%
6.1.5	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,40	R\$	847,60	R\$	2.034,24	R\$	-	2,40	R\$	2.034,24	R\$	2,40	R\$	2.034,24	0%
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS									0,00							
6.2.2	BARRA DE AFOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$	332,16	R\$	2.657,28	R\$	8,00	8,00	R\$	2.657,28	R\$	0,00	R\$	-	100%
6.2.3	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	4,00	R\$	57,82	R\$	231,28	R\$	-	4,00	R\$	231,28	R\$	4,00	R\$	231,28	0%
6.2.4	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	12,80	R\$	147,23	R\$	1.884,54	R\$	-	12,80	R\$	1.884,54	R\$	12,80	R\$	1.884,54	0%
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO									0,00							
6.3.1	Porta de abrir PA1 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/lizarrista	m²	2,10	R\$	528,40	R\$	1.109,64	R\$	-	2,10	R\$	1.109,64	R\$	2,10	R\$	1.109,64	0%
6.3.2	Porta de abrir PA2 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/lizarrista	m²	1,68	R\$	528,40	R\$	887,71	R\$	-	1,68	R\$	887,71	R\$	1,68	R\$	887,71	0%
6.3.3	Porta de abrir PA3 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/lizarrista	m²	3,36	R\$	528,40	R\$	1.775,42	R\$	-	3,36	R\$	1.775,42	R\$	3,36	R\$	1.775,42	0%



6.3.4	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	83,48	R\$ 483,20	R\$ 41.172,34	R\$ -	0,00	R\$ -	83,48	R\$ 41.172,34	0%
6.3.5	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,04	R\$ 638,33	R\$ 1.302,19	R\$ -	0,00	R\$ -	2,04	R\$ 1.302,19	0%
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV	UN	1,00	R\$ 1.648,75	R\$ 1.648,75	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.648,75	0%
6.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS										
6.5	JANELAS DE ALUMINIO - JA										
6.5.1	JA - 01 - 0,70MX1,25M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,88	R\$ 834,69	R\$ 734,53	R\$ -	0,00	R\$ -	0,88	R\$ 734,53	0%
6.5.2	JA - 02 - 1,10M X1,95M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,15	R\$ 834,69	R\$ 1.794,58	R\$ -	0,00	R\$ -	2,15	R\$ 1.794,58	0%
6.5.3	JA - 03 - 1,40MX1,15M - JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,61	R\$ 478,30	R\$ 770,06	R\$ -	0,00	R\$ -	1,61	R\$ 770,06	0%
6.5.4	JA - 04 - 1,40MX1,95M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,73	R\$ 834,69	R\$ 2.278,70	R\$ -	0,00	R\$ -	2,73	R\$ 2.278,70	0%
6.5.5	JA - 05 - 2,00MX1,05M - JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,16	R\$ 478,30	R\$ 1.033,13	R\$ -	0,00	R\$ -	2,16	R\$ 1.033,13	0%
6.5.6	JA - 06 - 2,10MX0,50M - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,05	R\$ 470,18	R\$ 493,69	R\$ -	0,00	R\$ -	1,05	R\$ 493,69	0%
6.5.7	JA - 07 - 2,10MX0,75M - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,60	R\$ 470,18	R\$ 5.924,27	R\$ -	0,00	R\$ -	12,60	R\$ 5.924,27	0%
6.5.8	JA - 08 - 2,10MX0,80M - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,40	R\$ 470,18	R\$ 3.949,51	R\$ -	0,00	R\$ -	8,40	R\$ 3.949,51	0%
6.5.9	JA - 09 - 2,10MX1,50M - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,30	R\$ 470,18	R\$ 2.962,13	R\$ -	0,00	R\$ -	6,30	R\$ 2.962,13	0%
6.5.10	JA - 10 - 0,70MX0,75M - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,05	R\$ 470,18	R\$ 493,69	R\$ -	0,00	R\$ -	1,05	R\$ 493,69	0%
6.5.11	JA - 11 - 1,40MX0,75M - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,25	R\$ 470,18	R\$ 2.468,45	R\$ -	0,00	R\$ -	5,25	R\$ 2.468,45	0%
6.5.12	JA - 12 - 4,20MX0,50M - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,20	R\$ 470,18	R\$ 1.974,76	R\$ -	0,00	R\$ -	4,20	R\$ 1.974,76	0%
6.5.13	JA - 13 - 5,60MX1,00M - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,80	R\$ 470,18	R\$ 7.899,02	R\$ -	0,00	R\$ -	16,80	R\$ 7.899,02	0%
6.5.14	JA - 14 - 1,60MX0,85M - JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,72	R\$ 478,30	R\$ 1.300,98	R\$ -	0,00	R\$ -	2,72	R\$ 1.300,98	0%

9.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1024,77	R\$	25,48	R\$	26.111,14		R\$	-	1024,77	R\$	26.111,14	R\$	0,00	R\$	-	100%
9.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	376,80	R\$	86,26	R\$	24.966,77		R\$	-	376,80	R\$	24.966,77	R\$	0,00	R\$	-	100%
9.1.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco - Rev 04	m²	176,57	R\$	58,34	R\$	10.301,09	98,06	R\$	5.720,82	120,96	R\$	7.056,81	R\$	55,61	R\$	3.244,29	69%
9.1.7	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco - Rev 04	m²	33,90	R\$	58,34	R\$	1.977,73		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	33,90	R\$	1.977,73	0%
9.1.10	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	127,20	R\$	21,40	R\$	2.722,08		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	127,20	R\$	2.722,08	0%
9.1.11	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	965,43	R\$	56,16	R\$	54.218,55	150,00	R\$	8.424,00	965,43	R\$	54.218,55	R\$	0,00	R\$	-	100%
9.2	MURETA										0,00							
9.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	98,05	R\$	5,23	R\$	512,80		R\$	-	98,05	R\$	512,80	R\$	0,00	R\$	-	100%
9.2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	98,05	R\$	37,28	R\$	3.655,30		R\$	-	98,05	R\$	3.655,30	R\$	0,00	R\$	-	100%
10	SISTEMAS DE PISOS										0,00							
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA										0,00							
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	408,38	R\$	43,59	R\$	17.801,28		R\$	-	204,38	R\$	8.908,92	R\$	204,00	R\$	8.892,36	50%
10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	130,16	R\$	34,15	R\$	4.444,96		R\$	-	56,80	R\$	1.939,72	R\$	73,36	R\$	2.505,24	44%
10.1.3	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	668,14	R\$	40,27	R\$	26.906,00		R\$	-	56,80	R\$	2.287,34	R\$	611,34	R\$	24.618,66	9%
10.1.4	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,42	R\$	61,18	R\$	2.289,36		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	37,42	R\$	2.289,36	0%
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	148,95	R\$	50,09	R\$	7.460,91	66,56	R\$	3.333,99	148,95	R\$	7.460,91	R\$	0,00	R\$	-	100%
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	42,90	R\$	88,67	R\$	3.803,94		R\$	-	42,90	R\$	3.803,94	R\$	0,00	R\$	-	100%
10.1.7	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	68,00	R\$	16,14	R\$	1.097,52	32,46	R\$	523,90	68,00	R\$	1.097,52	R\$	0,00	R\$	-	100%
10.1.10	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	53,45	R\$	65,45	R\$	3.498,30		R\$	-	53,45	R\$	3.498,30	R\$	0,00	R\$	-	100%
10.1.11	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	1,75	R\$	94,54	R\$	165,45		R\$	-	1,75	R\$	165,45	R\$	0,00	R\$	-	100%
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA										0,00							
10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	254,80	R\$	138,78	R\$	35.361,14		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	254,80	R\$	35.361,14	0%
10.2.2	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	17,38	R\$	455,75	R\$	7.920,94		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	17,38	R\$	7.920,94	0%
10.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	905,92	R\$	71,35	R\$	64.637,39		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	905,92	R\$	64.637,39	0%

10.2.4	DIRECIONAL - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	7,50	R\$	120,42	R\$	903,15	R\$	-	R\$	0,00	R\$	7,50	R\$	903,15	0%
10.2.5	ALERTA - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	4,88	R\$	120,42	R\$	587,65	R\$	-	R\$	0,00	R\$	4,88	R\$	587,65	0%
10.2.6	COLCHAO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP)	m²	21,96	R\$	10,67	R\$	234,31	R\$	-	R\$	0,00	R\$	21,96	R\$	234,31	0%
10.2.7	PLANTIO DE GRAMA BATAIS EM PLACAS AF_05/2018	m²	344,81	R\$	13,15	R\$	4.534,25	R\$	-	R\$	0,00	R\$	344,81	R\$	4.534,25	0%
10.2.8	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	30,21	R\$	35,61	R\$	1.075,78	R\$	-	R\$	0,00	R\$	30,21	R\$	1.075,78	0%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS															
11.1	EDIFICAÇÃO															
11.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANGOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF_05/2017	m²	2004,59	R\$	20,91	R\$	41.915,98	R\$	-	R\$	1496,74	R\$	2004,59	R\$	10.619,09	75%
11.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	1902,96	R\$	15,46	R\$	29.419,76	R\$	-	R\$	961,40	R\$	1902,96	R\$	14.556,52	51%
11.1.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	965,43	R\$	14,66	R\$	14.153,20	R\$	201,48	R\$	2.953,70	R\$	965,43	R\$	1.086,01	92%
11.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	965,43	R\$	14,73	R\$	14.220,78	R\$	337,32	R\$	4.968,72	R\$	965,43	R\$	2.042,46	86%
11.1.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	123,61	R\$	31,05	R\$	3.838,09	R\$	-	R\$	0,00	R\$	123,61	R\$	3.838,09	0%
11.1.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	m²	421,23	R\$	26,77	R\$	11.276,33	R\$	-	R\$	0,00	R\$	421,23	R\$	11.276,33	0%
11.1.8	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	12,72	R\$	30,95	R\$	393,68	R\$	-	R\$	0,00	R\$	12,72	R\$	393,68	0%
11.1.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	m²	172,13	R\$	26,77	R\$	4.607,92	R\$	-	R\$	0,00	R\$	172,13	R\$	4.607,92	0%
11.1.10	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	m²	101,63	R\$	54,20	R\$	5.508,35	R\$	-	R\$	0,00	R\$	101,63	R\$	5.508,35	0%
11.1.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	m²	172,13	R\$	26,77	R\$	4.607,92	R\$	-	R\$	0,00	R\$	172,13	R\$	4.607,92	0%
11.2	MURETA															
11.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANGOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF_05/2017	m²	98,05	R\$	20,91	R\$	2.050,23	R\$	-	R\$	0,00	R\$	98,05	R\$	2.050,23	0%
11.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	98,05	R\$	15,46	R\$	1.515,85	R\$	-	R\$	0,00	R\$	98,05	R\$	1.515,85	0%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA															
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO															
12.1.1	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	27,60	R\$	9,10	R\$	251,16	R\$	-	R\$	27,60	R\$	27,60	R\$	251,16	100%
12.1.2	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	166,90	R\$	5,76	R\$	961,34	R\$	-	R\$	166,90	R\$	166,90	R\$	961,34	100%
12.1.3	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	81,05	R\$	20,07	R\$	1.626,67	R\$	-	R\$	81,05	R\$	81,05	R\$	1.626,67	100%
12.1.4	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	11,00	R\$	33,05	R\$	363,55	R\$	-	R\$	11,00	R\$	11,00	R\$	363,55	100%
12.1.5	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	134,60	R\$	54,57	R\$	7.345,12	R\$	-	R\$	0,00	R\$	134,60	R\$	7.345,12	0%
12.1.6	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	54,55	R\$	67,89	R\$	3.703,40	R\$	-	R\$	0,00	R\$	54,55	R\$	3.703,40	0%
12.1.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	3,00	R\$	38,30	R\$	114,90	R\$	-	R\$	0,00	R\$	3,00	R\$	114,90	0%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CRÉDITO Nº 0201/00778

Tony Felix Andrade
 Eng.º Profissional Civil
 CREA-BA 052.069.677.8

12.1.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES - PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R\$	243,73	R\$	1.462,38	R\$	0,00	R\$	-	6,00	R\$	1.462,38	0%
12.1.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES - PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$	330,49	R\$	660,98	R\$	0,00	R\$	-	2,00	R\$	660,98	0%
12.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	4,55	R\$	18,20	R\$	4,00	R\$	18,20	0,00	R\$	-	100%
12.1.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	72,00	R\$	4,32	R\$	311,04	R\$	72,00	R\$	311,04	0,00	R\$	-	100%
12.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	R\$	12,25	R\$	490,00	R\$	40,00	R\$	490,00	0,00	R\$	-	100%
12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$	34,03	R\$	204,18	R\$	0,00	R\$	-	6,00	R\$	204,18	0%
12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	49,86	R\$	99,72	R\$	0,00	R\$	-	2,00	R\$	99,72	0%
12.1.15	LUVAS DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$	22,87	R\$	137,22	R\$	6,00	R\$	137,22	0,00	R\$	-	100%
12.1.16	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm)	UN	2,00	R\$	31,16	R\$	62,32	R\$	0,00	R\$	-	2,00	R\$	62,32	0%
12.1.17	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2 1/2" (65X75mm)	UN	4,00	R\$	38,79	R\$	155,16	R\$	0,00	R\$	-	4,00	R\$	155,16	0%
12.1.18	LUVAS DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	R\$	12,81	R\$	384,30	R\$	30,00	R\$	384,30	0,00	R\$	-	100%
12.1.19	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm)	UN	1,00	R\$	14,55	R\$	14,55	R\$	1,00	R\$	14,55	0,00	R\$	-	100%
12.1.20	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm)	UN	5,00	R\$	29,58	R\$	147,90	R\$	0,00	R\$	-	5,00	R\$	147,90	0%
12.1.21	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$	6,17	R\$	18,51	R\$	3,00	R\$	18,51	0,00	R\$	-	100%
12.1.22	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	17,92	R\$	35,84	R\$	2,00	R\$	35,84	0,00	R\$	-	100%
12.1.23	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$	97,39	R\$	779,12	R\$	0,00	R\$	-	8,00	R\$	779,12	0%
12.1.24	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	152,90	R\$	305,80	R\$	0,00	R\$	-	2,00	R\$	305,80	0%
12.1.25	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	8,51	R\$	34,04	R\$	4,00	R\$	34,04	0,00	R\$	-	100%
12.1.26	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	88,00	R\$	10,11	R\$	889,68	R\$	88,00	R\$	889,68	0,00	R\$	-	100%
12.1.27	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00	R\$	15,70	R\$	439,60	R\$	28,00	R\$	439,60	0,00	R\$	-	100%
12.1.28	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	41,29	R\$	165,16	R\$	4,00	R\$	165,16	0,00	R\$	-	100%
12.1.29	CURVA 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	R\$	54,56	R\$	1.418,56	R\$	0,00	R\$	-	26,00	R\$	1.418,56	0%
12.1.30	PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$	152,90	R\$	917,40	R\$	0,00	R\$	-	6,00	R\$	917,40	0%
12.1.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	47,00	R\$	16,87	R\$	792,89	R\$	47,00	R\$	792,89	0,00	R\$	-	100%
12.1.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$	16,87	R\$	202,44	R\$	12,00	R\$	202,44	0,00	R\$	-	100%



12.1.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	R\$	14,05	R\$	238,85	R\$	-	R\$	17,00	R\$	238,85	R\$	0,00	R\$	-	100%
12.1.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$	24,64	R\$	344,96	R\$	-	R\$	14,00	R\$	344,96	R\$	0,00	R\$	-	100%
12.1.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$	96,69	R\$	676,83	R\$	-	R\$	0,00	R\$	676,83	R\$	7,00	R\$	676,83	0%
12.1.36	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	148,06	R\$	592,24	R\$	-	R\$	0,00	R\$	592,24	R\$	4,00	R\$	592,24	0%
12.1.37	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$	23,16	R\$	231,60	R\$	-	R\$	10,00	R\$	231,60	R\$	0,00	R\$	-	100%
12.1.38	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	83,40	R\$	166,80	R\$	-	R\$	0,00	R\$	166,80	R\$	2,00	R\$	166,80	0%
12.1.39	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$	83,40	R\$	1.084,20	R\$	-	R\$	0,00	R\$	1.084,20	R\$	13,00	R\$	1.084,20	0%
12.1.40	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$	83,40	R\$	250,20	R\$	-	R\$	0,00	R\$	250,20	R\$	3,00	R\$	250,20	0%
12.1.41	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSÁ CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	9,00	R\$	26,28	R\$	236,52	R\$	-	R\$	9,00	R\$	236,52	R\$	0,00	R\$	-	100%
12.1.42	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSÁ CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	8,00	R\$	26,28	R\$	210,24	R\$	-	R\$	8,00	R\$	210,24	R\$	0,00	R\$	-	100%
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS																	
12.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$	289,97	R\$	869,91	R\$	-	R\$	0,00	R\$	869,91	R\$	3,00	R\$	869,91	0%
12.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$	352,10	R\$	352,10	R\$	-	R\$	0,00	R\$	352,10	R\$	1,00	R\$	352,10	0%
12.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$	83,01	R\$	166,02	R\$	-	R\$	2,00	R\$	166,02	R\$	0,00	R\$	-	100%
12.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$	167,14	R\$	1.337,12	R\$	-	R\$	8,00	R\$	1.337,12	R\$	0,00	R\$	-	100%
12.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	R\$	94,47	R\$	2.834,10	R\$	-	R\$	30,00	R\$	2.834,10	R\$	0,00	R\$	-	100%
12.2.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$	89,77	R\$	538,62	R\$	-	R\$	6,00	R\$	538,62	R\$	0,00	R\$	-	100%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																	
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC																	
13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	246,60	R\$	34,17	R\$	8.426,32	R\$	-	R\$	246,60	R\$	8.426,32	R\$	0,00	R\$	-	100%
13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	54,00	R\$	66,60	R\$	3.596,40	R\$	-	R\$	54,00	R\$	3.596,40	R\$	0,00	R\$	-	100%
13.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	R\$	27,17	R\$	298,87	R\$	-	R\$	11,00	R\$	298,87	R\$	0,00	R\$	-	100%
13.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	47,00	R\$	27,24	R\$	1.280,28	R\$	-	R\$	47,00	R\$	1.280,28	R\$	0,00	R\$	-	100%
13.1.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	83,82	R\$	335,28	R\$	-	R\$	4,00	R\$	335,28	R\$	0,00	R\$	-	100%
13.1.6	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	66,37	R\$	66,37	R\$	-	R\$	1,00	R\$	66,37	R\$	0,00	R\$	-	100%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-DF 052.003.77.8



13.2	ACESSÓRIOS	un	11,00	R\$	46,01	R\$	506,11	R\$	506,11	0,00	R\$	1,078,20	R\$	1,078,20	0,00	R\$	11,00	R\$	506,11	0%
13.2.1	Rold hemisférico em P. Ipo abecaxi Ø 100mm	UN	9,00	R\$	119,80	R\$	1.078,20	R\$	1.078,20	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%
13.2.2	CAIXA DE ÁREIA 60X60X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	9,00	R\$	119,80	R\$	1.078,20	R\$	1.078,20	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA																			
14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	149,30	R\$	63,96	R\$	9.549,23	R\$	9.549,23	149,30	R\$	9.549,23	R\$	9.549,23	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%
14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	115,30	R\$	22,39	R\$	2.581,57	R\$	2.581,57	115,30	R\$	2.581,57	R\$	2.581,57	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%
14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	173,10	R\$	32,96	R\$	5.705,38	R\$	5.705,38	173,10	R\$	5.705,38	R\$	5.705,38	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%
14.4	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	69,55	R\$	46,59	R\$	3.240,33	R\$	3.240,33	69,55	R\$	3.240,33	R\$	3.240,33	0,00	R\$	69,55	R\$	3.240,33	0%
14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$	27,17	R\$	163,02	R\$	163,02	6,00	R\$	163,02	R\$	163,02	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%
14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$	22,00	R\$	198,00	R\$	198,00	9,00	R\$	198,00	R\$	198,00	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%
14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	31,00	R\$	12,88	R\$	399,28	R\$	399,28	31,00	R\$	399,28	R\$	399,28	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%
14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	R\$	8,32	R\$	266,24	R\$	266,24	32,00	R\$	266,24	R\$	266,24	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%
14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$	27,24	R\$	326,88	R\$	326,88	12,00	R\$	326,88	R\$	326,88	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%
14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	28,00	R\$	31,14	R\$	871,92	R\$	871,92	28,00	R\$	871,92	R\$	871,92	0,00	R\$	28,00	R\$	871,92	0%
14.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00	R\$	12,21	R\$	219,78	R\$	219,78	18,00	R\$	219,78	R\$	219,78	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%
14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	106,00	R\$	11,18	R\$	1.185,08	R\$	1.185,08	106,00	R\$	1.185,08	R\$	1.185,08	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%
14.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$	79,22	R\$	1.109,08	R\$	1.109,08	14,00	R\$	1.109,08	R\$	1.109,08	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%
14.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$	50,31	R\$	402,48	R\$	402,48	8,00	R\$	402,48	R\$	402,48	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%
14.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	53,33	R\$	53,33	R\$	53,33	1,00	R\$	53,33	R\$	53,33	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%
14.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$	23,79	R\$	214,11	R\$	214,11	9,00	R\$	214,11	R\$	214,11	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%
14.18	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	29,99	R\$	29,99	R\$	29,99	1,00	R\$	29,99	R\$	29,99	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%
14.19	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	66,93	R\$	267,72	R\$	267,72	4,00	R\$	267,72	R\$	267,72	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%
14.20	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,00	R\$	66,93	R\$	803,16	R\$	803,16	12,00	R\$	803,16	R\$	803,16	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%
14.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$	21,85	R\$	284,05	R\$	284,05	13,00	R\$	284,05	R\$	284,05	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	100%

Tony Felix Andrade
 Engenheiro
 CREA 040/054207/7.8

14.22	UN	1,00	R\$	45,47	R\$	45,47		R\$	-	1,00	R\$	45,47	0,00	R\$	-	100%
TÉ. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM., JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014																
14.23	UN	12,00	R\$	20,53	R\$	246,36		R\$	-	12,00	R\$	246,36	0,00	R\$	-	100%
TÉ. PVC. SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014																
14.24	UN	19,00	R\$	37,66	R\$	715,54		R\$	-	19,00	R\$	715,54	0,00	R\$	-	100%
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014																
14.25	UN	4,00	R\$	179,93	R\$	719,72		R\$	-	4,00	R\$	719,72	0,00	R\$	-	100%
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020																
14.26	UN	12,00	R\$	314,08	R\$	3.768,96		R\$	-	12,00	R\$	3.768,96	0,00	R\$	-	100%
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO																
14.27	UN	15,00	R\$	12,14	R\$	182,10		R\$	-	15,00	R\$	182,10	0,00	R\$	-	100%
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014																
14.28	un	3,00	R\$	94,14	R\$	282,42		R\$	-	3,00	R\$	282,42	0,00	R\$	-	100%
Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha alumínio																
14.29	UN	9,00	R\$	12,03	R\$	108,27		R\$	-	9,00	R\$	108,27	9,00	R\$	108,27	0%
TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM																
14.30	UN	9,00	R\$	13,15	R\$	118,35		R\$	-	9,00	R\$	118,35	9,00	R\$	118,35	0%
TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM																
14.31	un	1,00	R\$	3.570,15	R\$	3.570,15		R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	3.570,15	0%
Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,50 x 1,00 x 1,50 m																
14.32	un	1,00	R\$	8.367,68	R\$	8.367,68		R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	8.367,68	0%
Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m																
15																
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS																
15.1	UN	4,00	R\$	272,64	R\$	1.090,56	4,00	R\$	1.090,56	4,00	R\$	1.090,56	0,00	R\$	-	100%
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016																
15.2	UN	9,00	R\$	456,55	R\$	4.108,95	9,00	R\$	4.108,95	9,00	R\$	4.108,95	0,00	R\$	-	100%
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020																
15.3	M	9,70	R\$	108,45	R\$	1.051,97		R\$	-	0,00	R\$	-	9,70	R\$	1.051,97	0%
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1"1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P																
15.4	UN	13,00	R\$	347,93	R\$	4.523,09		R\$	-	13,00	R\$	4.523,09	0,00	R\$	-	100%
VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1"1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021																
15.5	UN	13,00	R\$	130,08	R\$	1.691,04	13,00	R\$	1.691,04	13,00	R\$	1.691,04	0,00	R\$	-	100%
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020																
15.6	UN	6,00	R\$	202,92	R\$	1.217,52	6,00	R\$	1.217,52	6,00	R\$	1.217,52	0,00	R\$	-	100%
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020																
15.7	UN	5,00	R\$	423,60	R\$	2.118,00	1,00	R\$	423,60	1,00	R\$	423,60	4,00	R\$	1.694,40	20%
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020																
15.8	UN	1,00	R\$	260,39	R\$	260,39		R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	260,39	0%
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020																
15.9	un	2,00	R\$	325,13	R\$	650,26		R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	650,26	0%
banheira embutir em plástico tipo pvc, 77 x 45 x 20 cm																
15.10	UN	3,00	R\$	138,30	R\$	414,90		R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	414,90	0%
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020																
15.11	UN	3,00	R\$	138,30	R\$	414,90		R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	414,90	0%
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020																
15.12	UN	3,00	R\$	783,52	R\$	2.350,56		R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	2.350,56	0%
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020																
15.13	UN	8,00	R\$	89,41	R\$	715,28	8,00	R\$	715,28	8,00	R\$	715,28	0,00	R\$	-	100%
CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020																
15.14	UN	9,00	R\$	32,23	R\$	290,07		R\$	-	0,00	R\$	-	9,00	R\$	290,07	0%
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020																
15.15	un	107,00	R\$	14,87	R\$	1.591,09		R\$	-	0,00	R\$	-	107,00	R\$	1.591,09	0%
Cabo de plástico, Acres ou similar																
15.16	un	3,00	R\$	66,57	R\$	199,71		R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	199,71	0%
Papelina de louça, DECA 4480, 15 x 15cm ou similar																
15.17	UN	2,00	R\$	134,26	R\$	268,52		R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	268,52	0%
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)																
15.18	UN	2,00	R\$	134,26	R\$	268,52		R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	268,52	0%
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)																


15.19	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 103,55	R\$ 831,95	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 931,95	0%
15.20	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 52,88	R\$ 370,16	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 370,16	0%
15.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R\$ 59,63	R\$ 954,08	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 954,08	0%
15.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 59,63	R\$ 178,89	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 178,89	0%
15.23	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 69,07	R\$ 966,98	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 966,98	0%
15.24	DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO)	UN	10,00	R\$ 67,82	R\$ 678,20	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 678,20	0%
15.25	Dispenser para toalha interbaldada	un	14,00	R\$ 45,79	R\$ 641,06	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 641,06	0%
15.26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 360,56	R\$ 2.523,92	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 2.523,92	0%
15.27	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 349,21	R\$ 1.746,05	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 1.746,05	0%
15.28	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 332,16	R\$ 2.989,44	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 2.989,44	0%
15.29	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.027,87	R\$ 1.027,87	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1.027,87	0%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL										
16.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m²	1,14	R\$ 482,23	R\$ 549,74	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,14	R\$ 549,74	0%
16.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,24	R\$ 638,33	R\$ 153,20	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 0,24	R\$ 153,20	0%
16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	37,60	R\$ 50,37	R\$ 1.893,91	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 37,60	R\$ 1.893,91	0%
16.4	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	37,60	R\$ 18,46	R\$ 694,10	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 37,60	R\$ 694,10	0%
16.5	Fita anticorrosiva	Un	4,00	R\$ 8,20	R\$ 32,80	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 32,80	0%
16.6	REGULADOR 1º ESTÁGIO COM MANÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 159,05	R\$ 159,05	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 159,05	0%
16.7	REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO	un	2,00	R\$ 45,98	R\$ 91,96	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 91,96	0%
16.8	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45KG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 408,53	R\$ 408,53	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 408,53	0%
16.8.2	Placa de proibido fumar	Un	1,00	R\$ 76,94	R\$ 76,94	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 76,94	0%
16.8.3	Placa de perigo inflamável	Un	1,00	R\$ 76,94	R\$ 76,94	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 76,94	0%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO										
17.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 227,04	R\$ 1.362,24	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 1.362,24	0%
17.2	EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 761,41	R\$ 1.522,82	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 1.522,82	0%
17.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R\$ 132,05	R\$ 924,35	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 924,35	0%
17.4	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 140,35	R\$ 140,35	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 140,35	0%
17.5	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 84,55	R\$ 169,10	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 169,10	0%
17.6	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 183,90	R\$ 735,60	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 735,60	0%
17.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	63,00	R\$ 147,13	R\$ 9.269,19	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 63,00	R\$ 9.269,19	0%

17.8	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X80X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 1.525,01	R\$ 3.050,02	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 3.050,02	0%
17.9	TAMPAO FOFO P/CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 370,36	R\$ 370,36	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 370,36	0%
17.10	REGISTRO DE GAVEIA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 289,97	R\$ 1.449,85	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 1.449,85	0%
17.11	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 191,86	R\$ 575,58	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 575,58	0%
17.12	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 179,17	R\$ 716,68	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 716,68	0%
17.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36,00	R\$ 24,70	R\$ 889,20	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	36,00	R\$ 889,20	0%
17.14	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	10,00	R\$ 18,46	R\$ 184,60	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 184,60	0%
17.15	Bomba para incêndio a diesel 05 cv, recalque/sução de 2", vazão max. de 36,00 m³/h, hmax= 08 m.c.a	un	1,00	R\$ 2.826,84	R\$ 2.826,84	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 2.826,84	0%
17.16	ALARME SONOROVISUAL, SIRENE 120 dB, COMACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1,00	R\$ 219,18	R\$ 219,18	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 219,18	0%
17.17	ALARME SONOROVISUAL, SIRENE 120 dB, COMACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2,00	R\$ 219,18	R\$ 438,36	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 438,36	0%
17.18	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, foboluminescente, retangular, 20 x 40" cm, em pvc - 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	34,00	R\$ 27,31	R\$ 928,54	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	34,00	R\$ 928,54	0%
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V						0,00					
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO						0,00					
18.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 597,68	R\$ 597,68	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 597,68	0%
18.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 769,98	R\$ 1.539,96	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 1.539,96	0%
18.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 883,24	R\$ 2.649,72	R\$ -	2,00	R\$ 1.766,48	R\$ -	1,00	R\$ 883,24	67%
18.1.4	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR	UN	1,00	R\$ 99,54	R\$ 99,54	R\$ -	1,00	R\$ 99,54	R\$ -	0,00	R\$ -	100%
18.2	DISJUNTORES						0,00					
18.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	66,00	R\$ 11,69	R\$ 771,54	R\$ -	20,00	R\$ 233,80	R\$ -	46,00	R\$ 537,74	30%
18.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 12,39	R\$ 37,17	R\$ -	3,00	R\$ 37,17	R\$ -	0,00	R\$ -	100%
18.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 12,39	R\$ 24,78	R\$ -	2,00	R\$ 24,78	R\$ -	0,00	R\$ -	100%
18.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	R\$ 13,67	R\$ 218,72	R\$ -	12,00	R\$ 164,04	R\$ -	4,00	R\$ 54,68	75%
18.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 15,23	R\$ 60,92	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 60,92	0%
18.2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 22,11	R\$ 22,11	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 22,11	0%
18.2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 73,28	R\$ 146,56	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 146,56	0%
18.2.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 81,82	R\$ 327,28	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 327,28	0%
18.2.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 89,46	R\$ 178,92	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 178,92	0%
18.2.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 99,19	R\$ 198,38	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 198,38	0%

18.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	159,80	R\$	162,56	R\$	25.877,09	R\$	25.877,09	R\$	-	0,00	R\$	-	159,80	R\$	25.977,09	0%
18.5	ELETROCALHAS																	
18.5.1	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	75,20	R\$	100,10	R\$	7.527,52	R\$	7.527,52	R\$	-	0,00	R\$	-	75,20	R\$	7.527,52	0%
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS																	
18.6.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	95,00	R\$	30,71	R\$	2.917,45	R\$	1.381,95	R\$	-	45,00	R\$	-	50,00	R\$	1.535,50	47%
18.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	23,00	R\$	32,41	R\$	745,43	R\$	194,46	R\$	-	6,00	R\$	-	17,00	R\$	550,97	26%
18.6.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	3,00	R\$	43,10	R\$	129,30	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	129,30	0%
18.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	34,00	R\$	45,20	R\$	1.536,80	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	34,00	R\$	1.536,80	0%
18.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	3,00	R\$	25,33	R\$	75,99	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	75,99	0%
18.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	2,00	R\$	59,75	R\$	119,50	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	119,50	0%
18.6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	1,00	R\$	54,43	R\$	54,43	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	54,43	0%
18.6.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	10,00	R\$	30,71	R\$	307,10	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	10,00	R\$	307,10	0%
18.6.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	8,00	R\$	221,24	R\$	1.769,92	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	8,00	R\$	1.769,92	0%
18.6.10	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W)	UN	11,00	R\$	102,83	R\$	1.131,13	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	11,00	R\$	1.131,13	0%
18.6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	UN	78,00	R\$	118,28	R\$	9.225,84	R\$	39,00	R\$	4.612,92	39,00	R\$	4.612,92	39,00	R\$	4.612,92	50%
18.6.12	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	25,00	R\$	165,86	R\$	4.146,50	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	25,00	R\$	4.146,50	0%
18.6.13	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	17,00	R\$	205,96	R\$	3.501,32	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	17,00	R\$	3.501,32	0%
18.6.14	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	4,00	R\$	410,44	R\$	1.641,76	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	1.641,76	0%
18.6.15	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	1,00	R\$	410,44	R\$	410,44	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	410,44	0%
18.6.16	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	8,00	R\$	152,18	R\$	1.217,44	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	8,00	R\$	1.217,44	0%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO																	
19.1	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	M	63,90	R\$	15,20	R\$	971,28	R\$	971,28	R\$	-	63,90	R\$	-	0,00	R\$	-	100%
19.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	12,00	R\$	6,17	R\$	74,04	R\$	74,04	R\$	-	12,00	R\$	-	0,00	R\$	-	100%
19.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	14,00	R\$	5,75	R\$	80,50	R\$	80,50	R\$	-	14,00	R\$	-	0,00	R\$	-	100%
19.4	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	3,00	R\$	9,10	R\$	27,30	R\$	27,30	R\$	-	3,00	R\$	-	0,00	R\$	-	100%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA																	
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS																	
20.1.1	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	UN	3,00	R\$	948,33	R\$	2.844,99	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	2.844,99	0%
20.1.2	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	1,00	R\$	507,92	R\$	507,92	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	507,92	0%
20.1.3	GUIA DE CABO SIMPLES	UN	2,00	R\$	41,83	R\$	83,66	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	83,66	0%
20.1.4	GUIA DE CABOS DE VERTICAL FECHADO	UN	1,00	R\$	41,83	R\$	41,83	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	41,83	0%
20.1.5	GUIA DE CABO VERTICAL	UN	2,00	R\$	41,83	R\$	83,66	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	83,66	0%
20.1.6	GUIA DE CABOS SUPERIOR FECHADO	UN	1,00	R\$	41,83	R\$	41,83	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	41,83	0%
20.1.7	BANDEJA MOVEL, PADRAO 19"	UN	2,00	R\$	65,67	R\$	131,34	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	131,34	0%
20.1.8	Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm	un	1,00	R\$	726,43	R\$	726,43	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	726,43	0%

		UN	2,00	R\$	634,89	R\$	1.269,78	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	2,00	R\$	1.269,78	0%	
20.1.9	ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHZ - 300 MPBS	UN	2,00	R\$	634,89	R\$	1.269,78	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	2,00	R\$	1.269,78	0%	
20.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS																				
20.2.1	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	579,00	R\$	14,57	R\$	8.436,03	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	579,00	R\$	8.436,03	0%	
20.2.2	CABO LÓGICO/VIDE COAXIAL 50 (OHMS)	M	113,00	R\$	13,66	R\$	1.543,58	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	113,00	R\$	1.543,58	0%	
20.2.3	PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	UN	19,00	R\$	17,77	R\$	337,63	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	19,00	R\$	337,63	0%	
20.3	TOMADAS																				
20.3.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	UN	19,00	R\$	39,49	R\$	750,31	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	19,00	R\$	750,31	0%	
20.3.2	Tomada completa TV/SAT	un	8,00	R\$	72,64	R\$	581,12	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	8,00	R\$	581,12	0%	
20.3.3	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (para-raio)	Un	10,00	R\$	42,93	R\$	429,30	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$	429,30	0%	
20.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS																				
20.4.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	R\$	244,68	R\$	978,72	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	4,00	R\$	978,72	0%	
20.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	27,00	R\$	16,01	R\$	432,27	R\$	27,00	R\$	432,27	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	100%	
20.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS																				
20.5.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	15,20	R\$	10,38	R\$	157,78	R\$	15,20	R\$	157,78	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	100%	
20.5.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	112,05	R\$	9,84	R\$	1.102,57	R\$	112,05	R\$	1.102,57	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	100%	
20.5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	4,80	R\$	18,01	R\$	86,45	R\$	4,80	R\$	86,45	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	100%	
20.5.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016_P	M	55,20	R\$	28,10	R\$	1.551,12	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	55,20	R\$	1.551,12	0%	
20.5.5	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	51,65	R\$	57,43	R\$	2.966,26	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	51,65	R\$	2.966,26	0%	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA																				
21.1	Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar	un	1,00	R\$	1.920,13	R\$	1.920,13	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1.920,13	0%	
21.2	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL, D= 400MM	UN	1,00	R\$	1.468,08	R\$	1.468,08	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1.468,08	0%	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)																				
22.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	1,00	R\$	113,47	R\$	113,47	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	113,47	0%	
22.2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	108,60	R\$	11,47	R\$	1.245,64	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	108,60	R\$	1.245,64	0%	
22.3	SUPOORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	11,00	R\$	24,49	R\$	269,39	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	11,00	R\$	269,39	0%	
22.4	Abracaçãodeita-guia reforçada 2"	un	4,00	R\$	9,62	R\$	38,48	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	4,00	R\$	38,48	0%	
22.5	SUPOORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	33,00	R\$	24,49	R\$	808,17	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	33,00	R\$	808,17	0%	
22.6	Caixa de atualização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00	R\$	307,60	R\$	307,60	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	307,60	0%	
22.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	26,18	R\$	89,52	R\$	2.343,63	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	26,18	R\$	2.343,63	0%	
22.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	m³	26,18	R\$	41,63	R\$	1.089,87	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	26,18	R\$	1.089,87	0%	
22.9	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	11,00	R\$	94,61	R\$	1.040,71	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	11,00	R\$	1.040,71	0%	
22.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	M	26,00	R\$	35,07	R\$	911,82	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	26,00	R\$	911,82	0%	
22.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	M	261,00	R\$	63,70	R\$	16.625,70	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	261,00	R\$	16.625,70	0%	
22.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	M	174,50	R\$	82,38	R\$	14.375,31	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	174,50	R\$	14.375,31	0%	
22.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	11,00	R\$	45,07	R\$	495,77	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	11,00	R\$	495,77	0%	
22.14	TERMINAL DE PRESSÃO P/CABOS ATÉ 35MM2	UN	251,00	R\$	13,53	R\$	3.396,03	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	251,00	R\$	3.396,03	0%	
22.15	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	22,00	R\$	37,07	R\$	815,54	R\$	0,00	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	22,00	R\$	815,54	0%	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																				
23.1	GERAIS																				

CINQUENTA E SEIS CENTAVOS


MÁRCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.650.110/0001-27
Fábio da Silva Oliveira
Sócio Administrador


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.044.77.8





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6CVJA-4GDJ7-W7EY3-E3Y6S

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/6CVJA-4GDJ7-W7EY3-E3Y6S>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 13ª MEDIÇÃO – CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA VÁRZEA DA PEDRA,
CONFORME P. ADM 215/2022, CONTRATO Nº 255/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

DATA: 18/03/2024



FOTO 201: PAREDE DE DRYWALL



FOTO 202: PAREDE DE DRYWALL



Tony Felix Andre da
Lacerda
CREMBA 032017/77.8

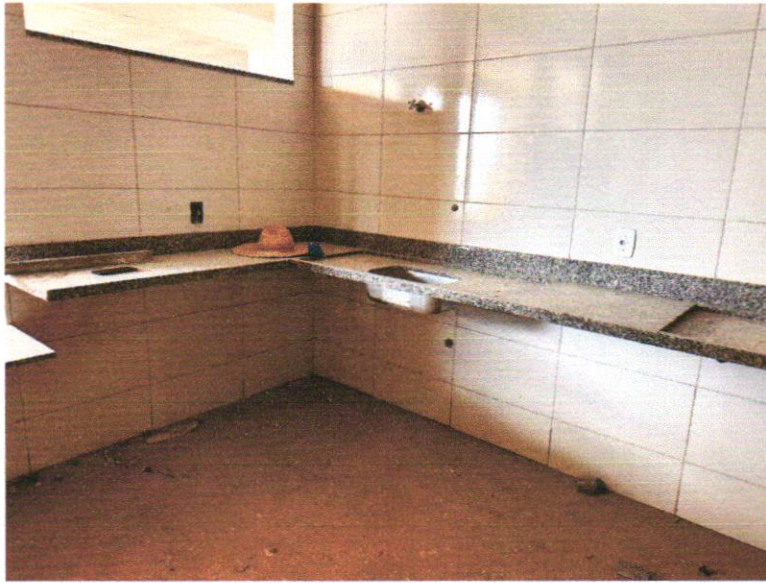


FOTO 203: INSTALAÇÃO BANCADA E CUBA INOX



FOTO 204: INSTALAÇÃO CUBA INOX



Tony Felix Andrade
Corretor de Imóveis
CNPJ nº 092.093.477.8

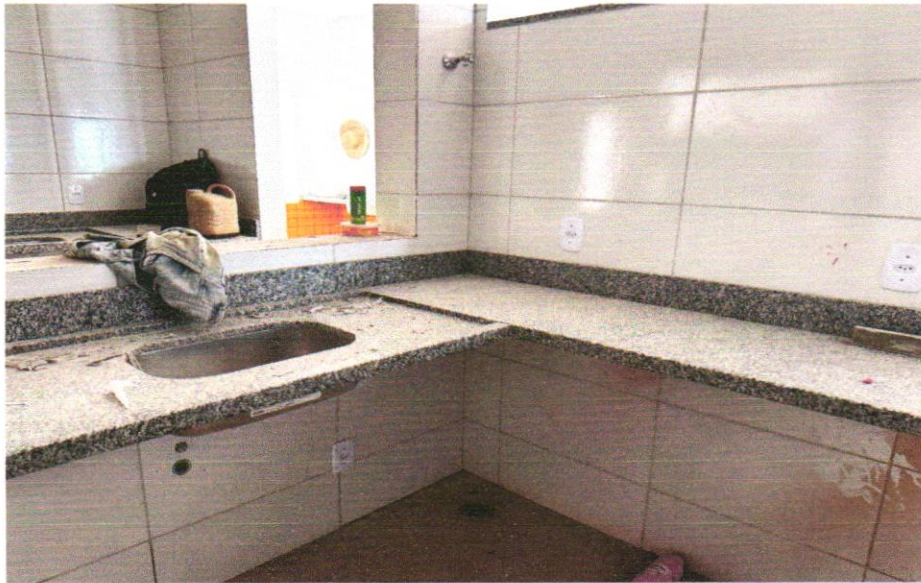


FOTO 205: INSTALAÇÃO BANCADA E CUBA INOX



FOTO 206: INSTALAÇÃO CUBA INOX

Tony Felix A. ...
C.R.N. ... 77.8





FOTO 207: INSTALAÇÃO BANCADA E CUBA INOX



FOTO 208: INSTALAÇÃO BANCADA E CUBA DE LOUÇA



Tony Felix Andrade
R
CNPJ nº 032111177.8



FOTO 211: PINTURA

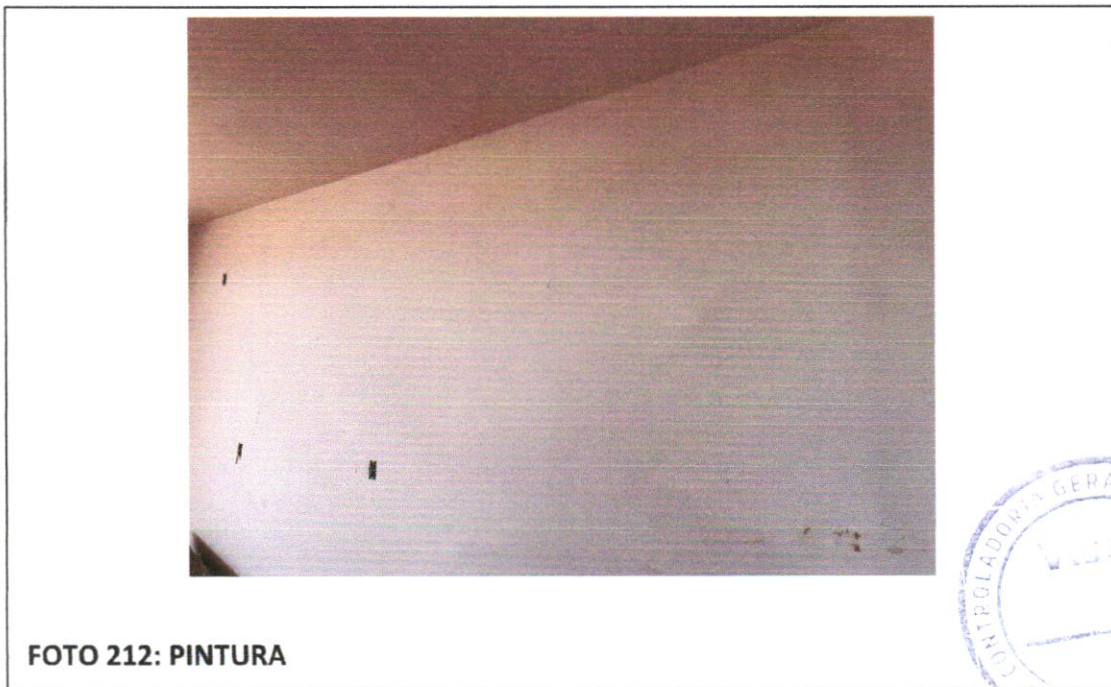


FOTO 212: PINTURA



Tony F. Almeida
CPF: 052.069.677.8



FOTO 213: ASSENTAMENTO PASTILHA 10X10



FOTO 214: ASSENTAMENTO PASTILHA 10X10



Tony Foll...
Ar...
052... 17.8

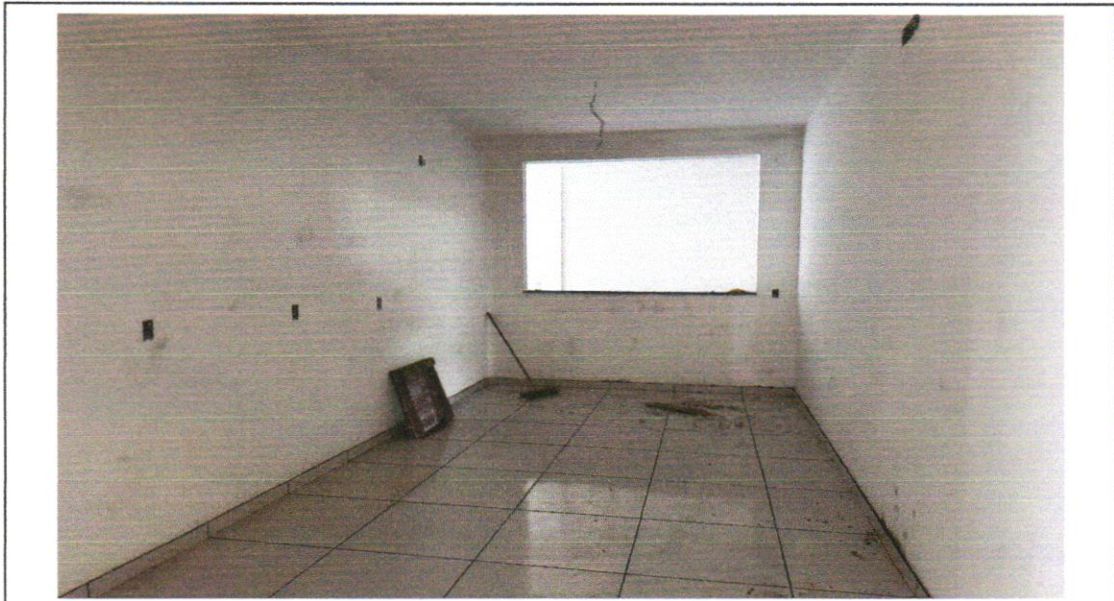


FOTO 215: ASSENTAMENTO PISO CERÂMICO E PINTURA

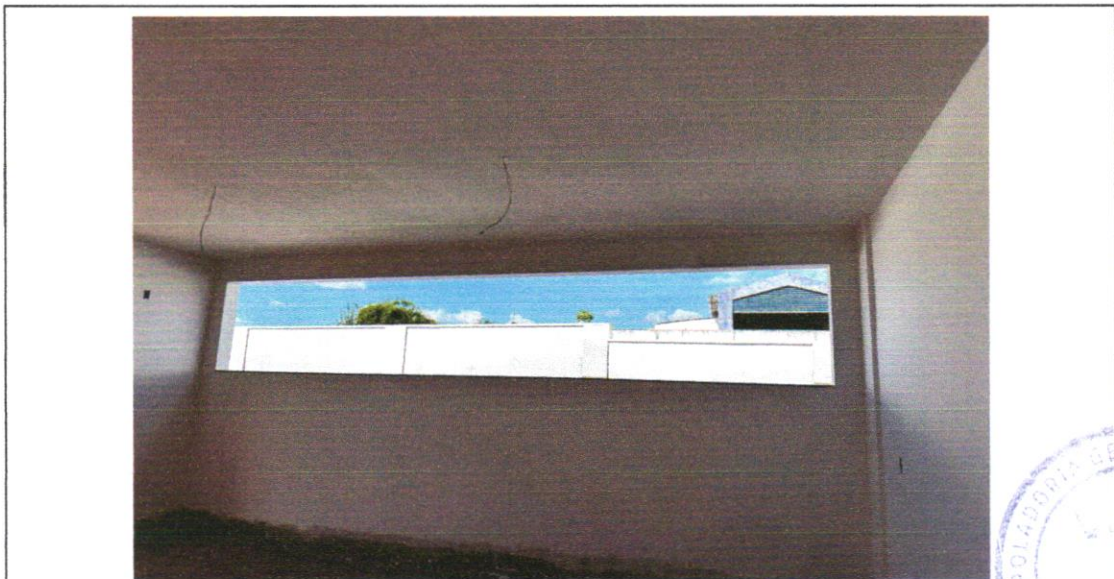


FOTO 216: PINTURA



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CRÉD. Nº 052.059.877.8

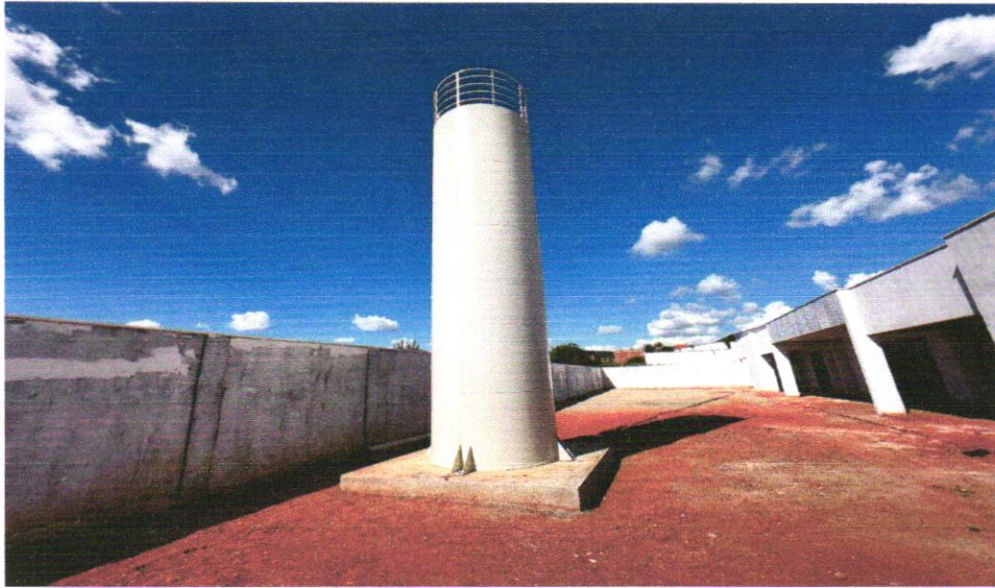


FOTO 217: CASTELO D'ÁGUA

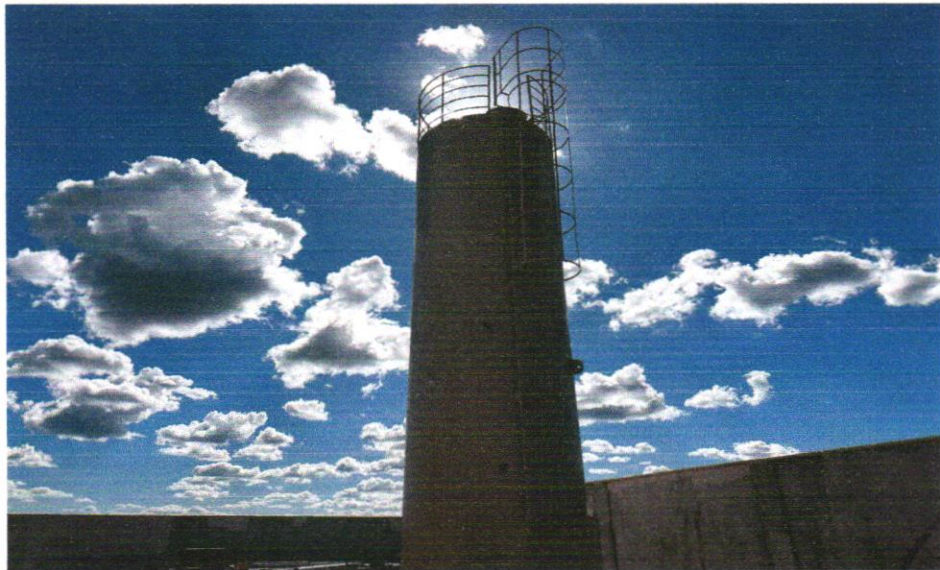


FOTO 218: CASTELO D'ÁGUA



Tomy F. A. Almeida
Lisboa
CITR 194.0524/2017 7.3



Tony F. Almeida
Engenheiro
CREA/BA. 062.000.077.8





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YBRZH-2L9FE-E6VGS-H7N2H

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/YBRZH-2L9FE-E6VGS-H7N2H>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>






RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 486
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período:	01/03/2024
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONCLUSÃO DA CONFEÇÃO DA MONTAGEM DA COBERTURA METÁLICA (PÁTIO) - ADITIVO CONTINUAÇÃO DA PINTURA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO		Condição do Tempo	
		Manhã	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Tarde	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Noite	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
		Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1		
Administrativo	1		
Mestre de Obras	1		
Pedreiro	5		
Ajudante Comum	10		
Armador	2		
Serralheiro	0		
Eletricista	2		
Gesseiro	2		
Pintor	4		
TOTAL	28		



ASSINATURAS:	
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA Engenheiro Civil CREA-BA: 052.010.377.8	 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI [19.650.110/0001-27] ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO [48.860-000 - QUEIMADAS-BA]

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/DRVHV-5YK32-7J8GL-R5L95>.






RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 487
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período:	
SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA		02/03/2024	
		Condição do Tempo	
		Manhã	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		Tarde	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		Noite	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
Função	Qtde.		
Engenheiro Civil	1		
Administrativo	1		
Mestre de Obras	1		
Pedreiro	6		
Ajudante Comum	10		
Amador	2		
Serralheiro	0		
Eletricista	2		
Gesseiro	2		
Pintor	4		
TOTAL	28		



ASSINATURAS:

Tony Ferraz Andrade
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA 7.8

ARCO CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUTORES
E EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
48.860-000 - QUEIMADAS-BA







RELATÓRIO DE OBRA


INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 488
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período:	
DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA		03/03/2024	
		Condição do Tempo	
		Manhã	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Tarde	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Noite	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
Função	Qtde.		
Engenheiro Civil	1		
Administrativo	1		
Mestre de Obras	1		
Pedreiro	6		
Ajudante Comum	10		
Armador	2		
Serraheiro	0		
Eletricista	2		
Gesseiro	2		
Pintor	4		
TOTAL	28		



ASSINATURAS:


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA, 8
 Eng. Alex Andrade
 CREA-BA, 022.000.000-0/8


 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 [19.650.110/0001-27]
 ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 [48.860-000 - QUEIMADAS-BA]

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/DRVHV-5YK32-7J8GL-R5L95>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 489
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 04/03/2024
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO

Condição do Tempo


Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	2
Pintor	4
TOTAL	28



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27
**ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI**
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022		Nº:	490
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA		RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022			
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI			

ANOTAÇÕES		Período:	05/03/2024																								
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DA PINTURA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DE PASTILHAS 10X10		Condição do Tempo Manhã <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável Tarde <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável Noite <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável																									
		EFETIVO DA OBRA ARCO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Função</th> <th>Qtde.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Engenheiro Civil</td><td>1</td></tr> <tr><td>Administrativo</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mestre de Obras</td><td>1</td></tr> <tr><td>Pedreiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Ajudante Comum</td><td>10</td></tr> <tr><td>Amador</td><td>2</td></tr> <tr><td>Serralheiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Eletricista</td><td>2</td></tr> <tr><td>Gesseiro</td><td>2</td></tr> <tr><td>Pintor</td><td>4</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>28</td></tr> </tbody> </table>		Função	Qtde.	Engenheiro Civil	1	Administrativo	1	Mestre de Obras	1	Pedreiro	6	Ajudante Comum	10	Amador	2	Serralheiro	0	Eletricista	2	Gesseiro	2	Pintor	4	TOTAL	28
Função	Qtde.																										
Engenheiro Civil	1																										
Administrativo	1																										
Mestre de Obras	1																										
Pedreiro	6																										
Ajudante Comum	10																										
Amador	2																										
Serralheiro	0																										
Eletricista	2																										
Gesseiro	2																										
Pintor	4																										
TOTAL	28																										

ASSINATURAS:

Tony F. Andrade
 Engenheiro
 CREA-BA 000000000 7.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACARREIRA, 25 - CORUMBÁ
 L 48.860-000 - QUEIMADAS - BA





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 491
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 06/03/2024
-----------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DE PASTILHAS 10X10

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	2
Pintor	4
TOTAL	28

ASSINATURAS:	 Tony Felício Andrade PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
--------------	--	---

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 492
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 07/03/2024
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DE PASTILHAS 10X10

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável


Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	2
Pintor	4
TOTAL	28



ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 CREA-BA: 03-... 77.8

Z
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

[19.650.110/0001-27]
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 [48.860-000 - QUEIMADAS-BA]






RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 493
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período:	08/03/2024
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DA PINTURA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DE PASTILHAS 10X10		Condição do Tempo	
		Manhã	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Tarde	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Noite	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
		Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1		
Administrativo	1		
Mestre de Obras	1		
Pedreiro	6		
Ajudante Comum	10		
Armador	2		
Serraheiro	0		
Eletricista	2		
Gesseiro	2		
Pintor	4		
TOTAL	28		



ASSINATURAS:	Tony Felício Andrade Responsável Técnico CREA-BA 7.8	ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
--------------	--	---

[19.650.110/0001-27]
ARCO CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 [48.860-000 - QUEIMADAS-BA]





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	494
-----	------------

ANOTAÇÕES

Período:	09/03/2024
----------	------------

SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo


Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	2
Pintor	4
TOTAL	28



ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 Eng.º
 CREA/BA: 052.000/77.8

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

[19.650.110/0001-27]
**ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI**
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 [48.860-000 - QUEIMADAS-BA]





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 495
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

Período: 10/03/2024

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA


Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável
Tarde
 Bom Chuva Não Operável
Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	2
Pintor	4
TOTAL	28



ASSINATURAS:

Tony Feli *[Handwritten Signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

[Handwritten Signature]

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

[19.650.110/0001-27]
ARCO CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
[48.860-000 - QUEIMADAS-BA]





RELATÓRIO DE OBRA


INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 496
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 11/03/2024
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DE PASTILHAS 10X10
 INÍCIO DA INSTALAÇÃO DAS BANCADAS DE GRANITO
 INÍCIO DA INSTALAÇÃO DAS CUBAS INOX
 INÍCIO DA INSTALAÇÃO DAS CUBAS DE LOUÇA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	2
Pintor	4
TOTAL	28



ASSINATURAS:	
 Felix Anderson 170	 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VARZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	497
-----	------------

ANOTAÇÕES

Período:	12/03/2024
----------	------------


Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	2
Pintor	4
TOTAL	28

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DA PINTURA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DE PASTILHAS 10X10
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS BANCADAS DE GRANITO
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS CUBAS INOX
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS CUBAS DE LOUÇA



ASSINATURAS:

[Signature]
 Tony Felix Arapêdo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.089.477-8

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CONTORNO
 48.360-000 - OURINHOS-DAS-BA

[Signature]

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5DY73-HJS95-KNNCP-ZM88F

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/5DY73-HJS95-KNNCP-ZM88F>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>








RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 498
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período:	
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DA PINTURA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DE PASTILHAS 10X10 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS BANCADAS DE GRANITO CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS CUBAS INOX CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS CUBAS DE LOUÇA		13/03/2024	
		Condição do Tempo	
		Manhã	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		Tarde	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		Noite	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
Função	Qtde.		
Engenheiro Civil	1		
Administrativo	1		
Mestre de Obras	1		
Pedreiro	6		
Ajudante Comum	10		
Armador	2		
Serralheiro	0		
Eletricista	2		
Gesseiro	2		
Pintor	4		
TOTAL	28		



ASSINATURAS:	 Tony Felício Engenheiro Civil 177.8	 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
--------------	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA







RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 499
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	


ANOTAÇÕES		Período:	14/03/2024
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DA PINTURA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DE PASTILHAS 10X10 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS BANCADAS DE GRANITO CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS CUBAS INOX CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS CUBAS DE LOUÇA		Condição do Tempo	
		Manhã	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Tarde	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Noite	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
		Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1		
Administrativo	1		
Mestre de Obras	1		
Pedreiro	6		
Ajudante Comum	10		
Armador	2		
Serralheiro	0		
Eletricista	2		
Gesseiro	2		
Pintor	4		
TOTAL	28		



ASSINATURAS:



 Tony F. A.
 Engenheiro
 04.02.2024



 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

[19.650.110/0001-27]
ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 [48.860-000 - QUEIMADAS-BA]





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	500
-----	------------

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DE PASTILHAS 10X10
 CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DAS BANCADAS DE GRANITO
 CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DAS CUBAS INOX
 CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DAS CUBAS DE LOUÇA
 INSTALAÇÃO DO TANQUE (CASTELO D'ÁGUA)

Período:	15/03/2024
----------	------------

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA


ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	2
Pintor	4
TOTAL	28

ASSINATURAS:

Tony Fally Assis de
 Engenheiro Civil
 CREMBA: 0320-178

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUIRINHA

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/DRVHV-5YK32-7J8GL-R5L95>.






RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 501
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Periodo: 16/03/2024
-----------	---------------------

SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA		
ARCO		
Função	Qtde.	
Engenheiro Civil	1	
Administrativo	1	
Mestre de Obras	1	
Pedreiro	6	
Ajudante Comum	10	
Armador	2	
Serralheiro	0	
Eletricista	2	
Gesseiro	2	
Pintor	4	
TOTAL	29	



ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 Tel: 052 060.877.8

[Assinatura]

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/DRVHV-5YK32-7J8GL-R5L95>.






RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 502
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	


ANOTAÇÕES Período: 17/03/2024

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serraheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	2
Pintor	4
TOTAL	28



ASSINATURAS:


 Tony Felix Aranda
 Engenheiro Civil
 CPF: 073.817.317-3
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA


 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 503
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	



ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DE PASTILHAS 10X10

Período:	18/03/2024
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	2
Gesseiro	2
Pintor	4
TOTAL	28

ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27
**ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI**
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/DRVHV-5YK32-7J8GL-R5L95>.





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DRVHV-5YK32-7J8GL-R5L95

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/DRVHV-5YK32-7J8GL-R5L95>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

