



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 214-2022

EMPENHO: 394 / 2024	Data do Empenho: 22/03/2024	TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal
---------------------	-----------------------------	-----------------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	5473 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	RUA JOSE CLEMENTE, 292	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	
CNPJ:	21.763.372/0001-40	Insc. Estadual:	
CPF:		CPF:	
Conta Corrente:	10495-7	Agência:	4171-8
		Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
		RG:	
		Estado:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Concorrência para obras e serviços de engenharia	Nº Lic.:	002-2022CP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	072-2023	4.107.281,06	238.797,63	3.868.483,43
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DELODA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO 072/2023. CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/03/2024 À 20/03/2024. NFS-e 469.

Data do Empenho: 22/03/2024	Data do Liquidação: 02/04/2024
-----------------------------	--------------------------------



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	15.760,64
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	2.865,57
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	7.163,93
## Duzentos e treze mil e sete reais e quarenta e nove centavos ##		Valor Retido
		25.790,14
		Valor Líquido
		213.007,49

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS


NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	02/04/2024	469	U			238.797,63

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	238.797,63

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 02/04/2024.</p>  <p>ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 02/04/2024, podendo efetuar o pagamento.</p>  <p>NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408</p>
---	---

3493598

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: TEOFILÂNDIA Código: 2931509 UF: BA Código: 29</p>	<p>Nº da Nota: 469</p> <p>Data/Hora: 02/04/2024 11:51:05 04/2024</p> <p>Ass. Digital: 2222641106222602/04/2024</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA LTDA</p> <p>Nome Fantasia: RIBEIRO E ANJOS ENGENHARIA</p> <p>Endereço: RUA JOSÉ CLEMENTE, 292</p> <p>Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: TEOFILÂNDIA</p> <p>Fone: - Email: ribeiroeanhos.engenharia@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 21.763.372/0001-40 I.M.: 000.001.065/001-24 I.E./RG: 145.741.972-PP ISS: EXIGÍVEL</p> <p align="right">Aliq.: Variável CEP: 4877000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ</p> <p>Endereço: PRAÇA CORONEL LEITÃO CEP: 0000-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: SANTALUZ - COD.MUNIC.: 2928000 UF: BA</p> <p>Fone: 0 Email: sem</p> <p>CNPJ/CPF: 13.807.870/0001-19 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>Medição 01 referente à Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na pavimentação de ruas da sede - BAIRRO DELODA do município de Santaluz - BA. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº002/2022, com seus Anexos E CONTRATO 072/2023.</p> <p>60% MATERIAL: R\$ 143.278,57 40% MÃO DE OBRA: R\$ 95.519,06</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4171-8 CONTA CORRENTE 10.495-7</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <div data-bbox="853 996 1292 1176" style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)</p> <p>EM 02/04/24 <i>Tony F. Andrade</i> ASSINATURA</p> </div> <p align="right">Engenheiro Civil CREA-BA: 052.069.877.8</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: SANTALUZ-BA Incidência do Imposto: SANTALUZ-BA</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10.507,09</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507,09	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	10.507,09	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>238.797,63</td> <td>143.278,57</td> <td>0,00</td> <td>95.519,06</td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> <td>1.910,38</td> <td>0,00</td> <td>226.380,16</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	238.797,63	143.278,57	0,00	95.519,06	2,00	0,00	1.910,38	0,00	226.380,16
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido												
238.797,63	143.278,57	0,00	95.519,06	2,00	0,00	1.910,38	0,00	226.380,16												
<p>CNAE: 4120-4/00 construção de edifícios</p>																				
<p>Item de serviço: 07.02 - Execução; por administração; empreitada ou subempreitada; de obras de construção civil; hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes; inclusive sondagem; perfuração de poços; escavação; drenagem e irrigação; terraplanagem; pavimentação; concretagem e a instalação e montagem de produtos; peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços; que fica sujeito ao ICMS).</p>																				
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 65/2022</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$1.910,38 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 10.507,09</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: https://www.teofilandia.ba.gov.br</p>																				



ISSQN Terceiros

Nº DAM 381710	CONTRIBUINTE 21041 - Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda			INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: José Clemente				NÚMERO: 292
COMPLEMENTO	BAIRRO Centro	MUNICÍPIO: TEOFILÂNDIA	UF BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 21.763.372/0001-40		R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUCIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 143.278,57	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 7.163,93	Taxa Expediente R\$	Valor Total R\$: 7.163,93
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO 30/04/2024	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 03/04/2024 03:56:54	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 469 - DATA DE EMISSÃO: 02/03/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	7.163,93
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	7.163,93



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000071 . 6 63933906202 . 3 40430010500 . 8 00038171012 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000071 . 6 63933906202 . 3 40430010500 . 8 00038171012 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Março	Nº DAM: 381710	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 03/04/2024 03:56:54	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	7.163,93
Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda			(=) VALOR A PAGAR - R\$	7.163,93



I.R.R.F

Nº DAM 381709	CONTRIBUINTE 21041 - Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda		INSCRIÇÃO 21041	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Rua José Clemente				NÚMERO: 292
COMPLEMENTO:		BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: TEOFILÂNDIA	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 21.763.372/0001-40	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CODIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 2.865,57	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 2.865,57	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 2.865,57
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO 03/04/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 03/04/2024 03:53:37	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.865,57
Valor do Tributo:	2.865,57	Vir. Devido sem Desconto (VD):	2.865,57	
Taxa de Expediente:		Vir. do Desconto:	0,00	
Valor de Base Cálculo:	2.865,57	Vir. Devido com Desconto	2.865,57	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
INSTRUÇÕES			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) MULTA DE MORA - R\$	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$	
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(-) VALOR A PAGAR - R\$	2.865,57
4) NF-e N° 469 - Data de emissão: 02/03/2024				



P.L.

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000028 . 4

65573906202 . 5

40430010100 . 7

00038170907 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000028 . 4

65573906202 . 5

40430010100 . 7

00038170907 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA 1/1	Nº DAM 381709	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 03/04/2024 03:53:37	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO: 21041			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.865,57
Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.865,57



P.L.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.763.372/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 05:25:52 do dia 13/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/05/2024.

Código de controle da certidão: **AB51.2833.E108.A21E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20241109883

RAZÃO SOCIAL	
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
145.741.972 - BAIXADO	21.763.372/0001-40

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 13/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/ OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.763.372/0001-40
Razão Social: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA JOSE CLEMENTE 292 A / CENTRO / TEOFILANDIA / BA / 48770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2024 a 14/04/2024

Certificação Número: 2024031604102216680390

Informação obtida em 20/03/2024 12:07:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.763.372/0001-40
Certidão nº: 14685012/2024
Expedição: 04/03/2024, às 12:09:43
Validade: 31/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.763.372/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 06/03/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000032/2024

Emissão: 01/03/2024

Validade: 30/05/2024

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA LTDA

CGA: 000.001.065/001-24

CPF/CNPJ: 21.763.372/0001-40

CNAE: 4120-4/00

RUA JOSÉ CLEMENTE, 292

CENTRO

4877000 - TEOFILÂNDIA - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: VIA WEB



002202400000320000097991



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 02/04/2024

A empresa:

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob nº21.763.372/0001-40

Endereço:

RUA JOSE CLEMENTE, 292, CENTRO, TEOFILÂNDIA CEP: 4877000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na pavimentação de ruas da sede do município de Santaluz-BA.
Processo Licitatório: CP 002/2022
Contrato: 072/2022 Nº da obra: 111/2024
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 469 VALOR DA NOTA: R\$ 238.797,63 PERIODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2024 A 20/03/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 02, DCTFWEB CP 02.
CONTA: AGÊNCIA 4171 C/C: 10495-7 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

Gestor de contratos
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.013.177.8



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022

Nº CONTRATO: 072/2023

OBRA Nº 111/2024

VALOR DA 1ª MEDIÇÃO : R\$ 238.797,63

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/03/2024 a 20/03/2024

OBJETO: contratação de empresa para execução de pavimentação na sede do município de Santaluz-BA

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDEIMENTOS E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 21.763372/0001-40

BAIRRO DELDDA																		
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01																		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	total	QUANTIDADE		VALORES		SALDO	SALDO QUANTIDADE	%			
									PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO						
SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$	2.868,78									
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalado - Rev 02_01/2022	m²	5,00	384,01	478,13	R\$ 2.868,78				R\$ 2.868,78	-		0,00%			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$	165.305,96									
2.1	00778	SINAPI	ENGENHEIRO CML DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.132,00	120,34	146,03	R\$ 165.305,96	80,00	822,00	R\$ 11.682,40	R\$ 120.036,66	R\$ 45.269,30	310,00	27,39%			
PAVIMENTAÇÃO								R\$	4.008.726,01									
3.1	101189	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	33.627,74	81,28	98,63	R\$ 3.316.703,99	1.883,82	25.404,11	R\$ 185.801,17	R\$ 2.505.607,37	R\$ 811.096,62	8.223,63	24,45%			
3.2	84273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO MÁRIO), AF_06/2016	M	12.518,47	45,56	55,28	R\$ 692.021,02	747,36	9.541,70	R\$ 41.314,06	R\$ 527.465,18	R\$ 184.555,84	2.976,77	23,78%			
SINALIZAÇÃO VERTICAL								R\$	26.684,74									
4.1	4249	ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 19 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto adesiva	Un	114,00	122,50	148,65	R\$ 16.946,10	-	-	-	-	R\$ 16.946,10	114,00	100,00%			
4.2	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	76,00	105,60	128,14	R\$ 9.738,64	-	-	-	-	R\$ 9.738,64	76,00	100,00%			
Total Geral								R\$	4.203.584,49			R\$	238.797,63	R\$	3.155.977,99	R\$	1.047.606,50	24,92%

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por FYLLIPE
DE OLIVEIRA RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 16:05:09 -03'00'

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.094/177.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA		CATEGORIA		QTDE				
CONTRATO N° 072-2023 LICITAÇÃO N° 002-2022 RDO: 1		MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		SERVIDORES DE OBRA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Engenheiro 1						
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro 1						
		Ajudante Geral 2						
		Calçeteiro 4						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
Motorista de caçamba								
Pintor								
Serralheiro								
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
GERENTE DE OBRA:		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE.						
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
Patrol								
PC 200								
Placa Vibratória								
Data: 01/03/2024		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 01/03/2024								

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por
FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 10:26:22 -03'00'

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.050.377.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA		CATEGORIA			QTDE			
CONTRATO Nº 072-2023		LICITAÇÃO Nº 002-2022			RDO: 2			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
SEM SERVIÇO		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
Topografo								
Auxiliar de topografia								
Pedreiro								
Ajudante Geral								
Calçateiro								
Carpinteiro								
Operador de Motosserra								
Motorista								
Montador								
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor								
Serralheiro								
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
PC 200								
Pícea Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/03/2024		Data: 02/03/2024						

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por
FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 10:26:36 -03'00'

Tony Felipe Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.030.177-8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 092-2022 RDO: 3				MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança							
SEM SERVIÇO				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
Pedreiro											
Ajudante Geral											
Calçateiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Pícea Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/03/2024				Data: 03/03/2024							

FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO:0418041156
 Assinado de forma digital por
 FYLLIPE DE OLIVEIRA
 RIBEIRO:04180411563
 Dados: 2024.04.02 10:26:58 -03'00'

3

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000/177.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X	T	Q	Q	S	S	D
		S						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA		CATEGORIA			QTDE			
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 4		MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas:	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.	Engenheiro 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Tec. de Segurança						
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
Pedreiro 1								
Ajudante Geral 2								
Calceteiro 4								
Carpinteiro								
Operador de Motoserra								
Motorista								
Montador								
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor								
Serralheiro								
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munk						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/03/2024		Data: 04/03/2024						

FYLLIPE DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por
 RIBEIRO:04180411563 FYLLIPE DE OLIVEIRA
 RIBEIRO:04180411563
 Dados: 2024.04.02 10:27:14 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro
 CREA BA 00210 77.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 5				MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança							
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO ASSENTAMENTO DE PARALELO				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
Auxiliar de topografia											
Pedreiro 1											
Ajudante Geral 2											
Calceteiro 4											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/03/2024				Data: 05/03/2024							

FYLLIPE DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por
FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:0418041156 RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 10:27:28
-03'00'

3

Tony Felix Andrade
Eng.º Civil
CREA/BA: 052.609.477.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 6				MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO ASSENTAMENTO DE PARALELO				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
				Ajudante Geral 2							
				Calceteiro 4							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
				Elettricista							
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/03/2024				Data: 06/03/2024							

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por
FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 10:27:42 -03'00'

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 052.000.77.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA		CATEGORIA		QTDE				
CONTRATO N° 072-2023 LICITAÇÃO N° 002-2022 RDO: 7		MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: (7)		Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Engenheiro 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Tec. de Segurança						
ASSENTAMENTO DE PARALELO		Aux Adm						
REJUNTAMENTO DE PARALELO		Mestre de obra						
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro 1						
		Ajudante Geral 2						
		Calçeteiro 4						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Ejeticista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/03/2024		Data: 07/03/2024						

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:0418041156
3

Assinado de forma digital por
FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 10:28:18 -03'00'

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 05267/2017-8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 8				MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTAMENTO DE PARALELO ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
				Ajudante Geral 2							
				Calçateiro 4							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Pícea Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/03/2024				Data: 08/03/2024							

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por
FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 10:28:35 -03'00'

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA/BA 032400778

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA								
CONTRATO Nº 072-2023		LICITAÇÃO Nº 092-2022		RDO: 9		CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()					
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra						
SEM SERVIÇO		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA				
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calçeteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/03/2024		Data: 09/03/2024						

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por
FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 10:28:49 -03'00'

Fylype de Oliveira
7.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA						CATEGORIA			QTDE				
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 10						MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.						Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança							
SEM SERVIÇO						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
												MÃO DE OBRA DIRETA	
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calçeteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO			QTDE.				
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 10/03/2024						Data: 10/03/2024							

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por
FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 10:29:06 -03'00'

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CRÉD. BA. 032.169.177.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 11				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
				Ajudante Geral 2							
				Calçeteiro 4							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/03/2024				Data: 11/03/2024							

FYLLIPE DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por
 RIBEIRO:04180411563 FYLLIPE DE OLIVEIRA
 RIBEIRO:04180411563
 Dados: 2024.04.02 10:29:20 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA Nº. 032465/77.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 12				MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO ASSENTAMENTO DE PARALELO				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
				Ajudante Geral 2							
				Calçeteiro 4							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/03/2024				Data: 12/03/2024							

FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO:04180411563
 Assinado de forma digital por FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO:04180411563
 Dados: 2024.04.02 10:29:39 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.877.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 092-2022 RDO: 13				MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança							
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO ASSENTAMENTO DE PARALELO				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
				Ajudante Geral 2							
				Calceteiro 4							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/03/2024				Data: 13/03/2024							

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por
FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 10:29:56 -03'00'

Tony Felix
Engenheiro
077.8
0521 7,6

RELATORIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 14				S	T	Q	X	Q	S	S	D
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA				CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTAMENTO DE PARALELO				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
				Ajudante Geral 2							
				Calceteiro 4							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/03/2024				Data: 14/03/2024							

FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO:04180411563
 Assinado de forma digital por FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO:04180411563
 Dados: 2024.04.02 10:30:13 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.094.377.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO N° 072-2023 LICITAÇÃO N° 002-2022 RDO: 15						S	T	Q	Q	X	S	S	D				
												EFETIVO PESSOAL					
						CATEGORIA				QTDE							
						MÃO DE OBRA INDIRETA											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1											
SIMBOLOGIA: ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTAMENTO DE PARALELO						SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
						MÃO DE OBRA DIRETA											
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceteiro 4 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro											
						Hh DO DIA											
						RESUMO DO EFETIVO											
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO											
						EFETIVO EQUIPAMENTOS											
						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:											
Data: 15/03/2024						Data: 15/03/2024											

FYLLIPE DE OLIVEIRA
 RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por
 FYLLIPE DE OLIVEIRA
 RIBEIRO:04180411563
 Dados: 2024.04.02 10:30:29 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro S. III
 CREA-BA: 052.643 577.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 16				QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra						
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança						
SEM SERVIÇO				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Elettricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 16/03/2024				Data: 16/03/2024						

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por
FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 10:30:45 -03'00'

Tony Felix Andrade
Engenheiro C-1
CREA-BA: 052.013.377.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO N° 072-2023 LICITAÇÃO N° 002-2022 RDO: 17				EFETIVO PESSOAL						
				CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/03/2024				Data: 17/03/2024						

FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO:04180411563
 Assinado de forma digital por FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO:04180411563
 Dados: 2024.04.02 10:31:00 -03'00'

Tony Felix Antrada
 Engenheiro
 CREA-BA: 032001-1/77.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 18				MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()											
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
				Ajudante Geral 2							
				Calçeteiro 4							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/03/2024				Data: 18/03/2024							

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por
FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 10:31:15 -03'00'

Tony Felix de Toledo
Engenheiro
CREA: BA 052.043.777.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 902-2022 RDO: 19				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 1						
				Ajudante Geral 2						
				Calçeteiro 4						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista da caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/03/2024				Data: 19/03/2024						

FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por
 FYLLIPE DE OLIVEIRA
 RIBEIRO:04180411563
 Dados: 2024.04.02 10:31:31 -03'00'

Tony Felix Arredó
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000-877.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 20				MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Tráb. 3- Chuva al cond. Tráb.				Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				Tec. de Segurança							
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO ASSENTAMENTO DE PARALELO				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
				Ajudante Geral 2							
				Calceteiro 4							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eltricista							
				Elettricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/03/2024				Data: 20/03/2024							

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por
FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 10:31:50 -03'00'

Tony Felix Almeida
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.044.97.8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.


Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – Pavimentação de Ruas no Bairro Deloda, Conforme Obra nº 111/2024 e Contrato nº 072-2023.


Data	Município	Empresa
20/03/2024	Santaluz – Ba	Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia LTDA:21.763.372/0001-40

IMAGEM 01

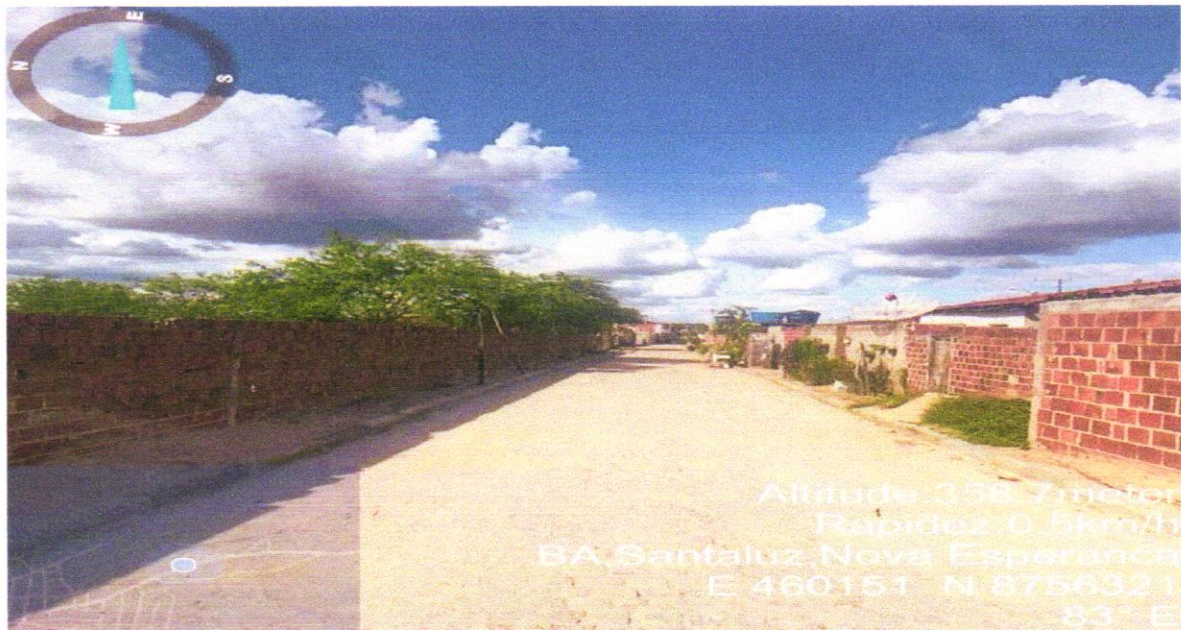

Execução de pavimentação Rua 01 Deloda

IMAGEM 02

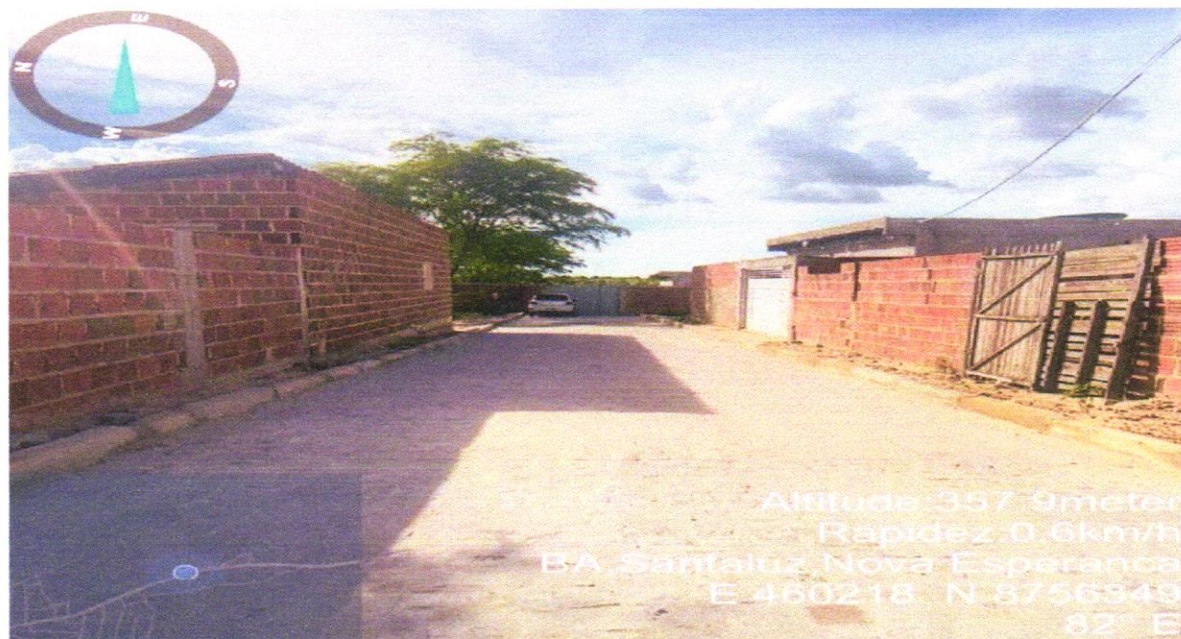

Execução de pavimentação Rua 02 Deloda

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por FYLLIPE
DE OLIVEIRA RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 16:05:34 -03'00'

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.


Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – Pavimentação de Ruas no Bairro Deloda, Conforme Obra nº 111/2024 e Contrato nº 072-2023.

Data	Município	Empresa
20/03/2024	Santaluz – Ba	Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia LTDA:21.763.372/0001-40

IMAGEM 03

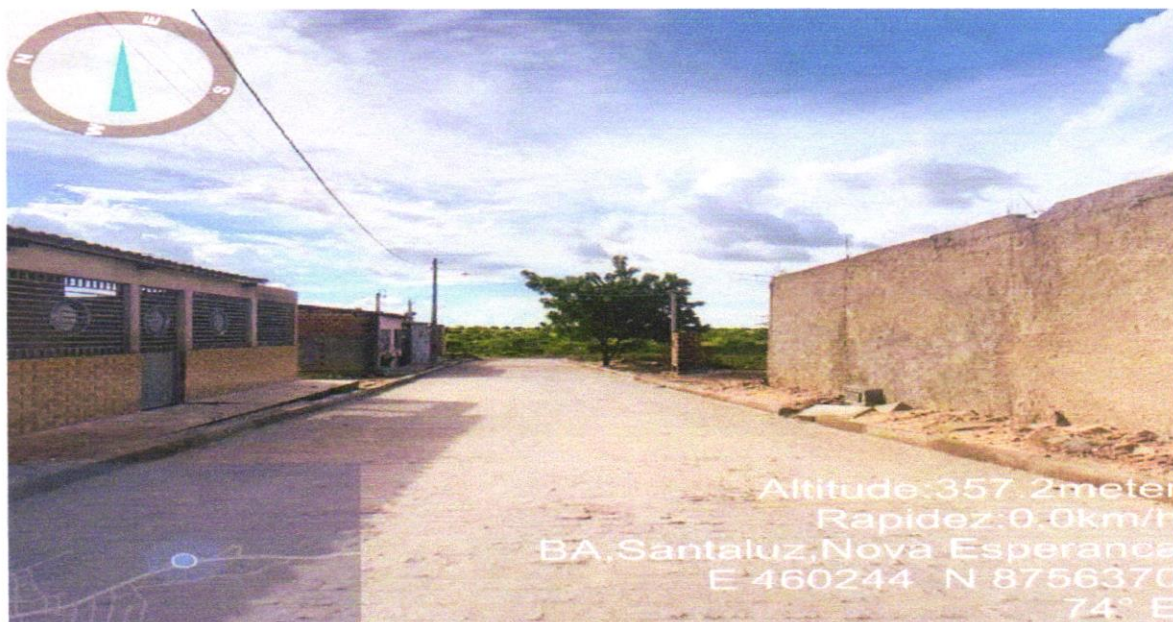

Execução de pavimentação Rua 03 Deloda

IMAGEM 04



Execução de pavimentação Rua 04 Deloda

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por FYLLIPE
DE OLIVEIRA RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 16:05:53 -03'00'

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ


Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – Pavimentação de Ruas no Bairro Deloda, Conforme Obra nº 111/2024 e Contrato nº 072-2023.

Data	Município	Empresa
20/03/2024	Santaluz – Ba	Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia LTDA:21.763.372/0001-40

IMAGEM 05

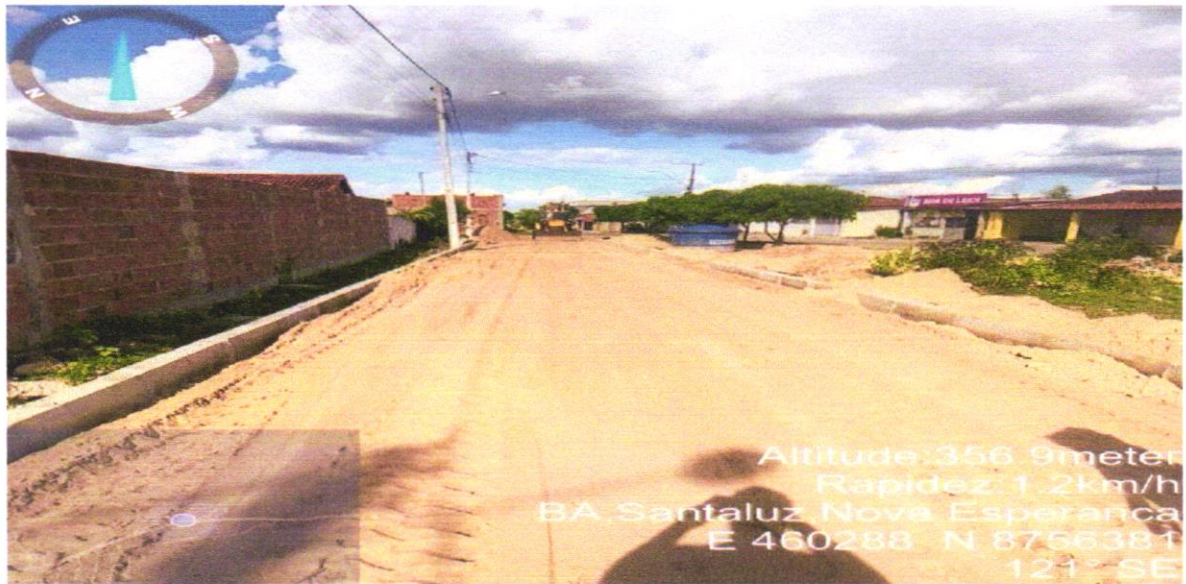

Execução de pavimentação Rua 01 Deloda

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:0418041156
3

Assinado de forma digital por
FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 16:06:17 -03'00'

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	21.763.372/0001-40
Nome	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	69607023 / Reinf CP 25087451504 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 8.809,51	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 504,28	R\$ 504,28
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.313,79	R\$ 504,28

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF	041.804.115-63
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	01/04/2024 17:21:53
Nº do recibo de entrega	0000050000218858031

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDEIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	CNPJ	21.763.372/0001-40
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000218858031
Data/Hora da Transmissão	01/04/2024 17:21:53	Identificação da Apuração de Débitos	69607023 / Reinf CP 25087451504 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	JOSE CLEMENTE	Número	292
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	TEOFILANDIA	UF	BA
CEP	48770000	Telefone	7599752587
Correio Eletrônico	RIBEIROEANJOS.ENGENHARIA@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	CPF	04180411563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO		
CPF	04180411563	CRC	-
UF	-	Telefone	7532610256
Correio Eletrônico	FOR_FYLLIPE@HOTMAIL.COM		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	8.479,51		
Deduções	Salário Família: 186,12 Salário Maternidade: 1.412,00 Retenção Lei 9711/98: 6.881,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	330,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 330,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	504,28		
Saldo a Pagar	504,28		

CNPJ 21.763.372/0001-40	Razão Social RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24092.2820416-0	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000218858031			Valor Total do Documento 504,28

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	504,28			504,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	504,28			504,28

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 01/04/2024 17:26:54

85830000005 0 04280385241 5 10071624092 7 28204160660 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 04280385241 5 10071624092 7 28204160660 1



CNPJ: 21.763.372/0001-40
Número: 07.16.24092.2820416-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 504,28

Pague com o PIX



CPF/CNPJ do Empregador
21.763.372

Nome/Razão Social do Empregador
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124040102074393-0

Tag
01/04/2024 17:26

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

7.900,70

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	50	7.900,70	0,00	0,00	0,00	7.900,70
Total Geral:		7.900,70	0,00	0,00	0,00	7.900,70

Data de geração da Guia: 01/04/2024 às 17:26:17 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



C6 BANK

Pix em andamento

01/04/2024
17:36

Pix realizado!

01/04/2024
17:36

C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco: 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: ****
Conta: ****

Identificador da transação

01HTDPICRGINZ69FBGJDMNV3RD

Identificador

E318724952024040120360qdVrbisKyl

Classe

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF - CNPJ

00.360.305/0001-04

Identificador da transação

25574ef3d3804a24aec089cc65b8b340

Valor

R\$ 7.900,70

Data e hora da transação

segunda-feira, 01 de abril de 2024, 17:36

Vencido

19/04/2024

Valor original

R\$ 7.900,70

Endereço

SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade

Brasilia

UF

DF

Cep

70092900

Conta de origem

RE

RIBEIRO E ANJOS ENGENHARIA

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 1
Conta: 21964801-8

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 9h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Quivera (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060

C6BANK

Informações do Pagamento

● Em processo de autenticação

R\$ 504,28

Beneficiário

DARF

Banco Beneficiário

DARF

Código de barras

**85830000005 0 04280385241 5 10071624092
7 28204160660 1**

Valor

R\$ 504,28

Vencimento

19/04/2024

Data do pagamento

01/04/2024

Autenticação

01HTDP32YHGE8S09GFMGTZ1P8E

Juros e multas

-

Desconto

-

Pago via

Banco C6 S.A.

Banco liquidante

**Recebido pelo C6 Bank e processado
por FitBank**

IMPORTANTE:

As contas pagas por você no C6 Bank podem ser liquidadas em bancos parceiros. Por isso, fique tranquilo caso apareça o nome de outra instituição financeira no comprovante de pagamento.

Conta debitada

RE


RIBEIRO E ANJOS ENGENHARIA

CNPJ: 21.763.372/0001-40

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 21964801-8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 50 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040102074393-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 01/04/2024 17:26:17 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024			ADAGILSON RODRIGUES DOS SANTOS	14	031.626.705-86	101	19/04/2024	Mensal	2.870,81	229,66	0,00	0,00	0,00	229,66
03/2024			ADILON SOUZA CAPISTRANO	57	113.385.025-14	101	19/04/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
03/2024			GENIVALDO DE JESUS	24	056.863.375-00	101	19/04/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
03/2024			LAZARO SOUZA CONCEICAO	23	932.865.465-34	101	19/04/2024	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
03/2024			LUCIANO DE JESUS SANTOS	33	059.651.115-92	101	19/04/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
03/2024			LYLIAN GABRIELE CARNEIRO OLIVEIRA	61	858.713.215-69	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024			NATALINO DE JESUS SANTOS	63	033.848.545-78	101	19/04/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
03/2024			THIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO	62	069.129.765-73	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024			UANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS	35	063.632.335-85	101	19/04/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
Total do Tomador								90.018.16329/73	17.113,81	1.369,07	0,00	0,00	0,00	1.369,07
Total do Estabelecimento								21.763.372/0001-40	98.761,33	7.900,70	0,00	0,00	0,00	7.900,70
Total da Guia									98.761,33	7.900,70	0,00	0,00	0,00	7.900,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 Nome Empregador: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040102074393-0 Emitida por: 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Qtd. Trabalhadores: 50 Origem: Gestão de Guias
 Data Emissão: 01/04/2024 17:26:17 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 21.763.372/0001-40		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		AILTON RODRIGUES DOS SANTOS	41	725.775.925-15	101	19/04/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
03/2024		ALEX SANTOS DOS REIS	40	065.546.995-89	101	19/04/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
03/2024		BRAZ LIMA MEIRELES	45	000.553.195-05	101	19/04/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
03/2024		CAIO SANTOS DE SOUZA	77	085.865.135-12	101	19/04/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
03/2024		CAMILO NOGUEIRA DA SILVA	81	547.694.775-20	101	19/04/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
03/2024		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	69	077.922.994-06	101	19/04/2024	Mensal	1.521,82	121,74	0,00	0,00	0,00	121,74	
03/2024		CARLOS ANTONIO DOS SANTOS	80	402.950.015-34	101	19/04/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
03/2024		DARIO TADEU FELIX	50	800.987.206-78	101	19/04/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
03/2024		DOUGLAS VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO	71	117.438.974-56	101	19/04/2024	Mensal	1.394,88	111,59	0,00	0,00	0,00	111,59	
03/2024		EDIVALDO OLIVEIRA	73	044.007.964-00	101	19/04/2024	Mensal	2.285,36	182,82	0,00	0,00	0,00	182,82	
03/2024		EDIVAM SANTOS DOS SANTOS	49	927.000.125-34	101	19/04/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
03/2024		EDUARDO DA CONCEICAO SANTANA	79	816.590.245-87	101	19/04/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
03/2024		ESTEVAM DA SILVA SANTOS	27	295.766.875-00	101	19/04/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
03/2024		FAGNER DOS SANTOS SOUZA	68	131.600.774-03	101	19/04/2024	Mensal	1.470,15	117,61	0,00	0,00	0,00	117,61	
03/2024		FLAVIO MEIRELES RODRIGUES	64	520.157.425-49	101	19/04/2024	Mensal	3.582,03	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56	
03/2024		HELOISA LAYANE RODRIGUES MARIANO	7	100.080.914-55	101	19/04/2024	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
03/2024		ISABELA DE JESUS MARQUES SANTOS	21	087.131.915-27	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		JANDERSON SANTOS SANTANA OLIVEIRA	65	110.263.925-78	101	19/04/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
03/2024		JANDSON RIBEIRO DO SANTOS	76	102.144.755-22	101	19/04/2024	Mensal	1.346,78	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74	
03/2024		JOSCIVAN ALMEIDA DOS SANTOS	82	092.598.225-30	101	19/04/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
03/2024		JOSE ALFREDO MACENA	83	454.656.145-87	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		JOSE LUIZ CESARIO	72	119.398.214-60	101	19/04/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
03/2024		JOSE LUIZ DIONIZIO	52	103.783.484-42	101	19/04/2024	Mensal	3.582,03	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56	
03/2024		JOSE ORLANDO DOS SANTOS	67	078.832.794-16	101	19/04/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
03/2024		JOSE RAIMUNDO SANTOS LOPES	75	028.252.775-33	101	19/04/2024	Mensal	1.346,78	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74	
03/2024		JOSE ROBERTO DOS SANTOS FREITAS	48	008.449.675-48	101	19/04/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
03/2024		JOSE ZITO DE OLIVEIRA	51	496.030.941-53	101	19/04/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
03/2024		JOSUE DE LIMA	44	080.295.646-78	101	19/04/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
03/2024		JULIO CEZAR SILVA SANTOS	74	234.859.058-10	101	19/04/2024	Mensal	1.346,78	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74	
03/2024		KEYNE PRISCILLA DA SILVA	22	053.109.045-06	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		LEANDRO GONCALVES NUNES	56	043.787.445-11	101	19/04/2024	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	
03/2024		LUIZ CARLOS ALVES TEIXEIRA	78	531.243.405-15	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		LUIZ MAGNO DE JESUS SANTOS	34	905.729.125-87	101	19/04/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81	
03/2024		MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	36	511.638.705-44	101	19/04/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
03/2024		MAX DOS SANTOS NUNES	32	024.706.885-31	101	19/04/2024	Mensal	2.870,81	229,66	0,00	0,00	0,00	229,66	
03/2024		RAIMUNDO DE OLIVEIRA	66	026.891.414-18	101	19/04/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
03/2024		RONIVON SILVA SANTOS	46	979.513.315-20	101	19/04/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
03/2024		TIAGO SILVA DOS SANTOS	38	052.043.955-47	101	19/04/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
03/2024		VANDERSON DE JESUS SILVA	29	493.620.538-96	101	19/04/2024	Mensal	3.360,90	268,87	0,00	0,00	0,00	268,87	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 50 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040102074393-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 01/04/2024 17:26:17 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência		Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
Estabelecimento:				21.763.372/0001-40				Tomador:				Sem Tomador				
03/2024				VICTOR EMANOEL RODRIGUES MARIANO	31	163.883.924-74	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024				WENDSON LUCAS SOUZA DOS SANTOS	70	038.895.343-84	101	19/04/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
									Total do Tomador	Sem Tomador	81.647,52	6.531,63	0,00	0,00	0,00	6.531,63
									Total do Estabelecimento	21.763.372/0001-40	98.761,33	7.900,70	0,00	0,00	0,00	7.900,70
									Total da Guia		98.761,33	7.900,70	0,00	0,00	0,00	7.900,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 50 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040102074393-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 01/04/2024 17:26:17 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 21.763.372/0001-40

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	50	98.761,33	7.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,70
		Total da Guia	98.761,33	7.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,70

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de Justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exarado em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cesionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.268/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 805 - Aleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 50 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040102074393-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 01/04/2024 17:26:17 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	21.763.372/0001-40	50	98.761,33	7.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,70
		Total da Guia	98.761,33	7.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,70



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 50 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040102074393-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 01/04/2024 17:26:17 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 21.763.372/0001-40

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	50	98.761,33	7.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,70
	Total da Guia		98.761,33	7.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 50 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040102074393-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 01/04/2024 17:26:17 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 90.018.16329/73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	9	17.113,81	1.369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,07
Total do Tomador	90.018.16329/73	17.113,81	1.369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,07

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	41	81.647,52	6.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,63
Total do Tomador	Sem Tomador	81.647,52	6.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,63
Total da Guia		98.761,33	7.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,70
