



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 042-2023

EMPENHO: 223 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1842 Data do Sub-Empenho: 16/07/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 5535 - ARK ENGENHARIA EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: RUA 02 DE JULHO, 133	Complemento: SALA 04
Bairro: CENTRO	Cidade: SERRINHA
CNPJ: 13.749.776/0001-50	Insc. Estadual:
Conta Corrente: 240487-7	Agência: 3017
	Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB
	RG: Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 15/02/2024
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 002-2023CONC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 011-2024	5.125.897,00	200.000,00	4.925.897,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO Nº 011-2024, LICITAÇÃO 002-2023CONC. OBRA Nº 108/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 04. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/06/2024 À 30/06/2024. NFS-e 216.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	691.393,59	689.966,31	1.427,28

Data do Empenho: 15/02/2024 Data do Liquidação: 16/07/2024



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	14.489,29
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	8.279,60
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	20.698,99
## Seiscentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos ##		Valor Retido
		43.467,88
		Valor Líquido
		646.498,43

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	15/07/2024	216	U			689.966,31
Quantidade: 1	Total:					689.966,31

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	689.966,31

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/07/2024.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/07/2024, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---

Documentação Conservida
17/07/2024
Jaqueline Trabuço da Silva
Controladora Interna

Portaria SIAFIC - 281/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 042-2023

EMPENHO: 223 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 1842 Data do Sub-Empenho: 16/07/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5535 - ARK ENGENHARIA EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: RUA 02 DE JULHO, 133 Complemento: SALA 04
 Bairro: CENTRO Cidade: SERRINHA Estado: BA
 CNPJ: 13.749.776/0001-50 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 240487-7 Agência: 3017 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 15/02/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia: N° Lic.: 002-2023CONC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 011-2024	5.125.897,00	200.000,00	4.925.897,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO N° 011-2024, LICITAÇÃO 002-2023CONC.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
691.393,59	689.966,31	1.427,28

N° Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	689.966,31	689.966,31

Seiscentos e oitenta e nove mil e novecentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos

689.966,31

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 16/07/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 16/07/2024

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

3575085

SIATC -



Santaluz, 17/07/2024

A empresa:


ARK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ sob nº13.749.776/0001-50

Endereço:

RUA 02 DE JULHO, 133 – CENTRO CEP: 48700-000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADA NO MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA.
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002-2023
Contrato: 011/2024 Processo administrativo: 042/2023 Nº da obra: 108/2024
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 216 VALOR DA NOTA: R\$ 689.966,31 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/06/2024 A 30/06/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP .
Recurso – FINISA

Atenciosamente,


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.277.8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
216



Data e Hora da Emissão	15/07/2024 10:44:48	Competência	15/7/2024	Código de Verificação	TNYCG4OUU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTALUZ - BA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ARK ENGENHARIA EIRELI				
Nome Fantasia	ARK ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	13.749.776/0001-50	Inscrição Municipal	5647	Município	SERRINHA - BA
Endereço e CEP	R 02 DE JULHO ,133 - CENTRO CEP: 48700-000				
Complemento	:SALA 4	Telefone	(75)9306-3856	e-mail	arkengenhariaeireli@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				
CNPJ/CPF	13.807.870/0001-19	Inscrição Municipal		Município	SANTALUZ - BA
Endereço e CEP	Av. Getúlio Vargas ,S/N - Santaluz CEP: 48880-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

MEDIÇÃO Nº 04 - Período da medição: 01/06/2024 a 30/06/2024 CONTRATO Nº 011/2024 | Nº DA OBRA: 108/2024. OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.

MÃO DE OBRA 50%: R\$ 344.983,15
MATERIAL 50% : R\$ 344.983,15

INSS 3,5% = R\$ 12.074,41
ISS 2,5% = R\$ 8.624,57

DADOS BANCARIOS:
BANCO SICCOOB - 756
AGENCIA: 3017
CONTA CORRENTE 240487-7

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
 EM 16/07/2024 Tony Felix Andrade
 Assinatura

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.000.000/7.8

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 4213800 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	791374	Código ART	791374
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	689.966,31	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	689.966,31
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei	344.983,15
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	344.983,16
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,50
(-) ISSQN Retido	8.624,58	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	681.341,73	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	8.624,58
		2-Não			

Avisos
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SERRINHA.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 397446	CONTRIBUINTE 34223 - ARK ENGENHARIA LTDA			INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: REGINALDO RIBEIRO				NÚMERO: 808
COMPLEMENTO: *****	BAIRRO: GINASIO	MUNICÍPIO: SERRINHA	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 13.749.776/0001-50		R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 413.979,78	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 20.698,99	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 20.698,99
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 16/07/2024	MÊS REFERÊNCIA: Julho	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 16/07/2024 03:29:11	DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 216 - DATA DE EMISSÃO: 15/07/2024.			(=) VALOR DEVIDO - R\$	20.698,99
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	20.698,99



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



81740000206 . 6 98993906202 . 6 40812010500 . 7 00039744612 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81740000206 . 6 98993906202 . 6 40812010500 . 7 00039744612 . 1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Julho	Nº DAM: 397446	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 16/07/2024 03:29:11	DATA VENCIMENTO: 12/08/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	20.698,99
ARK ENGENHARIA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	20.698,99





I.R.R.F

Nº DAM: 397445	CONTRIBUINTE 34223 - ARK ENGENHARIA LTDA	INSCRIÇÃO: 34223
TIPO / NOME LOGRADOURO: RUA REGINALDO RIBEIRO		NÚMERO 808
COMPLEMENTO *****	BAIRRO: GINASIO	MUNICÍPIO: SERRINHA UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO C.N.P.J.: 13.749.776/0001-50
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 8.279,60	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000
		Valor R\$ 8.279,60
		Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$ 8.279,60
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 16/07/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024
		DATA EMISSÃO: 16/07/2024 03:25:59
		DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2024
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 8.279,60
Valor do Tributo: 8.279,60	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 8.279,60	
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 8.279,60	Vlr. Devido com Desconto: 8.279,60	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 216 - Data de emissão: 15/07/2024.		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 8.279,60



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8175000082 . 0 79603906202 . 4 40731010100 . 8 00039744507 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000082 . 0 79603906202 . 4 40731010100 . 8 00039744507 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 397445	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 16/07/2024 03:25:59	DATA VENCIMENTO: 31/07/2024
INSCRIÇÃO: 34223			(=) VALOR DEVIDO - R\$	8.279,60
ARK ENGENHARIA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	8.279,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO - 4ª MEDIÇÃO

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

01/06/2024 a 30/06/2024

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-
BA

EMPRESA:

ARK ENGENHARIA EIRELI

CNPJ:

13.307.870/0001-19

MEDIÇÃO 04:

R\$ 689.966,31

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002-2023
Nº DO CONTRATO: 011/2024
Nº DA OBRA: 108/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 042/2023

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 04		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA										
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.2.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 429,80	R\$ 2.578,80		R\$ 0,00	6,00	R\$ 2.578,80	R\$ 0,00	0%
1.2.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20,00	R\$ 298,63	R\$ 5.972,60		R\$ 0,00	20,00	R\$ 5.972,60	R\$ 0,00	0%
1.2.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	292,50	R\$ 120,58	R\$ 35.269,65		R\$ 0,00	292,50	R\$ 35.269,65	R\$ 0,00	0%
1.2.4	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	R\$ 3.189,59	R\$ 3.189,59		R\$ 0,00	1,00	R\$ 3.189,59	R\$ 0,00	0%
1.2.5	73960/001	SINAPI	INSTAL. LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA.M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00								
						R\$ 2.513,66	R\$ 2.513,66		R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.513,66	R\$ 0,00	0%
1.3			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
1.3.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00								
						R\$ 129,18	R\$ 10.334,40		R\$ 0,00	60,00	R\$ 7.750,80	R\$ 2.583,60	25%
1.4			MOVIMENTO DE TERRA										
1.4.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2018	m³	729,00								
						R\$ 110,55	R\$ 80.590,95	138,79	R\$ 15.343,23	729,00	R\$ 80.590,95	R\$ 0,00	0%
1.4.2	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1.565,88								
						R\$ 1,32	R\$ 2.066,96	277,20	R\$ 365,90	1565,88	R\$ 2.066,96	R\$ 0,00	0%
1.5			QUIOSQUE										
1.5.1			INFRAESTRUTURA										
1.5.1.1	98527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	1,10								
						R\$ 145,18	R\$ 159,69		R\$ 0,00	1,10	R\$ 159,70	R\$ 0,00	0%
1.5.1.2	98523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	9,79								
						R\$ 110,91	R\$ 1.085,80		R\$ 0,00	9,79	R\$ 1.085,81	R\$ 0,00	0%
1.5.1.3	98617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	10,03								
						R\$ 21,99	R\$ 220,55		R\$ 0,00	10,03	R\$ 220,56	R\$ 0,00	0%
1.5.1.4	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4,14								
						R\$ 2.863,29	R\$ 11.854,02		R\$ 0,00	4,14	R\$ 11.854,02	R\$ 0,00	0%
1.5.1.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	38,86								
						R\$ 49,41	R\$ 1.920,07		R\$ 0,00	38,86	R\$ 1.920,07	R\$ 0,00	0%
1.5.2			SUPERESTRUTURA										
1.5.2.1	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,53								
						R\$ 2.863,29	R\$ 7.244,12		R\$ 0,00	2,53	R\$ 7.244,12	R\$ 0,00	0%
1.6			VERGAS E CONTRAVERGAS										
1.6.1	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	3,90								
						R\$ 54,49	R\$ 212,51		R\$ 0,00	3,90	R\$ 212,51	R\$ 0,00	0%
1.6.2	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	6,30								
						R\$ 69,27	R\$ 436,40		R\$ 0,00	6,30	R\$ 436,40	R\$ 0,00	0%
1.6.3	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	3,92								
						R\$ 40,68	R\$ 159,46		R\$ 0,00	3,92	R\$ 159,47	-R\$ 0,01	0%
	93184	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2018	M	3,90								
						R\$ 53,38	R\$ 208,18		R\$ 0,00	3,90	R\$ 208,18	R\$ 0,00	0%
			PISOS										



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

Wendel Soares Cruz
05.749.775/0001
ARK ENGENHARIA LTDA
RUA HILARIO RIBEIRO, 806 - Galo
13.307.870/0001-19

1.7.1	87622 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADEQUADO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 2CM. AF_07/2021	53,39	R\$ 38,17	R\$ 2.037,89	53,39	R\$ 2.037,90	53,39	R\$ 2.037,90	R\$ 0,00	0%
1.7.2	87247 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	14,91	R\$ 57,77	R\$ 861,35	14,91	R\$ 861,35	14,91	R\$ 861,35	R\$ 0,00	0%
1.7.3	98671 SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	38,48	R\$ 331,76	R\$ 12.766,12	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.766,12	100%
1.8	103356 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1	103356 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	80,30	R\$ 59,29	R\$ 4.780,98	80,30	R\$ 0,00	80,30	R\$ 4.780,99	R\$ 0,00	0%
1.8.2	4458 ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	0,70	R\$ 598,04	R\$ 418,62	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 418,62	100%
1.9		REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	160,61	R\$ 5,14	R\$ 825,53	16,05	R\$ 82,50	160,61	R\$ 825,54	R\$ 0,00	0%
1.9.2	87543 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESURA DE 5MM. SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	74,18	R\$ 27,70	R\$ 4.448,89	80,20	R\$ 2.221,53	160,61	R\$ 4.448,89	R\$ 0,00	0%
1.9.3	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	74,18	R\$ 69,29	R\$ 5.139,93	74,18	R\$ 5.139,93	74,18	R\$ 5.139,93	R\$ 0,00	0%
1.10		PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	142,19	R\$ 3,18	R\$ 452,16	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 452,16	100%
1.10.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	142,19	R\$ 15,81	R\$ 2.248,02	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.248,02	100%
1.10.3	96126 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAINOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VAZOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	142,19	R\$ 21,21	R\$ 3.015,84	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.015,84	100%
1.10.4	3733 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROCC, ref DeGuard FS ou similar-R1	38,95	R\$ 20,76	R\$ 808,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 808,60	100%
1.11		CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.1	89422 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	R\$ 4,64	R\$ 18,56	4,00	R\$ 18,56	4,00	R\$ 18,56	R\$ 0,00	0%
1.11.2	89404 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	13,00	R\$ 8,01	R\$ 104,13	13,00	R\$ 104,13	13,00	R\$ 104,13	R\$ 0,00	0%
1.11.3	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6,00	R\$ 9,54	R\$ 57,24	6,00	R\$ 57,24	6,00	R\$ 57,24	R\$ 0,00	0%
1.11.4	89442 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	R\$ 15,09	R\$ 30,18	2,00	R\$ 30,18	2,00	R\$ 30,18	R\$ 0,00	0%
1.11.5	89438 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	R\$ 11,13	R\$ 44,52	4,00	R\$ 44,52	4,00	R\$ 44,52	R\$ 0,00	0%
1.12		CAIXAS E RALOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.1	89706 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	4,00	R\$ 19,97	R\$ 79,88	4,00	R\$ 79,88	4,00	R\$ 79,88	R\$ 0,00	0%
1.12.2	7862 ORSE	Caixa sifonada redonda, corpo gradido, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm. G-150x170x75mm, com grelha, Pvc-branco, 1"lige ou similar	4,00	R\$ 54,91	R\$ 219,64	4,00	R\$ 219,64	4,00	R\$ 219,64	R\$ 0,00	0%
1.12.3	1447 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	1,00	R\$ 778,59	R\$ 778,59	1,00	R\$ 778,59	1,00	R\$ 778,59	R\$ 0,00	0%
1.12.4	1488 ORSE	Tomreira de bola p/ caixa d'água em pvc d = 12"	1,00	R\$ 43,29	R\$ 43,29	1,00	R\$ 43,29	1,00	R\$ 43,29	R\$ 0,00	0%
1.12.5	89404 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	R\$ 470,63	R\$ 1.882,52	2,00	R\$ 941,26	2,00	R\$ 941,26	R\$ 941,26	50%
1.12.6	89404 SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	R\$ 148,77	R\$ 297,54	2,00	R\$ 297,54	2,00	R\$ 297,54	R\$ 0,00	0%
1.12.7	89404 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	R\$ 53,72	R\$ 107,44	2,00	R\$ 107,44	2,00	R\$ 107,44	R\$ 0,00	0%

Tony F. Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.877.8

Wendell Simões Cav
19.07.2001
ABRIL SINGELARIA LTDA
RUA: LUIZ JOSÉ RIBEIRO, 885 - CRUZ
MACEIÓ - AL - CEP: 52060-000



1.12.8	10345	ORSE	Medições de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	un	3,00	R\$ 682,54	R\$ 2.047,62		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.047,62	100%	
1.12.9	2105	ORSE	Placa de cozinha com bancada em aço inox, dim: 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada	un	2,00	R\$ 989,00	R\$ 1.978,00	2,00	R\$ 1.978,00	2,00	R\$ 1.978,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.13 TUBOS RIGIDOS														
1.13.1	C2615	SEINFRA	TUBO PVC SOLID. MARROM D= 20mm (1/2")	M	39,00	R\$ 7,18	R\$ 280,02	39,00	R\$ 280,02	39,00	R\$ 280,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.13.2	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	25,00	R\$ 9,72	R\$ 243,00	25,00	R\$ 243,00	25,00	R\$ 243,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.13.3	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=100MM (4")	M	30,00	R\$ 42,80	R\$ 1.284,00	30,00	R\$ 1.284,00	30,00	R\$ 1.284,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.13.4	C2598	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=75mm (3")	M	16,00	R\$ 37,82	R\$ 605,12	16,00	R\$ 605,12	16,00	R\$ 605,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.13.5	C2595	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=40mm (1 1/2")	M	20,00	R\$ 17,44	R\$ 348,80	20,00	R\$ 348,80	20,00	R\$ 348,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.13.6	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=50mm (2")	M	16,50	R\$ 24,15	R\$ 398,47	16,50	R\$ 398,47	16,50	R\$ 398,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.14 REGISTRO DE VÁLVULAS														
1.14.1	94783	SNAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 21,75	R\$ 21,75	1,00	R\$ 21,75	1,00	R\$ 21,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.14.2	94489	SNAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 38,94	R\$ 116,82	3,00	R\$ 116,82	3,00	R\$ 116,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.14.3	94785	SNAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 26,62	R\$ 26,62	1,00	R\$ 26,62	1,00	R\$ 26,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.15 ELEMENTOS DE INSPEÇÃO														
1.15.1	4429	ORSE	Caixa de inspeção, 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4,00	R\$ 188,17	R\$ 752,68	4,00	R\$ 752,68	4,00	R\$ 752,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.15.2	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	R\$ 188,17	R\$ 376,34	2,00	R\$ 376,34	2,00	R\$ 376,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.16 ESGOTO														
1.16.1	89726	SNAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 11,26	R\$ 11,26	1,00	R\$ 11,26	1,00	R\$ 11,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.16.2	89731	SNAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 16,11	R\$ 32,22	2,00	R\$ 32,22	2,00	R\$ 32,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.16.3	89724	SNAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 11,02	R\$ 132,24	12,00	R\$ 132,24	12,00	R\$ 132,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.16.4	89737	SNAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 24,14	R\$ 24,14	1,00	R\$ 24,14	1,00	R\$ 24,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.16.5	89744	SNAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 29,30	R\$ 29,30	1,00	R\$ 29,30	1,00	R\$ 29,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.16.6	89782	SNAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 15,84	R\$ 31,68	2,00	R\$ 31,68	2,00	R\$ 31,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.16.7	89784	SNAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 25,85	R\$ 25,85	1,00	R\$ 25,85	1,00	R\$ 25,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.16.8	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1,00	R\$ 783,21	R\$ 783,21	1,00	R\$ 783,21	1,00	R\$ 783,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.16.9	98058	SNAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTL: 1,140 M³ (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	un	1,00	R\$ 1.816,15	R\$ 1.816,15	1,00	R\$ 1.816,15	1,00	R\$ 1.816,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.16.10	1735	ORSE	Sumidouro paredes com bloco cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 1,00 m	un	1,00	R\$ 2.053,32	R\$ 2.053,32	1,00	R\$ 2.053,32	1,00	R\$ 2.053,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
1.17.1	91924	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MFP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	R\$ 2,96	R\$ 88,80	30,00	R\$ 88,80	30,00	R\$ 88,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.17.2	91926	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MFP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	273,00	R\$ 4,22	R\$ 1.152,06	273,00	R\$ 1.152,06	273,00	R\$ 1.152,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.17.3	91863	SNAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	R\$ 10,80	R\$ 324,00	30,00	R\$ 324,00	30,00	R\$ 324,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.17.4	91865	SNAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	R\$ 13,06	R\$ 653,00	50,00	R\$ 653,00	50,00	R\$ 653,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.17.5	10793	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, eletroduto - Rev 01	un	11,00	R\$ 17,08	R\$ 187,88	11,00	R\$ 187,88	11,00	R\$ 187,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%

Wendell Simões Gof
 719.775.0001
 ANEXO 1 - 11/2015
 ANEXO 2 - 11/2015
 ANEXO 3 - 11/2015

Tony F. de Andrade
 Engenharia Civil
 CREA-BA. 052.063.877.8




1.17.6	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 13,77	R\$ 68,85	5,00	R\$ 68,85	5,00	R\$ 68,85	0%
1.17.7	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO. CIRCULAR, EM POLIETILENO. DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 46,23	R\$ 92,46	2,00	R\$ 92,46	2,00	R\$ 92,46	0%
1.17.8	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELTROTUDO. PVC. ROSCÁVEL. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 16,40	R\$ 82,00	5,00	R\$ 82,00	5,00	R\$ 82,00	0%
1.17.9	91875	SINAPI	LUVA PARA ELTROTUDO. PVC. ROSCÁVEL. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 7,29	R\$ 72,90	10,00	R\$ 72,90	10,00	R\$ 72,90	0%
1.17.10	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v.	un	4,00	R\$ 70,28	R\$ 281,12	4,00	R\$ 281,12	4,00	R\$ 281,12	0%
1.17.11	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 61,74	R\$ 246,96	4,00	R\$ 246,96	4,00	R\$ 246,96	0%
1.17.12	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 54,24	R\$ 216,96	4,00	R\$ 216,96	4,00	R\$ 216,96	0%
1.17.13	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 18,40	R\$ 92,00	5,00	R\$ 92,00	5,00	R\$ 92,00	0%
1.17.14	12235	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	R\$ 445,01	R\$ 445,01	1,00	R\$ 445,01	1,00	R\$ 445,01	0%
1.17.15	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 35,02	R\$ 140,08	4,00	R\$ 140,08	4,00	R\$ 140,08	0%
1.17.16	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 36,69	R\$ 146,76	4,00	R\$ 146,76	4,00	R\$ 146,76	0%
1.17.17	12095	ORSE	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt ambr/neu	un	6,00	R\$ 26,85	R\$ 161,10	6,00	R\$ 161,10	6,00	R\$ 161,10	0%
1.17.18	96985	SINAPI	MASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 105,06	R\$ 105,06	1,00	R\$ 105,06	1,00	R\$ 105,06	0%
1.18			ESQUADRIAS									
1.18.1	90795	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 698,73	R\$ 2.794,92	2,00	R\$ 1.397,46	2,00	R\$ 1.397,46	50%
1.18.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,53	R\$ 264,23	R\$ 2.782,34	10,53	R\$ 2.782,34	10,53	R\$ 2.782,34	0%
1.18.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	7,92	R\$ 110,28	R\$ 873,41	7,92	R\$ 873,42	7,92	R\$ 873,42	0%
1.19			FERRAGENS E ACESSÓRIOS									
1.19.1	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 170,19	R\$ 680,76	4,00	R\$ 680,76	4,00	R\$ 680,76	0%
1.20			COBERTURA									
1.20.1	12508	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC/75 e terças em UDC 127, 2 Águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto for. Telhas - Executada	m²	53,39	R\$ 223,93	R\$ 11.955,62	53,39	R\$ 11.955,62	53,39	R\$ 11.955,62	0%
1.20.2	9661	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapas de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	53,39	R\$ 82,91	R\$ 4.426,56	53,39	R\$ 4.426,56	53,39	R\$ 4.426,56	0%
1.20.3	8269	ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desarmamento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	9,50	R\$ 203,43	R\$ 1.932,58	9,50	R\$ 1.932,59	9,50	R\$ 1.932,59	0%
1.21			LAJE									
1.21.1	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interieiro 36cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capateamento 4cm.	m²	7,87	R\$ 183,81	R\$ 1.446,58	7,87	R\$ 1.446,58	7,87	R\$ 1.446,58	0%
1.21.2	9076	ORSE	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	m²	0,36	R\$ 154,81	R\$ 55,73	0,36	R\$ 55,73	0,36	R\$ 55,73	0%
1.21.3	8957	ORSE	Dobraçã de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	2,00	R\$ 39,65	R\$ 79,30	2,00	R\$ 79,30	2,00	R\$ 79,30	0%
1.21.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	7,87	R\$ 49,41	R\$ 388,85	7,87	R\$ 388,86	7,87	R\$ 388,86	0%
1.22			PERGOLAO									
1.22.1			FUNDAÇÃO									
1.22.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	3,00	R\$ 110,91	R\$ 332,73	3,00	R\$ 332,73	3,00	R\$ 332,73	0%
1.22.1.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	6,00	R\$ 21,99	R\$ 131,94	6,00	R\$ 131,94	6,00	R\$ 131,94	0%
1.22.1.3	96656	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	2,24	R\$ 2.863,29	R\$ 6.413,76	2,24	R\$ 6.413,77	2,24	R\$ 6.413,77	0%
1.22.2			ESTRUTURA									
1.22.2.1			Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	m	69,60	R\$ 278,37	R\$ 19.374,55	69,60	R\$ 19.374,55	69,60	R\$ 19.374,55	0%



Tony Fofka Andreado
Engenheiro Civil
CREA-BA-052.055/877.8

Wendell Simões Coê
749.7530010
AV. SINGELARIAS LTDA
RUA: SINGELARIAS, 806 - C. O. B.


1.22.2.2	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	154,00	R\$ 45,88	R\$ 7.065,52	154,00	R\$ 7.065,52	154,00	R\$ 7.065,52	R\$ 0,00	0%	
1.22.2.3	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	44,00	R\$ 75,34	R\$ 3.314,96	44,00	R\$ 3.314,96	44,00	R\$ 3.314,96	R\$ 0,00	0%	
1.22.2.4	2328	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m²	168,30	R\$ 18,31	R\$ 3.081,57	168,30	R\$ 3.081,57	168,30	R\$ 3.081,57	R\$ 0,00	0%	
1.22.2.5	7673	ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	4,00	R\$ 35,09	R\$ 140,36	4,00	R\$ 140,36	4,00	R\$ 140,36	R\$ 0,00	0%	
1.22.2.6	4028	ORSE	Paralúsio cabeça quadrada 16 x 150mm - Fornecimento	Un	66,00	R\$ 9,21	R\$ 607,86	66,00	R\$ 607,86	66,00	R\$ 607,86	R\$ 0,00	0%	
1.23			BANCOS											
1.23.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	5,09	R\$ 145,18	R\$ 738,96	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 738,96	R\$ 0,00	100%	
1.23.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	16,97	R\$ 21,99	R\$ 373,17	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 373,17	R\$ 0,00	100%	
1.23.3	7796	ORSE	Mediamento em massarandubimadeira de lei, serrada 2,5cm x 10cm	m	332,60	R\$ 24,29	R\$ 8.078,85	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 8.078,85	R\$ 0,00	100%	
1.23.4	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	57,19									
1.23.5	87873	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	71,58	R\$ 59,29	R\$ 3.390,79	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.390,79	R\$ 0,00	100%	
1.23.6	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	71,58	R\$ 7,29	R\$ 521,81	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 521,81	R\$ 0,00	100%	
1.23.7	96126	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VAOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	71,58	R\$ 29,14	R\$ 2.085,84	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.085,84	R\$ 0,00	100%	
1.23.8	89411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESEÇA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_08/2014	m²	71,58	R\$ 3,41	R\$ 244,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 244,08	R\$ 0,00	100%	
1.23.9	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	71,58	R\$ 15,81	R\$ 1.131,67	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.131,67	R\$ 0,00	100%	
1.23.10	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)	m²	45,56	R\$ 25,13	R\$ 1.144,92	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.144,92	R\$ 0,00	100%	
1.24			BANCOS PRETORIC											
1.24.1	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRETA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCX = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,25									
1.24.2	3378	ORSE	Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento	m²	2,50	R\$ 2.863,29	R\$ 7.158,82	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 7.158,82	R\$ 0,00	100%	
1.24.3	3855	ORSE	Mediamento em massarandubimadeira de lei, peça serrada e aparelhada 5 x 8cm, w abertura de encaixes	m	56,00	R\$ 140,28	R\$ 350,70	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 350,70	R\$ 0,00	100%	
1.24.4	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)	m²	56,00	R\$ 58,84	R\$ 3.295,04	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.295,04	R\$ 0,00	100%	
1.25			PLAYGROUND											
1.25.1	11098	ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúcio Brinquedos inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	R\$ 12.274,48	R\$ 12.274,48	1,00	R\$ 12.274,48	1,00	R\$ 12.274,48	R\$ 0,00	0%	
1.25.2	8767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	97,13	R\$ 70,05	R\$ 6.803,95	97,13	R\$ 6.803,95	97,13	R\$ 6.803,95	R\$ 0,00	0%	
1.25.2	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Oria Alaláia Nova	un	1,00	R\$ 1.549,04	R\$ 1.549,04	1,00	R\$ 1.549,04	1,00	R\$ 1.549,04	R\$ 0,00	0%	
1.25.3	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borraça e mão de obra especializada	m²	97,13	R\$ 62,12	R\$ 6.033,71	97,13	R\$ 6.033,71	97,13	R\$ 6.033,71	R\$ 0,00	0%	
1.25.4	10012	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 25cm, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gendau ou similar	m²	97,13	R\$ 33,17	R\$ 3.221,80	97,13	R\$ 3.221,80	97,13	R\$ 3.221,80	R\$ 0,00	0%	
1.25.5	9859	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=5 a 7cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipecc)	m	124,74	R\$ 15,38	R\$ 1.918,50	124,74	R\$ 1.918,50	124,74	R\$ 1.918,50	R\$ 0,00	0%	
1.25.6	9803	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	m²	44,08	R\$ 166,60	R\$ 7.343,72	44,08	R\$ 7.343,72	44,08	R\$ 7.343,72	R\$ 0,00	0%	
1.25.7	2445	ORSE	TELA EM AÇO GALVANIZADO PARA ALAMBRA DO	m²	-	R\$ 119,30	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	
1.25.8	1465	ORSE	Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anelis e parafusos	un	2,00	R\$ 39,65	R\$ 79,30	2,00	R\$ 79,30	2,00	R\$ 79,30	R\$ 0,00	0%	
1.25.9	1465	ORSE	Ferrocho ou targa de fio redondo (aliança ou similar) ref 81088 63mm (2 1/2")	un	1,00	R\$ 53,44	R\$ 53,44	1,00	R\$ 53,44	1,00	R\$ 53,44	R\$ 0,00	0%	
1.26			ANTEROS											
1.26.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,15	R\$ 145,18	R\$ 312,13	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 312,13	R\$ 0,00	100%	



Tony Feff Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 062.069.677.8

Vanderson Silva
13/05/2023
RUE SINGERHANA 1313
Bairro: São João
Cidade: São Paulo, SP


1.26.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_06/2017	m²	7,20	R\$ 21,99	R\$ 158,32	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,32	100%
1.26.3	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	19,20	R\$ 59,29	R\$ 1.138,36	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.138,36	100%
1.26.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	38,40	R\$ 5,14	R\$ 197,37	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 197,37	100%
1.26.5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	38,40	R\$ 29,14	R\$ 1.118,97	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.118,97	100%
1.26.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	38,40	R\$ 15,81	R\$ 607,10	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 607,10	100%
1.26.7	96126	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	38,40	R\$ 21,21	R\$ 814,46	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 814,46	100%
1.26.8	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	2,72	R\$ 110,76	R\$ 301,26	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,26	100%
1.26.9	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESEÇA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	38,40	R\$ 3,41	R\$ 130,94	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,94	100%
1.26.10	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	41,73	R\$ 25,60	R\$ 1.068,28	41,73	R\$ 1.068,29	R\$ 0,00	R\$ 1.068,29	0%
1.26.11	7633	ORSE	Planta - ipê amarelo (tabebuia chrysothricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	4,00	R\$ 87,08	R\$ 348,32	4,00	R\$ 348,32	R\$ 0,00	R\$ 348,32	0%
1.26.12	9668	ORSE	Planta - borra rei vermelha (borra coccoinea red), fornecimento e plantio	un	16,00	R\$ 23,59	R\$ 377,44	16,00	R\$ 377,44	R\$ 0,00	R\$ 377,44	0%
1.26.13	10746	ORSE	Planta - Palmeria Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	4,00	R\$ 1.543,33	R\$ 6.173,32	4,00	R\$ 6.173,32	R\$ 0,00	R\$ 6.173,32	0%
1.27			PISO PRINCIPAL									
1.27.1	93079	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1.434,07	R\$ 81,22	R\$ 116.475,16	700,00	R\$ 56.854,00	1434,07	R\$ 116.475,17	0%
1.27.2	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	R\$ 50,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.27.3	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	737,84	R\$ 38,69	R\$ 28.547,02	126,88	R\$ 4.908,99	737,84	R\$ 28.547,03	0%
1.27.4	4889	ORSE	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	un	-	R\$ 45,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.27.5	12111	ORSE	Mesa em concreto armado polido (e=1,60, h=0,80 e h=0,75mm), 2 bancos em concreto armado (e=1,40, h=0,40 e h=0,40mm), com pintura acrílica	m²	4,00	R\$ 1.406,53	R\$ 5.626,12	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.626,12	100%
1.27.6	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m²	259,29	R\$ 10,50	R\$ 2.722,54	259,29	R\$ 2.722,55	R\$ 0,00	R\$ 2.722,55	0%
1.28			ESTACIONAMENTO									
1.28.1	41595	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	55,00	R\$ 15,70	R\$ 863,50	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 863,50	100%
1.28.2	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	5,00	R\$ 419,94	R\$ 2.099,70	2,00	R\$ 839,88	R\$ 0,00	R\$ 1.259,82	60%
1.28.3	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	125,00	R\$ 104,44	R\$ 13.055,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.055,00	100%
1.29			ACADEMIA									
1.29.1	9148	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	R\$ 4.280,54	R\$ 4.280,54	1,00	R\$ 4.280,54	R\$ 0,00	R\$ 4.280,54	0%
1.29.2	9145	ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	2,00	R\$ 2.898,47	R\$ 5.796,94	2,00	R\$ 5.796,94	R\$ 0,00	R\$ 5.796,94	0%
1.29.3	12448	ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	R\$ 2.427,70	R\$ 2.427,70	1,00	R\$ 2.427,70	R\$ 0,00	R\$ 2.427,70	0%
1.29.4	9143	ORSE	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1,00	R\$ 2.686,65	R\$ 2.686,65	1,00	R\$ 2.686,65	R\$ 0,00	R\$ 2.686,65	0%
1.29.5	11091	ORSE	Equipamento de ginástica - paralela dupla - galvanizado - Rev 01	un	1,00	R\$ 1.996,11	R\$ 1.996,11	1,00	R\$ 1.996,11	R\$ 0,00	R\$ 1.996,11	0%
1.29.6	11388	ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00	R\$ 2.898,47	R\$ 2.898,47	1,00	R\$ 2.898,47	R\$ 0,00	R\$ 2.898,47	0%
1.29.7	103210	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.334,78	R\$ 2.334,78	1,00	R\$ 2.334,78	R\$ 0,00	R\$ 2.334,78	0%
1.30			RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO									
1.30.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	27,00	R\$ 110,91	R\$ 2.994,57	27,00	R\$ 2.994,57	R\$ 0,00	R\$ 2.994,57	0%
1.30.2	96523	SINAPI	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 10.000 LITROS	UND	1,00	R\$ 6.322,52	R\$ 6.322,52	1,00	R\$ 6.322,52	R\$ 0,00	R\$ 6.322,52	0%
1.30.3	96523	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FCK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m³	42,00	R\$ 132,57	R\$ 5.567,94	42,00	R\$ 5.567,94	R\$ 0,00	R\$ 5.567,94	0%
1.30.4	96523	SINAPI	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	1,23	R\$ 682,01	R\$ 838,87	1,23	R\$ 838,87	R\$ 0,00	R\$ 838,87	0%


 Vanda Simões
 13.749.751/2001
 ARQUITETA
 CRÉDITO Nº 1001 - CREA


Tony Felix Andrade
 Engenharia Civil
 CREA-BA-052.000/77.8



1.30.5	9604	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	12,25	R\$ 2.169,95	R\$ 2.657,63	12,25	R\$ 2.657,64	12,25	R\$ 2.657,64	R\$ 0,00	0%
1.30.6	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 744,99	R\$ 744,99	1,00	R\$ 744,99	1,00	R\$ 744,99	R\$ 0,00	0%
1.30.7	10012	ORSE	Fornecimento e instalação de tela apo solidade nervurada CA 60, malha 1x1,5cm, ferro 4,2mm, painel 23cm, (1,30kg/m²), Malha Pop Reforçada Gendai ou similar	m²	12,25	R\$ 33,17	R\$ 406,33	12,25	R\$ 406,33	12,25	R\$ 406,33	R\$ 0,00	0%
1.30.8	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD, MARROM D= 23mm (3/4")	M	15,00	R\$ 9,72	R\$ 145,80	15,00	R\$ 145,80	15,00	R\$ 145,80	R\$ 0,00	0%
1.31			ILUMINAÇÃO										
1.31.1	101497	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUIDO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020, PS	UN	1,00	R\$ 1.718,32	R\$ 1.718,32	1,00	R\$ 1.718,32	1,00	R\$ 1.718,32	R\$ 0,00	0%
1.31.2	C4667	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	1,00	R\$ 805,00	1,00	R\$ 805,00	R\$ 0,00	0%
1.31.3	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 105,06	R\$ 105,06	1,00	R\$ 105,06	1,00	R\$ 105,06	R\$ 0,00	0%
1.31.4	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175sv	un	1,00	R\$ 70,28	R\$ 70,28	1,00	R\$ 70,28	1,00	R\$ 70,28	R\$ 0,00	0%
1.31.5	12240	ORSE	Quadro de distribuição de sobrepôr, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	R\$ 356,06	R\$ 356,06	1,00	R\$ 356,06	1,00	R\$ 356,06	R\$ 0,00	0%
1.31.6	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 61,74	R\$ 246,96	4,00	R\$ 246,96	4,00	R\$ 246,96	R\$ 0,00	0%
1.31.7	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	20,00	R\$ 22,72	R\$ 454,40	20,00	R\$ 454,40	20,00	R\$ 454,40	R\$ 0,00	0%
1.31.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	920,00	R\$ 8,89	R\$ 8.178,80	920,00	R\$ 8.178,80	920,00	R\$ 8.178,80	R\$ 0,00	0%
1.31.9	C3626	SEINFRA	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m	UN	30,00	R\$ 1.408,69	R\$ 42.260,70	30,00	R\$ 42.260,70	30,00	R\$ 42.260,70	R\$ 0,00	0%
1.31.10	11994	ORSE	Lumária em LED, para iluminação pública, 30W, bivolt, Seio A, Imetro corpo em alumínio inj, FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w/gar 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01	un	60,00	R\$ 632,05	R\$ 37.923,00	60,00	R\$ 37.923,00	60,00	R\$ 37.923,00	R\$ 0,00	0%
1.31.11	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	400,00	R\$ 17,03	R\$ 6.812,00	400,00	R\$ 6.812,00	400,00	R\$ 6.812,00	R\$ 0,00	0%
1.31.12	666	ORSE	Caixa de passagem, 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	30,00	R\$ 92,34	R\$ 2.770,20	30,00	R\$ 2.770,20	30,00	R\$ 2.770,20	R\$ 0,00	0%
1.32			LETREIRO										
1.32.1	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), esp 0,3mm, pintura Kaysar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	11,70	R\$ 507,10	R\$ 5.933,07	11,70	R\$ 5.933,07	11,70	R\$ 5.933,07	R\$ 0,00	0%
1.32.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m³	14,00	R\$ 99,64	R\$ 1.394,96	14,00	R\$ 1.394,96	14,00	R\$ 1.394,96	R\$ 0,00	0%
1.32.3	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM ÁREA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	m³	3,25	R\$ 110,55	R\$ 359,28	3,25	R\$ 359,28	3,25	R\$ 359,28	R\$ 0,00	0%
1.32.4	93991	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	6,50	R\$ 682,01	R\$ 4.433,06	6,50	R\$ 4.433,06	6,50	R\$ 4.433,06	R\$ 0,00	0%
1.32.5	96126	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO, AF_05/2017	m²	14,00	R\$ 21,21	R\$ 296,94	14,00	R\$ 296,94	14,00	R\$ 296,94	R\$ 0,00	0%
1.32.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	14,00	R\$ 15,81	R\$ 221,34	14,00	R\$ 221,34	14,00	R\$ 221,34	R\$ 0,00	0%
1.32.7	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF_06/2014	m²	14,00	R\$ 3,41	R\$ 47,74	14,00	R\$ 47,74	14,00	R\$ 47,74	R\$ 0,00	0%
1.33			SERVIÇOS FINAIS DA PRAÇA										
1.33.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1.585,68	R\$ 2,68	R\$ 4.249,62	1.585,68	R\$ 4.249,62	1.585,68	R\$ 4.249,62	R\$ 0,00	0%
2			PONTO DE ONIBUS										
2.1			FUNDAÇÃO										
2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	0,38	R\$ 91,64	R\$ 34,82	0,38	R\$ 34,82	0,38	R\$ 34,82	R\$ 0,00	0%
2.1.2	96956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	0,38	R\$ 2.863,29	R\$ 1.088,05	0,38	R\$ 1.088,05	0,38	R\$ 1.088,05	R\$ 0,00	0%
2.2			ESTRUTURA										
2.2.1	100729	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020, PE	m²	129,40	R\$ 20,30	R\$ 2.626,82	129,40	R\$ 2.626,82	129,40	R\$ 2.626,82	R\$ 0,00	0%


 Tony Felfy Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.065.677.8


 Tony Felfy Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.065.677.8



2.2.2	12834	ORSE	Projeto executivo de urbanização de parques, camping, estacionamento, espaços urbanos, áreas livres das indústrias, terminais de transportes, conjuntos habitacionais - acríma de 25.000m²/m²	m²	-	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
2.2.3	1845	ORSE	Alapão em chapas de aço e 3/16"	m²	3,00	R\$ 515,36	R\$ 1.546,08	R\$ 1.546,08	3,00	R\$ 1.546,08	R\$ 0,00	0%
2.2.4	13060	ORSE	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/elec. - Rev 01	m²	17,52	R\$ 477,59	R\$ 8.367,37	R\$ 8.367,38	17,52	R\$ 8.367,38	R\$ 0,00	0%
2.2.5	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	13,96	R\$ 507,10	R\$ 7.079,11	R\$ 7.079,12	13,96	R\$ 7.079,12	R\$ 0,00	0%
2.2.6	4889	ORSE	Passivo em concreto simples ci dimensionado e=5cm	m²	32,75	R\$ 45,15	R\$ 1.478,66	R\$ 1.478,66	32,75	R\$ 1.478,66	R\$ 0,00	0%
2.2.7	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	R\$ 419,94	R\$ 419,94	R\$ 419,94	0,00	R\$ 0,00	R\$ 419,94	100%
2.3			ILUMINAÇÃO E CANTEIRO									
2.3.1	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_06/2016	M	58,00	R\$ 50,97	R\$ 2.956,26	R\$ 2.956,26	58,00	R\$ 2.956,26	R\$ 0,00	0%
2.3.2	12160	ORSE	Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti-vandalismo contra impacto IK08, Pol:27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin: 3800 a 6100 lúmens, 4000K, CRIMC>70, base p/ reb. fotocelula, corpinho alum, injetado p/uti. poliester a p.c, tensão 220v	un	8,00	R\$ 1.196,03	R\$ 9.568,24	R\$ 9.568,24	8,00	R\$ 9.568,24	R\$ 0,00	0%
2.3.3	7845	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 208mm, altura total 12m, com base de feçojo, Conpost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conpost ou similar	un	4,00	R\$ 1.186,07	R\$ 24.744,28	R\$ 12.372,14	2,00	R\$ 12.372,14	R\$ 12.372,14	50%
2.3.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 4507/50 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	200,00	R\$ 8,89	R\$ 1.778,00	R\$ 1.778,00	200,00	R\$ 1.778,00	R\$ 0,00	0%
2.3.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	100,00	R\$ 17,84	R\$ 1.784,00	R\$ 1.784,00	100,00	R\$ 1.784,00	R\$ 0,00	0%
2.3.6	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4,00	R\$ 186,17	R\$ 752,68	R\$ 376,34	2,00	R\$ 376,34	R\$ 376,34	50%
2.3.7	8376	ORSE	Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) (h=3,00m, fornecimento e plantio)	un	8,00	R\$ 300,27	R\$ 2.402,16	R\$ 2.402,16	8,00	R\$ 2.402,16	R\$ 0,00	0%
2.3.8	10746	ORSE	Planta - Palmeira Vecchia, (h=3,00m, fornecimento e plantio)	un	2,00	R\$ 1.543,33	R\$ 3.086,66	R\$ 3.086,66	2,00	R\$ 3.086,66	R\$ 0,00	0%
3			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO									
3.1			AVENIDA ARLINDO JOÃO DA SILVA TRECHO - 1									
3.1.1			TERRAPLANAGEM									
3.1.1.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_11/2019	m²	1.787,74	R\$ 1,32	R\$ 2.359,81	R\$ 2.359,82	1.787,74	R\$ 2.359,82	R\$ 0,00	0%
3.1.2			PAVIMENTAÇÃO									
3.1.2.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	1.787,74	R\$ 90,80	R\$ 162.326,79	R\$ 162.326,79	1.787,74	R\$ 162.326,79	R\$ 0,00	0%
3.1.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016	M	410,98	R\$ 49,76	R\$ 20.450,36	R\$ 20.450,36	410,98	R\$ 20.450,36	R\$ 0,00	0%
3.2			AVENIDA ARLINDO JOÃO DA SILVA TRECHO - 2									
3.2.1			TERRAPLANAGEM									
3.2.1.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_11/2019	m²	3.121,57	R\$ 1,32	R\$ 4.120,47	R\$ 2.269,65	1.719,43	R\$ 3.553,44	R\$ 567,03	14%
3.2.2			PAVIMENTAÇÃO									
3.2.2.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	3.121,57	R\$ 90,80	R\$ 283.438,55	R\$ 160.664,24	1.769,43	R\$ 244.433,60	R\$ 39.004,95	14%
3.2.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016	M	683,85	R\$ 49,76	R\$ 34.028,37	R\$ 1.570,92	31,57	R\$ 29.536,04	R\$ 4.492,33	13%
3.3			TRAVESSA 12 DE OUTUBRO									
3.3.1			TERRAPLANAGEM									
3.3.1.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_11/2019	m²	1.724,10	R\$ 1,32	R\$ 2.275,81	R\$ 159,31	120,69	R\$ 227,81	R\$ 0,00	0%
3.3.2			PAVIMENTAÇÃO									
3.3.2.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	1.724,10	R\$ 90,80	R\$ 156.548,28	R\$ 10.958,65	120,69	R\$ 10.958,65	R\$ 0,00	0%



Tony Felfe Andrezo
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677-8

Wald Simões Sob
0749.775.5001
ARQUITETA LUIZA
SANTANA
CNPJ nº 12.112.112/0001-00

3.3.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUAIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF_06/2016	M	208,90	R\$ 49,76	R\$ 10.394,86	60,53	R\$ 3.011,97	208,90	R\$ 10.394,70	R\$ 0,00	0%
3.4			RUA ENTORNO DA PRAÇA										
3.4.1	100577	SINAPI	TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	932,03	R\$ 1,32	R\$ 1.230,27	246,43	R\$ 325,29	932,03	R\$ 1.230,28	R\$ 0,00	0%
3.4.2			PAVIMENTAÇÃO										
3.4.2.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	932,03	R\$ 90,80	R\$ 84.628,32	246,43	R\$ 22.375,84	932,03	R\$ 84.628,32	R\$ 0,00	0%
3.4.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUAIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF_06/2016	M	195,53	R\$ 49,76	R\$ 9.729,57	70,00	R\$ 3.483,20	195,53	R\$ 9.729,57	R\$ 0,00	0%
3.5			LIMPEZA GERAL DA PAVIMENTAÇÃO										
3.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	7.445,44	R\$ 0,52	R\$ 3.905,87	7.445,44	R\$ 3.871,63	7.445,44	R\$ 3.871,63	R\$ 0,00	0%
3.6			SERVIÇOS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO										
3.6			MOVIMENTO DE TERRA										
3.6.1	102355	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	72,00	R\$ 224,78	R\$ 16.184,21	72,00	R\$ 0,00	72,00	R\$ 16.184,21	R\$ 0,00	0%
3.6.2	102361	SINAPI	RETRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APOS ESCAVADO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROSCAVADEIRA EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	72,00	R\$ 42,18	R\$ 3.037,23	72,00	R\$ 0,00	72,00	R\$ 3.037,23	R\$ 0,00	0%
3.7			COBERTURA										
3.7.1	13060	ORSE	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em todo/cobertura/fechamento/etc. - Rev 01	m²	25,30	R\$ 463,01	R\$ 11.714,17	25,30	R\$ 11.714,17	25,30	R\$ 11.714,17	R\$ 0,00	0%
3.8			PISO										
3.8.1	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014	m²	91,07	R\$ 212,85	R\$ 19.384,02	91,07	R\$ 19.384,03	91,07	R\$ 19.384,03	R\$ 0,00	0%
3.8.2	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	m²	55,89	R\$ 81,09	R\$ 4.531,99	55,89	R\$ 4.531,99	55,89	R\$ 4.531,99	R\$ 0,00	0%
3.8.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	55,89	R\$ 2,76	R\$ 154,48	55,89	R\$ 154,49	55,89	R\$ 154,49	R\$ 0,00	0%
3.8.4	11380	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdaou ou similar	m²	55,89	R\$ 11,68	R\$ 652,53	55,89	R\$ 652,53	55,89	R\$ 652,53	R\$ 0,00	0%
3.9			PISO PRINCIPAL										
3.9.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	m²	319,04	R\$ 81,09	R\$ 25.870,22	59,00	R\$ 4.784,18	319,04	R\$ 25.870,23	R\$ 0,00	0%
3.9.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	319,04	R\$ 2,76	R\$ 881,86	59,00	R\$ 163,08	319,04	R\$ 881,86	R\$ 0,00	0%
3.9.3	11380	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdaou ou similar	m²	319,04	R\$ 11,68	R\$ 3.724,89	59,00	R\$ 688,84	319,04	R\$ 3.724,89	R\$ 0,00	0%
4.0			DRENAGEM										
4.0.1	92849	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30,00	R\$ 232,56	R\$ 6.976,72	30,00	R\$ 6.976,72	30,00	R\$ 6.976,72	R\$ 0,00	0%
4.0.2	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	18,00	R\$ 15,26	R\$ 274,76	18,00	R\$ 274,76	18,00	R\$ 274,76	R\$ 0,00	0%
4.0.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,20	R\$ 33,95	R\$ 40,74	1,20	R\$ 40,74	1,20	R\$ 40,74	R\$ 0,00	0%
4.0.4	92749	SINAPI	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO, TIPO RACHÃO COM SOLO REFORÇADO, PARA MUIROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	m³	1,20	R\$ 1.046,04	R\$ 1.255,25	1,20	R\$ 1.255,25	1,20	R\$ 1.255,25	R\$ 0,00	0%
4.0.5	92867	SINAPI	ARRAMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	111,06	R\$ 13,37	R\$ 1.484,51		R\$ 0,00		R\$ 1.484,51	R\$ 0,00	100%
4.0.6	92867	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	18,00	R\$ 50,79	R\$ 914,13		R\$ 0,00		R\$ 914,13	R\$ 0,00	100%



Tony Felfel Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.095.677.8

Wendell Soares
13.743.775/2001-0
ARQUITETO
CREA-BA: 006.006.006
Cadastrado Profissional

4.0.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	2,70	R\$ 552,08	R\$ 1.490,61	R\$ 1.490,62	2,70	R\$ 1.490,62	R\$ 1.507.253,08	R\$ 0,00	0%	
TOTAL GERAL:											R\$ 1.644.178,34	R\$ 689.966,31	R\$ 136.925,26	8%

Wendell Soares Corp
 13.749.775/0001-10
 RUA SINGERMANIA LTDA
 ALV. SINGERMANIA, 800 - GARDIA
 CEP: 41.100-10 Salvador - Bahia

Tony Felix Andrade
 Eng. Civil
 CREA-BA: 052.055.677-8





MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO
RUA MACARIO FERREIRA, Nº 517 - CENTRO
BAIRRO: CENTRO - CEP: 48700-000
CNPJ: 13.845.086/0001-03 - TEL: (75) 3261-8500

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

Nº 4603 / 2024

CONCEDIDO À

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ARK ENGENHARIA LTDA.

CPF/CNPJ: 13.749.776/0001-50

Endereço: Rua REGINALDO RIBEIRO Nº00808 - GINASIO - Serrinha-BA CEP: 48700-000

Certifico para os devidos fins e efeitos legais que revendo os arquivos da secretaria municipal da fazenda através da Diretoria de arrecadação e Tributos, vem informar que não constam débitos vencidos, até a presente data de, **TRIBUTOS MUNICIPAIS**, em nome do contribuinte supra citado.

A certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal, cobrar em qualquer tempo, os débitos que venham a serem apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Serrinha, na Internet, no endereço <http://www.serrinha.ba.gov.br/>

OBSERVAÇÕES

null

Emitida em: 10/05/2024 , por Portal de Serviços

Validade: 180 dias

MUNICIPIO DE SERRINHA - Bahia, Sexta-feira, 10 de Maio de 2024

Chave de validação: 477483fe





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20242217708**

RAZÃO SOCIAL	
XXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	13.749.776/0001-50

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/05/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARK ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.749.776/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:14:18 do dia 11/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2024.

Código de controle da certidão: **3D48.328F.FBD2.E078**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARK ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.749.776/0001-50

Certidão nº: 22270950/2024

Expedição: 02/04/2024, às 22:34:54

Validade: 29/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARK ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.749.776/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.749.776/0001-50
Razão Social: ARK ENGENHARIA LTDA
Endereço: R REGINALDO RIBEIRO 808 / GINASIO / SERRINHA / BA / 48700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2024 a 26/07/2024

Certificação Número: 2024062718581945027183

Informação obtida em 09/07/2024 11:46:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 **Nome Empregador:** ARK ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070817429663-9 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 08/07/2024 09:26:51 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024		BARBARA LIMA MENDONCA PIO	6	046.850.465-60	101	19/07/2024	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	
							Total do Tomador	Sem Tomador	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
							Total do Estabelecimento	13.749.776/0001-50	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
								Total da Guia	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 Nome Empregador: ARK ENGENHARIA LTDA
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070817429663-9 Emitida por: 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
 Data Emissão: 08/07/2024 09:26:51 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 13.749.776/0001-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	1	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
		Total da Guia	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Alféia não profissional em formação que receba bolsa





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 **Nome Empregador:** ARK ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070817429663-9 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 08/07/2024 09:26:51 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	13.749.776/0001-50	1	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
		Total da Guia	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 **Nome Empregador:** ARK ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070817429663-9 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 08/07/2024 09:26:51 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 13.749.776/0001-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	1	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
		Total da Guia	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 **Nome Empregador:** ARK ENGENHARIA LTDA
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070817429663-9 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Qtd. Trabalhadores: 1 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 08/07/2024 09:26:51 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024	1	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
	Total da Guia	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00





Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 128,00

Pagamento realizado

08/07/2024 16:04

De

Denilson Contabilidade E Negocios

CNPJ: 11459018000172

Ag 0001 - Cc 3852329-8

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

ID da transação

E37880206202407081904JUT7HKRQV30

Autenticação Cora

4041289d-119e-437f-8eb2-fdb5f5283d67

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARK ENGENHARIA LTDA	CNPJ	13.749.776/0001-50
Período de Apuração	06/2024	Número do Recibo	0000050000245518367
Data/Hora da Transmissão	08/07/2024 09:15:30	Identificação da Apuração de Débitos	78787063 / Reinf CP 26818615272 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2024	122,82	122,82	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	320,00	320,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	48,00	48,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	40,00	40,00	0,00



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARK ENGENHARIA LTDA	CNPJ	13.749.776/0001-50
Período de Apuração	06/2024	Número do Recibo	0000050000245518367
Data/Hora da Transmissão	08/07/2024 09:15:30	Identificação da Apuração de Débitos	78787063 / Reinf CP 26818615272 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	7.054,40	468,78	6.585,62
Salário Família	62,04	62,04	0,00



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.749.776/0001-50
Nome	ARK ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	78787063 / Reinf CP 26818615272 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 122,82	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 368,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 40,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 530,82	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- a) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- b) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- c) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WENDEL SIMOES CRUZ
CPF	039.993.565-70
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/07/2024 09:15:30
Nº do recibo de entrega	000005000024551836



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARK ENGENHARIA LTDA	CNPJ	13.749.776/0001-50
Período apuração	06/2024	Número do Recibo	50000245518367
Data/Hora da Transmissão	08/07/2024 09:15:30	Identificação da Apuração de Débitos	78787063 / Reinf CP 26818615272 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	REGINALDO RIBEIRO	Número	808
Complemento	-	Bairro/Distrito	GINASIO
Município	SERRINHA	UF	BA
CEP	48700000	Telefone	7193063856
Correio Eletrônico	ARKENGENHARIAEIRELI@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WENDEL SIMOES CRUZ	CPF	03999356570
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	WENDEL SIMOES CRUZ		
CPF	03999356570	CRC	-
UF	-	Telefone	7532610256
Correio Eletrônico	plaredef@hotmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	40,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	48,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 48,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	320,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 320,00		
Saldo a Pagar	0,00		


Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	122,82		
Deduções	Salário Família: 62,04 Retenção Lei 9711/98: 60,78		
Saldo a Pagar	0,00		



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
			X							
			S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO										
CONTRATO Nº 011-2024			CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022				RDO: 121		CATEGORIA	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()									QTDE	
SIMBOLOGIA			MÃO DE OBRA INDIRETA							
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Engenheiro 1							
			Tec. de Segurança							
			Aux Adm							
			Mestre de obra							
			Encarregado geral 1							
			Hh DO DIA							
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ESPALHAMENTO DE PARALELO ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO			MÃO DE OBRA DIRETA							
			Topografo							
			Auxiliar de topografia							
			Pedreiro 3							
			Ajudante Geral 8							
			Calceteiro 4							
			Carpinteiro							
			Operador de Motosserra							
			Motorista							
			Montador							
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO							
			EFETIVO DO DIA							
			JORNADA DE TRABALHO							
			Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES			Hh ACUMULADO							
			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
			TIPO QTDE.							
			Veiculo Leve							
			Caminhão Munck							
			Caminhão Toco							
			Escavadeira							
			Pá carregadeira							
			Caçamba							
			Patrol							
			PC 200							
			Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/05/2024			Data: 27/05/2024							


 Tony Felix Andrade
 Engenharia Civil
 CREA-BA: 032.052.877.8


 Wendell Simões Góes
 749.775/0003-0
 W&S ENGENHARIA LTDA
 RUA HILÁRIO PINHEIRO, 800 - GRAJAÚ
 CEP: 41.145-000 Salvador - Bahia



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO											
CONTRATO Nº 011-2024				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022				RDO: 122			
CATEGORIA				QTDE							
MÃO DE OBRA INDIRETA											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()											
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ESPALHAMENTO DE PARALELO ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Padreiro 3							
				Ajudante Geral 8							
				Calceteiro 4							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/05/2024				Data: 28/05/2024							

Wendel Simões Góes
 13.749.775/0001-0
 W&S ENGENHARIA LTDA
 RUA INDUSTRIAL PIMENTA, 806 - GARDAS
 CEP: 45.120-000 - SANTALUZ - BA

Tony Ferreira
 Engenheiro
 CREA - BA 082.611/77.3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	X	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO									
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 123		CATEGORIA			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA			QTDE				
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra							
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ESPALHAMENTO DE PARALELO ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO		Engenheiro							1
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral							1
Hh DO DIA		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro							3
		Ajudante Geral							8
		Calceiteiro							4
		Carpinteiro							
		Operador de Motoserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
Hh DO DIA		RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO							
		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO							QTDE.
		Veiculo Leve							
		Caminhão Muncck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 29/05/2024		Data: 29/05/2024							

Wendel Simões Goy
 13.749.775/0001-10
 RAY S ENGENHARIA LTDA.
 RUA INDUSTRIAL BERNET, 806 - CORDÃO
 1 - ZIP 44.124-10 - Salvador - Bahia

Tony Felix Andrade
 Engenharia Civil
 CREA-BA, 052.058.377.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO									
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 124		CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ESPALHAMENTO DE PARALELO ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO		Gerente de Obra			1				
		Engenheiro							
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral			1				
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro			3				
		Ajudante Geral			8				
		Calceteiro			4				
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO			QTDE.				
		Veiculo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/05/2024		Data: 30/05/2024							

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA Nº 052.052.77.8

Wendel Simões Góes
13.749.775/0001-0
ARZ ENGENHARIA LTDA
RUA HILÁRIO PEREIRA, 800 - Centro
13200-000 - Santa Luz - Bahia



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO								
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 125		CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ESPALHAMENTO DE PARALELO ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO		Gerente de Obra						1
		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						1
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						3
		Ajudante Geral						8
		Calceiro						4
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						QTDE.
		Veiculo Leve						
		Caminhão MuncK						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 31/05/2024		Data: 31/05/2024						

Tony Felix Andrade
Eng.º Civil nº 10.177.8
CREA-BA: 052.010.177.8

Wendell Simões Corp
13.749.775/0001-00
S.R.L. ENGENHARIA LTDA
Rua Industrial Pimentel, 805 - Graças
1.212 - FLORESTA - Salvador - Bahia



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO													
CONTRATO Nº 011-2024						CATEGORIA							
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022 RDO: 126						QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro							
						Tec. de Segurança							
SEM SERVIÇO						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
						CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO	
												EFETIVO DO DIA	
												JORNADA DE TRABALHO	
												Hh DO DIA	
												Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES												EFETIVO EQUIPAMENTOS	
												TIPO	
												QTDE.	
												Veiculo Leve	
												Caminhão MuncK	
												Caminhão Toco	
												Escavadeira	
												Pá carregadeira	
												Caçamba	
												Patrol	
												PC 200	
												Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA:												FISCALIZAÇÃO:	
Data: 01/06/2024						Data: 01/06/2024							

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA BA. 018/C-0001773

Wendell Simões Corp
 13.749.778/0001-00
 ARS ENGENHARIA LTDA
 Rua Industrial Póster, 805 - Graças
 CEP: 41.100-110 Salvador - Bahia



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO		CATEGORIA						
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 127		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		Gerente de Obra						
		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calçateiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veiculo Leve						
		Caminhão Muncck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/06/2024		Data: 02/06/2024						

Tony F. A. Andrade
 Engenheiro Civil
 CRETA-BA: 032.011.177.8

Wendel Simões Cruz
 13.749.775/0001-00
 RUA: ENGENHARIA LTDA
 Rua Industrial de Ferro, 805 - Centro
 CEP: 45.114-110 - Salvador - Bahia



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO		CATEGORIA						
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 128		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ASSENTAMENTO DE PARALELO EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO		Gerente de Obra				1		
		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra				1		
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro				3		
		Ajudante Geral				8		
		Calceteiro				4		
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO				QTDE.		
		Veiculo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 03/06/2024		Data: 03/06/2024						

Tony Felício
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.656/77.8

Wendel Simões
15.749.775/0001-8
RUA SARGENTANA LTDA
RUA SARGENTANA, 808 - Centro
12200-000 - SANTALUZ - SP



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO								
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 129		CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ASSENTAMENTO DE PARALELO EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO NATURAL EXECUÇÃO DE PASTILHA		Gerente de Obra						
		Engenheiro 1						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro 3						
		Ajudante Geral 8						
		Calçateiro 4						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Muncck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/06/2024		Data: 04/06/2024						

Tony Felipe de
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.041/77.8

Wendell Simões
13.749.775/0001
ENGENHARIA LTDA
Rua ... SANTALUZ BAHIA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO								
CONTRATO Nº 011-2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022 RDO: 130								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra						
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ASSENTAMENTO DE PARALELO EXECUÇÃO DE COBERTURA METALICA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO NATURAL EXECUÇÃO DE PASTILHA		Engenheiro 1						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
Topografo								
Auxiliar de topografia								
Pedreiro 3								
Ajudante Geral 8								
Calçateiro 4								
Carpinteiro								
Operador de Motosserra								
Motorista								
Montador								
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor								
Serralheiro								
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veiculo Leve						
		Caminhão Muncck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 05/06/2024		Data: 05/06/2024						

Tony F. H. Andrade
Engenheiro Civil
CPF: 052.056.773

Wendell Simões Grog
CPF: 049.775/2001
RUA SINGERMANIA LTDA
RUA SINGERMANIA PEREIRA, 808 - GARÇA
C.P. 4.111/0 - SANTALUZ - BA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO											
CONTRATO Nº 011-2024				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022				RDO: 131			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ASSENTAMENTO DE PARALELO EXECUÇÃO DE COBERTURA METALICA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO NATURAL EXECUÇÃO DE PASTILHA				Tec. de Segurança							
				Aux Adm 8							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 3							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro 8							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Caminhão MuncK							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/06/2024				Data: 06/06/2024							

Tony Ferraz
Engenheiro Civil
CREA-PA: 052.048.77.8

Wendell Simões
749.775/0001
ARRE ENGERRARIA LTDA
Rua Industrial Piment, 808 - Garanhuns
CEP: 55.120-000 - Pernambuco



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ											
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 011-2024				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022				RDO: 132			
CATEGORIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança							
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ASSENTAMENTO DE PARALELO EXECUÇÃO DE COBERTURA METALICA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO NATURAL EXECUÇÃO DE PASTILHA				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 3							
				Ajudante Geral 8							
				Calceteiro 4							
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 07/06/2024				Data: 07/06/2024							

Tony Felix de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA: Lw: 052.056.177.3

Wendel Simões Góes
 13.749.775/0001-00
 WENDEL ENGENHARIA LTDA
 Rua Industrial Póster, 800 - Graças
 CEP: 41.100-000 Salvador - BA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO													
CONTRATO Nº 011-2024						CATEGORIA							
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022						MÃO DE OBRA INDIRETA							
RDO: 132						MÃO DE OBRA DIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab. Tarde: (1) Noite: ()						Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA						Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
SEM SERVIÇO						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						Veiculo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/06/2024						Data: 08/06/2024							

Tony Felix Almeida
 Engenheiro Civil
 CPF: 04.052.011-77,8

Wendell Simões Góes
 11.749.775/0001-00
 W&S ENGENHARIA LTDA
 Rua Industrial Pimentel, 808 - Galvão
 CEP: 41.110-000 Salvador - Bahia



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ											
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 011-2024				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022			RDO: 133				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
SEM SERVIÇO				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/06/2024				Data: 09/06/2024							

Tony Felix Almeida
Engenheiro Civil
CPF: 032.054.577.8

Wendel Simões Cruz
0349.775/0001
RUA SHERMANN LTDA
RUA INDEPENDÊNCIA, 808 - Centro
CIP 011210-0000 - BARRA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO								
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 134		CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA		
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro 1						
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ASSENTAMENTO DE PARALELO EXECUÇÃO DE CERÂMICA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO NATURAL EXECUÇÃO DE PASTILHA EXECUÇÃO DO PERGOLADO ASSENTAMENTO DO ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro 3						
		Ajudante Geral 8						
Calceteiro 4								
Carpinteiro								
Operador de Motosserra								
Motorista								
Montador								
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor								
Serralheiro								
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		QTDE.						
		Veículo Leve						
		Caminhão MuncK						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
Caçamba								
Patrol								
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/06/2024		Data: 10/06/2024						

Wendel Simões Cruz
 13.749.775/0001-0
 RUA SHERMANN LTDA
 AVA INDUSTRIAL PIMENTA, 808 - Centro
 CEP 41.110-000 - Bahia

Tony Felício
 Engenheiro Civil
 CREA-BA, 032.001.177.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
		S	X
		T	Q
		Q	S
		S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO CONTRATO Nº 011-2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022 RDO: 135		EFETIVO PESSOAL	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA	QTDE
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA	
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ASSENTAMENTO DE PARALELO EXECUÇÃO DE CERÂMICA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO NATURAL EXECUÇÃO DE PASTILHA EXECUÇÃO DO PERGOLADO ASSENTAMENTO DO ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL		Gerente de Obra	
		Engenheiro	1
		Tec. de Segurança	
		Aux Adm	
		Mestre de obra	
		Encarregado geral	1
		Hh DO DIA	
		MÃO DE OBRA DIRETA	
		Topografo	
		Auxiliar de topografia	
		Pedreiro	3
		Ajudante Geral	8
		Calceteiro	4
		Carpinteiro	
		Operador de Motosserra	
		Motorista	
		Montador	
		Montador/Eletricista	
		Eletricista	
		Operador de Patrol	
		Operador de Escavadeira	
		Operador de Pá carregadeira	
		Motorista de caçamba	
		Pintor	
		Serralheiro	
		Hh DO DIA	
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO	
		EFETIVO DO DIA	
		JORNADA DE TRABALHO	
		Hh DO DIA	
		Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS	
		TIPO	QTDE.
		Veiculo Leve	
		Caminhão Munck	
		Caminhão Toco	
		Escavadeira	
		Pá carregadeira	
		Caçamba	
		Patrol	
		PC 200	
		Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA:	FISCALIZAÇÃO:		
Data: 11/06/2024	Data: 11/06/2024		


Wendel Simões Goy
 13.749.775/0001-0
 ARV ENGENHARIA LTDA
 RUA INDUSTRIAL PIMENTA, 800 - CENAS
 CEP: 11.150-000 - SANTALUZ - SP

Tony Feijó Andrade
 Engenheiro Civil
 CRP 17.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO								
CONTRATO Nº 011-2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022 RDO: 136								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1				
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ASSENTAMENTO DE PARALELO EXECUÇÃO DE CERÂMICA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO NATURAL EXECUÇÃO DE PASTILHA EXECUÇÃO DO PERGOLADO ASSENTAMENTO DO ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL				Tec. de Segurança				
				Aux Adm				
				Mestre de obra				
				Encarregado geral 1				
				Hh DO DIA				
				MÃO DE OBRA DIRETA				
				Topografo				
				Auxiliar de topografia				
				Pedreiro 3				
				Ajudante Geral 8				
		Calceteiro 4						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 12/06/2024		Data: 12/06/2024						


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.066.077.8


 Wendel Simões Cruz
 13.749.775/0001-0
 WSC ENGENHARIA LTDA
 RUA HILÁRIO RIBEIRO, 905 - Centro
 CEP: 44.145-000 - Salvador - Bahia



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO									
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 137		CATEGORIA		QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra						1	
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO		Engenheiro							
ASSENTAMENTO DE PARALELO		Tec. de Segurança							
EXECUÇÃO DE CERÂMICA		Aux Adm							
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO		Mestre de obra							
ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO		Encarregado geral						1	
ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO									
ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO NATURAL									
EXECUÇÃO DE PASTILHA									
EXECUÇÃO DO PERGOLADO									
ASSENTAMENTO DO ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL									
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro						3	
		Ajudante Geral						8	
		Calceteiro						4	
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO						QTDE.	
		Veiculo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/06/2024		Data: 13/06/2024							

Tony Ferreira
Engenheiro
CREA-BA: 0520 / 2017 R

Wendel Simões
249.775/0001-0
RUA ENGENHARIA LTDA
RUA INDUSTRIAL PIMENTES, 800 - Centro
CEP: 45.000-000 - Salvador - Bahia



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO								
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 138		CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ASSENTAMENTO DE PARALELO EXECUÇÃO DE CERÂMICA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO NATURAL EXECUÇÃO DE PASTILHA EXECUÇÃO DO PERGOLADO ASSENTAMENTO DO ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calçeteiro 4 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 14/06/2024		Data: 14/06/2024						

Tony Ferraz Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.085.077.8

Wendel Simões Grog
 2749.775/2001-0
 WENDEL ENGENHARIA LTDA
 RUA AUGUSTO PIMENTA, 805 - Centro
 CEP: 45.110-000 - Salvador - Bahia



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO								
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 139		CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
SEM SERVIÇO		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calceiteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
		CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO				
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		QTDE.						
		Veiculo Leve						
		Caminhão Muncck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 15/06/2024		Data: 15/06/2024						

Tony Ferraz de Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.000.000/77.8

Wendell Simões Góes
03749.775/0001
RUA: ENGENHARIA LTDA
RUA: ENGENHARIA LTDA
RUA: ENGENHARIA LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO											
CONTRATO Nº 011-2024				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022			RDO: 140		CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
SEM SERVIÇO				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO			
								EFETIVO DO DIA			
								JORNADA DE TRABALHO			
								Hh DO DIA			
								Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS			
								TIPO		QTDE.	
								Veiculo Leve			
								Caminhão Muncik			
								Caminhão Toco			
								Escavadeira			
								Pá carregadeira			
								Caçamba			
								Patrol			
								PC 200			
								Placa Vibratória			
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:			
Data: 16/06/2024				Data: 16/06/2024							

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
C.R.C.-BA. 052.000.000-77.8

Wendell Simões Góes
0749.775/0001-0
WENDEL ENGENHARIA LTDA
Avenida Industrial Pólo, 800 - Centro
CEP: 45.110-000 - Salvador - Bahia



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data																																						
		X																																						
		S	T	Q	Q	S	S	D																																
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL																																						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO																																								
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 141		CATEGORIA		QTDE																																
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA																																						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																																						
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ASSENTAMENTO DE PARALELO EXECUÇÃO DE CERÂMICA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO NATURAL EXECUÇÃO DE PASTILHA EXECUÇÃO DO PERGOLADO ASSENTAMENTO DO ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL		Gerente de Obra																																						
		<table border="1"> <tr><td>Gerente de Obra</td><td></td></tr> <tr><td>Engenheiro</td><td>1</td></tr> <tr><td>Tec. de Segurança</td><td></td></tr> <tr><td>Aux Adm</td><td></td></tr> <tr><td>Mestre de obra</td><td></td></tr> <tr><td>Encarregado geral</td><td>1</td></tr> <tr><td colspan="2">Hh DO DIA</td></tr> </table>							Gerente de Obra		Engenheiro	1	Tec. de Segurança		Aux Adm		Mestre de obra		Encarregado geral	1	Hh DO DIA																			
Gerente de Obra																																								
Engenheiro	1																																							
Tec. de Segurança																																								
Aux Adm																																								
Mestre de obra																																								
Encarregado geral	1																																							
Hh DO DIA																																								
		MÃO DE OBRA DIRETA																																						
		<table border="1"> <tr><td>Topografo</td><td></td></tr> <tr><td>Auxiliar de topografia</td><td></td></tr> <tr><td>Pedreiro</td><td>3</td></tr> <tr><td>Ajudante Geral</td><td>8</td></tr> <tr><td>Calceteiro</td><td>4</td></tr> <tr><td>Operador de Motosserra</td><td></td></tr> <tr><td>Motorista</td><td></td></tr> <tr><td>Montador</td><td></td></tr> <tr><td>Montador/Eletricista</td><td></td></tr> <tr><td>Eletricista</td><td></td></tr> <tr><td>Operador de Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>Operador de Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Operador de Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Motorista de caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Pintor</td><td></td></tr> <tr><td>Serralheiro</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Hh DO DIA</td></tr> </table>							Topografo		Auxiliar de topografia		Pedreiro	3	Ajudante Geral	8	Calceteiro	4	Operador de Motosserra		Motorista		Montador		Montador/Eletricista		Eletricista		Operador de Patrol		Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira		Motorista de caçamba		Pintor		Serralheiro	
Topografo																																								
Auxiliar de topografia																																								
Pedreiro	3																																							
Ajudante Geral	8																																							
Calceteiro	4																																							
Operador de Motosserra																																								
Motorista																																								
Montador																																								
Montador/Eletricista																																								
Eletricista																																								
Operador de Patrol																																								
Operador de Escavadeira																																								
Operador de Pá carregadeira																																								
Motorista de caçamba																																								
Pintor																																								
Serralheiro																																								
Hh DO DIA																																								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO																																						
		<table border="1"> <tr><td>EFETIVO DO DIA</td><td></td></tr> <tr><td>JORNADA DE TRABALHO</td><td></td></tr> <tr><td>Hh DO DIA</td><td></td></tr> <tr><td>Hh ACUMULADO</td><td></td></tr> </table>							EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO		Hh DO DIA		Hh ACUMULADO																									
EFETIVO DO DIA																																								
JORNADA DE TRABALHO																																								
Hh DO DIA																																								
Hh ACUMULADO																																								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veiculo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Muncck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veiculo Leve		Caminhão Muncck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória													
TIPO	QTDE.																																							
Veiculo Leve																																								
Caminhão Muncck																																								
Caminhão Toco																																								
Escavadeira																																								
Pá carregadeira																																								
Caçamba																																								
Patrol																																								
PC 200																																								
Placa Vibratória																																								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																																						
Data: 17/06/2024		Data: 17/06/2024																																						

Tony Felix Andrade
 Engenharia Civil
 CREA-BA: 052.054-177.8

Wendel Simões Cruz
 13 749.775/0001-00
 BRU ENGENHARIA LTDA
 Rua Ilustração S/Nº, 805 - Graças
 CEP: 44.111-110 - Salvador - Bahia



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO									
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 142		CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ASSENTAMENTO DE PARALELO EXECUÇÃO DE CERÂMICA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO NATURAL EXECUÇÃO DE PASTILHA EXECUÇÃO DO PERGOLADO ASSENTAMENTO DE PEITORIL E SOLEIRA		Gerente de Obra							
		Engenheiro 1							
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral 1							
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
Topografo									
Auxiliar de topografia									
Pedreiro 3									
Ajudante Geral 8									
Calceteiro 4									
Operador de Motosserra									
Motorista									
Montador									
Montador/Eletricista									
Eletricista									
Operador de Patrol									
Operador de Escavadeira									
Operador de Pá carregadeira									
Motorista de caçamba									
Pintor									
Serralheiro									
Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO							
		Veiculo Leve							
		Caminhão Munch							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
PC 200									
Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/06/2024		Data: 18/06/2024							

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA. 052.056.177.8

Wendell Simões Góes
C.R. 749.775/0003
W&S ENGENHARIA LTDA
RUA INDEPENDÊNCIA, 806 - Centro
Cidade de Santa Luzia - Bahia



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO		CATEGORIA						
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022			RDO: 143		QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ASSENTAMENTO DE PARALELO EXECUÇÃO DE CERÂMICA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO NATURAL EXECUÇÃO DE PASTILHA EXECUÇÃO DO PERGOLADO ASSENTAMENTO DE PEITORIL E SOLEIRA		Gerente de Obra						
		Engenheiro 1						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro 3						
		Ajudante Geral 8						
		Calceteiro 4						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
OBSERVAÇÕES		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
GERENTE DE OBRA:		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
Data: 19/06/2024		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
FISCALIZAÇÃO:		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		Veiculo Leve						
		Caminhão Munchk						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
Placa Vibratória								
Data: 19/06/2024		Data: 19/06/2024						

Tony Feitor Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.000.000-77.8

Wendell Simões
05.749.775/0001-00
W&S ENGENHARIA LTDA
RUA INDEPENDÊNCIA, 800 - Centro
13280-000 - Santa Rita - Bahia



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	Q	X	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO													
CONTRATO Nº 011-2024				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022				RDO: 144		CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra									
				Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1									
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ASSENTAMENTO DE PARALELO EXECUÇÃO DE CERÂMICA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO NATURAL EXECUÇÃO DE PASTILHA EXECUÇÃO DO PERGOLADO ASSENTAMENTO DE PEITORIL E SOLEIRA				Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro 4 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro									
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO									
				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO									
				Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 20/06/2024				Data: 20/06/2024									

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA. 052.094/377-8

Wendell Simões Cruz
 3749.775/0001-0
 WSC ENGENHARIA LTDA
 Av. José Augusto Pereira, 808 - Centro
 CEP 44.150-000 - Salvador - Bahia



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data			
				S	T	Q	X
				S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL			
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO							
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 145		CATEGORIA	
Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA	
SÍMBOLOGIA				Gerente de Obra			
1- Tempo Bom				2 - Chuva c/ cond. Trab.			
3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1			
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ASSENTAMENTO DE PARALELO EXECUÇÃO DE CERÂMICA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA INTERTRAVADO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO COLORIDO ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO NATURAL EXECUÇÃO DE PASTILHA EXECUÇÃO DO PERGOLADO ASSENTAMENTO DE PEITORIL E SOLEIRA				Tec. de Segurança			
				Aux Adm			
				Mestre de obra			
				Encarregado geral 1			
				Hh DO DIA			
				MÃO DE OBRA DIRETA			
				Topografo			
				Auxiliar de topografia			
				Pedreiro 3			
				Ajudante Geral 8			
				Calceteiro 4			
				Operador de Motosserra			
				Motorista			
				Montador			
				Montador/Eletricista			
Eletricista							
Operador de Patrol							
Operador de Escavadeira							
Operador de Pá carregadeira							
Motorista de caçamba							
Pintor							
Serralheiro							
Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO			
				EFETIVO DO DIA			
				JORNADA DE TRABALHO			
				Hh DO DIA			
Hh ACUMULADO				EFETIVO EQUIPAMENTOS			
OBSERVAÇÕES				TIPO			
				QTDE			
				Veículo Leve			
				Caminhão Munck			
				Caminhão Toco			
				Escavadeira			
				Pá carregadeira			
				Caçamba			
Patrol							
PC 200							
Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:			
Data: 21/06/2024				Data: 21/06/2024			

Tony F. de
 EN-BA.0026.27.8

Wendell Sampaio
 13.749.775/0001-0
 WUY ENGENHARIA LTDA
 Rua José Augusto Ribeiro, 805 - Graças
 CEP: 44.110-110 Salvador - BA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO								
CONTRATO Nº 011-2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022 RDO: 146								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra						
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra						
		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
Auxiliar de topografia								
Pedreiro								
Ajudante Geral								
Calceteiro								
Operador de Motosserra								
Motorista								
Montador								
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor								
Serralheiro								
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/06/2024		Data: 22/06/2024						

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA. 052011-77.8

Wendel Simões Cruz
 149.775/0001-0
 WENDEL SIMÕES CRUZ
 149.775/0001-0 - Cnpj
 12P - 11.11.10 - 11/2014 - 11/2014



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
								D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO								
CONTRATO Nº 011-2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022 RDO: 147								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra						
SEM SERVIÇO		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
Ajudante Geral								
Calceteiro								
Operador de Motosserra								
Motorista								
Montador								
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor								
Serralheiro								
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/06/2024		Data: 23/06/2024						

Wendel Soares Cruz
 149.775/0001-00
 WSC ENGENHARIA LTDA
 Rua Higienópolis, 800 - Curitiba
 CEP: 81.240-000

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO								
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 148		CATEGORIA		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		QTDE
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra						
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ASSENTAMENTO DE PARALELO EXECUÇÃO DE CERÂMICA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE PASTILHA EXECUÇÃO DE FORRO PLANTIO DE GRAMA PLANTIO DE VEGETAÇÃO		Engenheiro 1						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro 3						
		Ajudante Geral 8						
		Calçeteiro 4						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/06/2024		Data: 24/06/2024						

Wendel Simões Cruz
 13.749.775/0001-00
 ARS ENGENHARIA LTDA
 Rua Higienópolis, 805 - Centro
 CEP: 44.000-000 - Salvador - Bahia

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.054.377-8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO								
CONTRATO Nº 011-2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022 RDO: 149								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ASSENTAMENTO DE PARALELO EXECUÇÃO DE CERÂMICA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE PASTILHA EXECUÇÃO DE FORRO PLANTIO DE GRAMA PLANTIO DE VEGETAÇÃO		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro 4 Operador de Motosserra Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/06/2024		Data: 25/06/2024						

Wendel Simões Cruz
15.749.775/0001-0
AV. SANGUEBANA LTDA
RUA - MARACÁ REFORMA, 805 - Centro
C.P. 4.114-10 - Ilhéus - Bahia

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.065.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	X	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO									
CONTRATO Nº 011-2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022 RDO: 150									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra			1				
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ASSENTAMENTO DE PARALELO EXECUÇÃO DE CERÂMICA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE PASTILHA EXECUÇÃO DE FORRO PLANTIO DE GRAMA PLANTIO DE VEGETAÇÃO EXECUÇÃO DO PONTO DE ONIBUS EXECUÇÃO DO PERGOLADO DO QUIOSQUE INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS		Engenheiro			1				
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral			1				
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro			3				
Ajudante Geral			8						
Calceteiro			4						
Operador de Motosserra									
Motorista									
Montador									
Montador/Eletricista									
Eletricista									
Operador de Patrol									
Operador de Escavadeira									
Operador de Pá carregadeira									
Motorista de caçamba									
Pintor									
Serralheiro									
Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO			QTDE.				
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
PC 200									
Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 26/06/2024		Data: 26/06/2024							

Wendel Sales Cruz
 13.749.775/0001-00
 W&S ENGENHARIA LTDA
 RUA HILGEMARIA LTDA, 800 - Centro
 CEP: 45.000-000 - SANTALUZ - BA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.034.177.R



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO CONTRATO Nº 011-2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022 RDO: 151			EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA						
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ASSENTAMENTO DE PARALELO EXECUÇÃO DE CERÂMICA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE PASTILHA EXECUÇÃO DE FORRO PLANTIO DE GRAMA PLANTIO DE VEGETAÇÃO EXECUÇÃO DO PONTO DE ONIBUS EXECUÇÃO DO PERGOLADO DO QUIOSQUE INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS			Gerente de Obra			1			
			Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral			1			
			Hh DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topografo						
			Auxiliar de topografia						
			Pedreiro			3			
			Ajudante Geral			8			
			Calceteiro			4			
			Operador de Motosserra						
			Operador de Motosserra						
			Motorista						
			Montador						
			Montador/Eletricista						
			Eletricista						
			Operador de Patrol						
			Operador de Escavadeira						
			Operador de Pá carregadeira						
			Motorista de caçamba						
			Pintor						
			Serralheiro						
			Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO						
			EFETIVO DO DIA						
			JORNADA DE TRABALHO						
			Hh DO DIA						
			Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO			QTDE.			
			Veiculo Leve						
			Caminhão Muncik						
			Caminhão Toco						
			Escavadeira						
			Pá carregadeira						
			Caçamba						
			Patrol						
			PC 200						
			Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
Data: 27/06/2024			Data: 27/06/2024						

Wladimir Simões Cruz
 0149.775/0001-0
 W.S. ENGENHARIA LTDA
 Av. Augusto Ribeiro, 808 - Centro
 CEP: 45.120-000 - Salvador - BA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA. 052.014.177/R



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO								
CONTRATO Nº 011-2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022 RDO: 152								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ASSENTAMENTO DE PARALELO EXECUÇÃO DE CERÂMICA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE PASTILHA EXECUÇÃO DE FORRO PLANTIO DE GRAMA PLANTIO DE VEGETAÇÃO EXECUÇÃO DO PONTO DE ONIBUS EXECUÇÃO DO PERGOLADO DO QUIOSQUE INSTALAÇÃO DA PLACA LIMPEZA DA OBRA		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro 4 Operador de Motosserra Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/06/2024		Data: 28/06/2024						

Wendel Simões Cruz
03.749.778/0001
ARL ENGENHARIA LTDA
Avenida Brasil, 800 - Graças
CEP: 41.100-000 Salvador - BA

Tony Felício
Tony Felício
C. O. 11.111.111



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data										
						S	T	Q	Q	S	X	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ																
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO						EFETIVO PESSOAL										
CONTRATO Nº 011-2024						CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022						RDO: 153				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						CATEGORIA						QTDE				
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA										
SEM SERVIÇO						Gerente de Obra										
						Engenheiro										
						Tec. de Segurança										
						Aux Adm										
						Mestre de obra										
						Encarregado geral										
						Hh DO DIA										
						MÃO DE OBRA DIRETA										
						Topografo										
						Auxiliar de topografia										
						Pedreiro										
						Ajudante Geral										
						Calceteiro										
						Operador de Motosserra										
						Operador de Motosserra										
						Motorista										
						Montador										
						Montador/Eletricista										
						Eletricista										
						Operador de Patrol										
						Operador de Escavadeira										
						Operador de Pá carregadeira										
						Motorista de caçamba										
						Pintor										
						Serralheiro										
						Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO										
						EFETIVO DO DIA										
						JORNADA DE TRABALHO										
						Hh DO DIA										
						Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS										
						TIPO							QTDE.			
						Veiculo Leve										
						Caminhão MuncK										
						Caminhão Toco										
						Escavadeira										
						Pá carregadeira										
						Caçamba										
						Patrol										
						PC 200										
						Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:										
Data: 29/06/2024						Data: 29/06/2024										

Wendel Simões Gonçalves
 13.749.775/0001-00
 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 Rua Heliópolis, 800 - Graças
 CEP: 13.147-000 - Santa Luzia - SP

Tony F. A. C.
 CREA/SP 13.147-0001-00



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data								
		S	T	Q	Q	S	S	X		
								D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO										
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 154		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra								
SEM SERVIÇO		Engenheiro								
		Tec. de Segurança								
		Aux Adm								
		Mestre de obra								
		Encarregado geral								
		Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA						
		SEM SERVIÇO		Topografo						
Auxiliar de topografia										
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Calceteiro										
Operador de Motosserra										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA								
		JORNADA DE TRABALHO								
		Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO		QTDE.						
		Veiculo Leve								
		Caminhão Munck								
		Caminhão Toco								
		Escavadeira								
		Pá carregadeira								
		Caçamba								
		Patrol								
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 30/06/2024		Data: 30/06/2024								

Wendel Simões Cruz
 13.749.775/0001
 ARZ ENGENHARIA LTDA
 RUA HILARIO REHEVE, 806 - Centro
 CEP 42.114-100 - Salvador - BA

Tony Felix
 Tony Felix
 Engenheiro
 CREA 174.032/00-0



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ª MEDIÇÃO – CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO- no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/06/2024	Santaluz	Construção da Praça Cândido Cardoso Da Silva e Pavimentação em paralelepípedo no povoado de Mucambinho

Foto 01 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016



Foto 02 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019



Tony Ferreira Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.063.877.8

Wendel Simões Cruz
052.749.775/0001-0
W.S. ENGENHARIA LTDA
Rua Industrial Pimentel, 806 - Graças
1309-10 - Salvador - Bahia



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
30/06/2024	Santaluz	Construção da Praça Cândido Cardoso Da Silva e Pavimentação em paralelepípedo no povoado de Mucambinho

Foto 03 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021



Foto 04 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014



Tony Ferreira Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.058.677.8

Wendell Simões Cruz
13.749.775/0001-0
ARQUITETO
RUA SARGENTANA LTDA
ALFA INDUSTRIAL PARK, 806 - Centro
CIP. 12.112/0 - Salvador - Bahia



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/06/2024	Santaluz	Construção da Praça Cândido Cardoso Da Silva e Pavimentação em paralelepípedo no povoado de Mucambinho

Foto 05 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



Foto 06 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.065.677,8

Wendell Simões Cruz
13.749.775/0001-0
ARQUITETURA
RUA MIGUEL DE MELO, 805 - Centro
Cidade de Santa Luz, Bahia - Brasil




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/06/2024	Santaluz	Construção da Praça Cândido Cardoso Da Silva e Pavimentação em paralelepípedo no povoado de Mucambinho

Foto 07 - CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA



Foto 08 - CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA

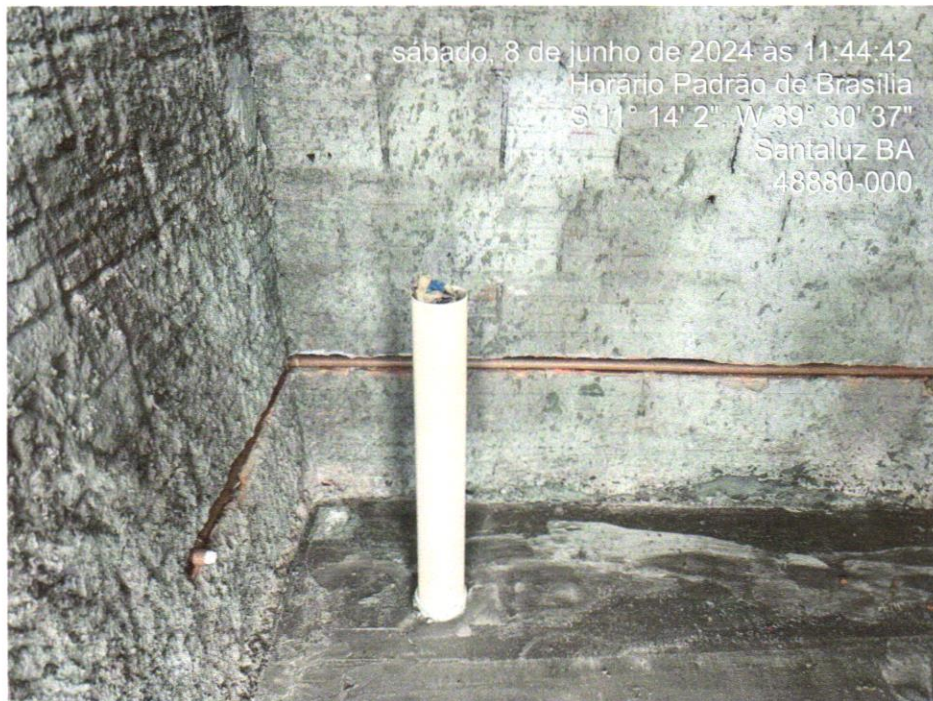

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.012.377.8

Wendel Simões Cruz
 15 749.776/0001-0
 AMZ ENGENHARIA LTDA
 Av. Engenheiro Ribeyrol, 806 - Centro
 CEP 48.800-000 - Santaluz - Bahia



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
30/06/2024	Santaluz	Construção da Praça Cândido Cardoso Da Silva e Pavimentação em paralelepípedo no povoado de Mucambinho

Foto 08 - CAIXAS E RALOS



Foto 09 - CAIXAS E RALOS



Tony F. de A. Andrede
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.063.877.8

Wendel Simões Cruz
13.749.775/0001-0
ARZ: SACENHANA LTDA
RUA: INDEPENDÊNCIA Nº 005 - Centro
Cidade: SANTA LUZ - Bahia




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz	Construção da Praça Cândido Cardoso Da Silva e Pavimentação em paralelepípedo no povoado de Mucambinho

Foto 11 - ESGOTO



Foto 12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

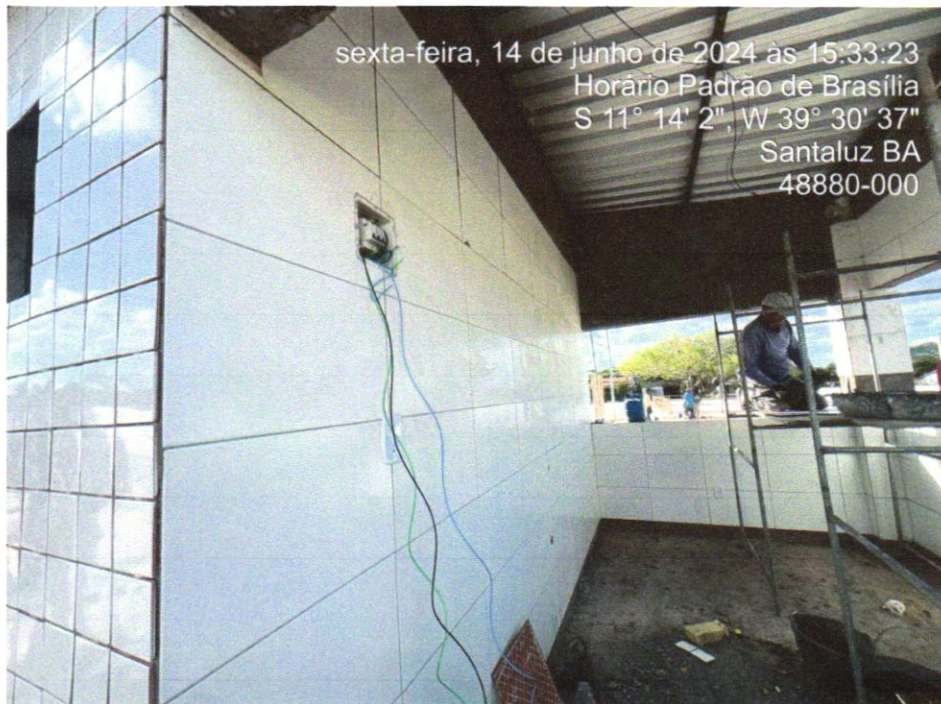

Tory Ferraz Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.042.377.8

Wendel Simões Cruz
 15 749.775/0001-0
 ART: 53827-HANNA LTDA
 Rua Imigração Rêmer, 806 - Centro
 CEP: 48.100-000 - Santana - Bahia



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/06/2024	Santaluz	Construção da Praça Cândido Cardoso Da Silva e Pavimentação em paralelepípedo no povoado de Mucambinho

Foto 13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



Foto 14 - Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada



Wendel Simões Cruz
 35 749.776/0001-00
 ANEX 15/GERMANIA LTDA
 RUA HILFARIO REIS, 806 - Centro
 CEP 48.880-000 - Santaluz - BA

Tony F. Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.058.677.8



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/06/2024	Santaluz	Construção da Praça Cândido Cardoso Da Silva e Pavimentação em paralelepípedo no povoado de Mucambinho

Foto 15 - Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)



Foto 16 – PERGOLADO



Wendel Simões Cruz
 15 749.778/0001-
 ARQUITETURA LTDA
 RUA HILÁRIO RIVIER, 806 - Grupo
 CEP 48800-000 Santaluz - Bahia

Tony Félix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.050.877.8



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/06/2024	Santaluz	Construção da Praça Cândido Cardoso Da Silva e Pavimentação em paralelepípedo no povoado de Mucambinho

Foto 17 – PERGOLADO



Foto 18 – PLAYGROUND



Wendell Simões Cruz
 11 749.775/0001-0
 ANY ENGENHARIA LTDA
 Rua Industrial Roberto, 806 - Cidade
 CEP: 45.120-000 - Salvador - Bahia

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA. 652.652/377.8



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/06/2024	Santaluz	Construção da Praça Cândido Cardoso Da Silva e Pavimentação em paralelepípedo no povoado de Mucambinho

Foto 19 – PLAYGROUND



Foto 20 – Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 052.048-77.8

Wendell Simões Cruz
15.749.775/0001-0
ARV ENGENHARIA LTDA
Rua Industrial Pimenta, 805 - Graças
Cidade de Santa Luz - Maranhão - Brasil



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/06/2024	Santaluz	Construção da Praça Cândido Cardoso Da Silva e Pavimentação em paralelepípedo no povoado de Mucambinho

Foto 21 – EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022



Foto 22 - Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1



Wendel Simões Cruz
 15 749 775/0001
 AN: 57087-1/2014
 RUA INDEPENDÊNCIA, 806 - Centro
 CEP: 45.120-000 - Bahia

Tony F. A. Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA. 032.611/77.8



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/06/2024	Santaluz	Construção da Praça Cândido Cardoso Da Silva e Pavimentação em paralelepípedo no povoado de Mucambinho

Foto 24 - RESERVATÓRIO SUBTERRÂ尼奥



Foto 25 - RESERVATÓRIO SUBTERRÂ尼奥



Wendel Simões Cruz
15 749.775/0001
ARL ENGENHARIA LTDA
Rua Henrique Rêgo, 806 - Centro
CEP: 48.800-000 - Santaluz - Bahia

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.012.577.8



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/06/2024	Santaluz	Construção da Praça Cândido Cardoso Da Silva e Pavimentação em paralelepípedo no povoado de Mucambinho

Foto 27 – ILUMINAÇÃO


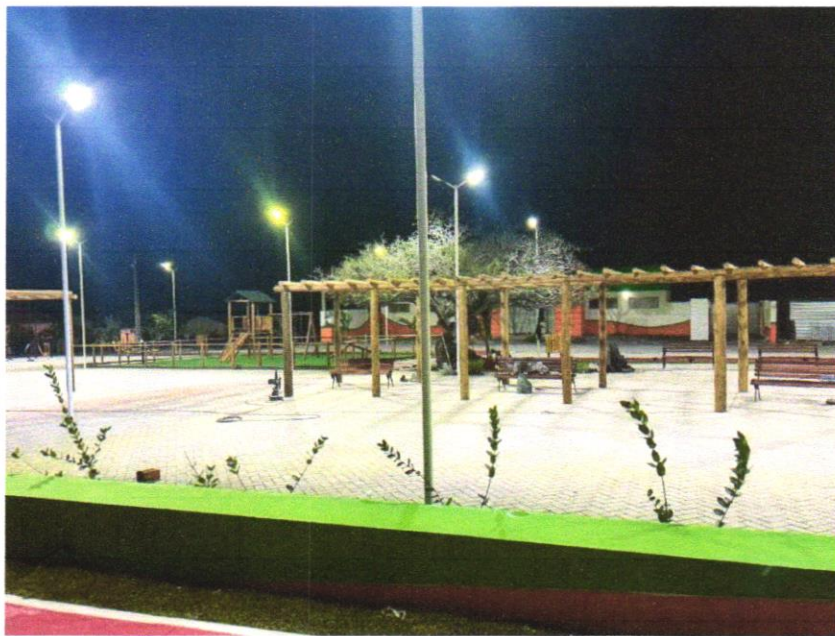


Foto 28 – ILUMINAÇÃO



Wendel Simões Cruz
CPF: 749.775/0001-0
ARQUITETA
RUA HILKARCO RIBEIRO, 806 - Graças
CIP. 11.124-0 Salvador - Bahia

Tony Feltre Andrede
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

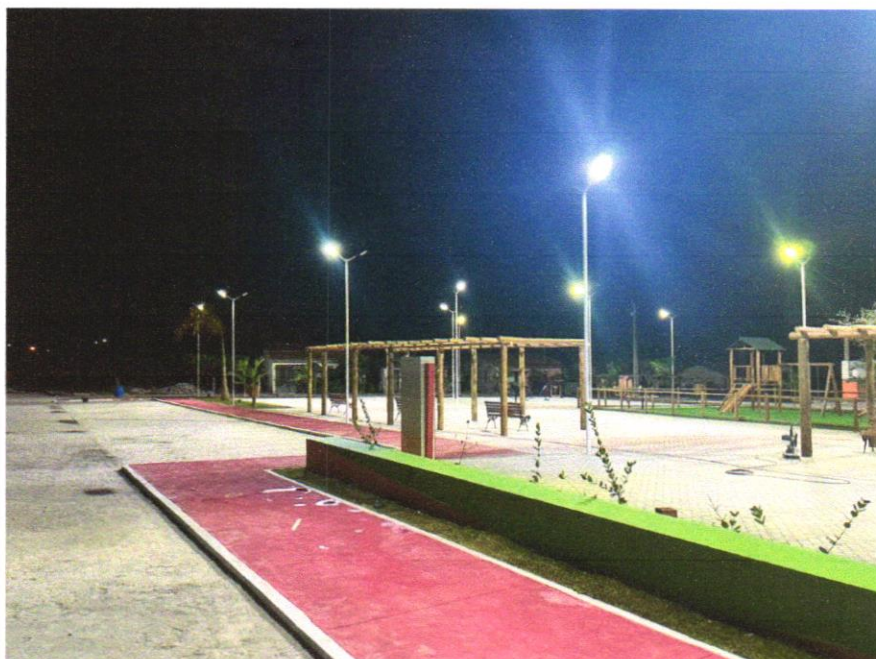

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/06/2024	Santaluz	Construção da Praça Cândido Cardoso Da Silva e Pavimentação em paralelepípedo no povoado de Mucambinho

Foto 29 – PONTO DE ONIBUS



Foto 30 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO



Wendel Simões Goy
13 749.776/0001-0
ARQUITETURA LTDA
RUA MARCELO FERREI, 808 - Graças
1. CEP: 13.140-000 - Santa Luz - SP

Tony Ferraz Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.052.777.8



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/06/2024	Santaluz	Construção da Praça Cândido Cardoso Da Silva e Pavimentação em paralelepípedo no povoado de Mucambinho

Foto 31 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

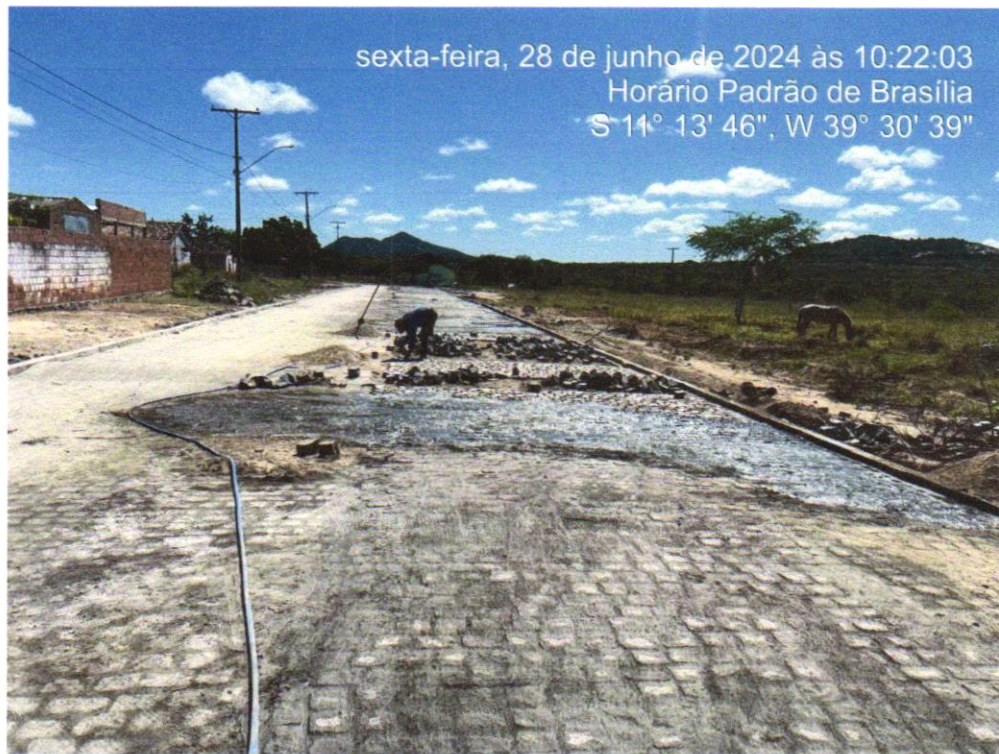


Foto 32 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO



Wendell Simões, Cref
 13.749.775/0001-0
 ARS ENGENHARIA LTDA
 Rua Maranhão Fátima, 806 - Graças
 CEP: 48.800-000 - Santaluz - Bahia

Tony F. de A. Andreão
 Engenheiro Civil
 CREA-BA. 032.642.177.8



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/06/2024	Santaluz	Construção da Praça Cândido Cardoso Da Silva e Pavimentação em paralelepípedo no povoado de Mucambinho

Foto 33 – Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01



Foto 34 – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014



Wendell Simões, Cof
 (35) 749.775/0001-0
 ARTE ENGENHARIA LTDA
 Rua Industrial Rômulo, 906 - Graça
 CEP: 41.150-000 Salvador - Bahia

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA. 052.062.577-8



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/06/2024	Santaluz	Construção da Praça Cândido Cardoso Da Silva e Pavimentação em paralelepípedo no povoado de Mucambinho

Foto 35 – DRENAGEM



Foto 36 – DRENAGEM



Wendel Simões, Cof
 749.775/0001-0
 ANEX 51 GERMANIA LTDA
 RUA HILARÍO RIBEIRO, 806 - GRAJÓ
 CEP 48.100-000 - SANTALUZ - BA

Tony Felix de Andrade
 Engenheiro Civil
 CREM-BA, 052.052.377.8

