



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO: 260 / 2023

Data do Empenho: 06/03/2023

PROCESSO ADM:

146-2022

FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673

Cidade:
CPF:

Tipo Pessoa: Jurídica
Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Estado:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico

Convênio:

Patrimônio: -

Nº Lic.: 013-2022PE

Contrato:

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

165.534,96

165.534,96

0,00

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº036-2022, LICITAÇÃO Nº013-2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/02/2023 A 28/02/2023, NFS-e.Nº375.

Data do Empenho: 06/03/2023

Data do Liquidação: 06/03/2023

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FME FONTE 19	
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	2.483,02
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	4.966,05
		10.925,31

Cento e quarenta e sete mil e cento e sessenta reais e cinquenta e oito centavos

Valor Retido

18.374,38

Valor Líquido

147.160,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	01/03/2023	375	UN			165.534,96

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	165.534,96

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 06/03/2023.

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Educação
Matrícula: 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 06/03/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

3142295



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 260 / 2023

Data do Empenho: 06/03/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES EIRELI
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673
Cidade: Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
CPF: Estado:
RG:
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico

Convênio: Nº Lic.: 013-2022PE

Patrimônio: -

Contrato:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.534,96	165.534,96	0,00

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº036-2022, LICITAÇÃO Nº013-2022.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	165.534,96	165.534,96

Cento e sessenta e cinco mil e quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos

165.534,96

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 06/03/2023.

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Educação
Matrícula: 0598

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 06/03/2023

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

3142295



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000375
 Data e Hora de Emissão:
01/03/2023 15:46:43
 Código de Verificação:
YQB7-UJCI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
24.597.344/0001-98
 Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUCOES LTDA
 Endereço:
Ave Tancredo Neves 2539 , EDIF COND.CEO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021 - BA
 E-mail:
dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:
561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICIPIO DE SANTALUZ
 CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19
 Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
 E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIAS INEFERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
 Reforma da Secretaria Municipal de Educação e a Biblioteca
 PREGÃO ELETRÔNICOº 013/2022 Processo administrativo nº 146/2022 Manutenção de prédios públicos
 BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, PERÍODO 01/02/2023 a 28/02/2023
 VALOR TOTAL: R\$ 165.534,96
 Valor Material 40%: R\$ 66.213,98
 Base de cálculo do INSS 60%: 99.320,98 x 11% R\$: 10.925,31
 Valor do ISS 5%: R\$ 4.966,05
 Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$165.534,96

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$): 66.213,98	Base de Cálculo (R\$): 99.320,98	Alíquota (%): 5,00%	Valor do ISS (R\$): 4.966,05	Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00
---	--	-------------------------------	--	---

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 10.925,31	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 0,00	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras Retenções (R\$): 4.966,05	Valor Líquido (R\$): 149.643,60
---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--	---

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 03/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
- A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

M / /
 Assinatura



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/02/2023 à 28/02/2023

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Nº DA OBRA: 006/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

Nº DO CONTRATO: 036/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ: 24-597.344/0001-98

VALOR DA 3ª MEDIÇÃO: R\$

165.534,96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 03		AGUMLADO	SALDO	%
						QTDE	PREÇO TOTAL			
1.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1	Demolição de piso de alta resistência	m²	15,30	R\$ 17,84	R\$ 272,90	0,00	R\$ -	R\$ 272,90	R\$ -	0,00%
1.1.2	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	95,83	R\$ 4,92	R\$ 471,67	0,00	R\$ -	R\$ 471,67	R\$ -	0,00%
1.2	SUBTOTAL				R\$ 744,57					
	INFRAESTRUTURA									
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	m³	0,15	R\$ 97,14	R\$ 14,57	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,57	0,005%
1.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM, AF_08/2017	m²	0,245	R\$ 20,51	R\$ 5,02	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,02	0,002%
1.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM FOLIO PARA TEPIDACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESSIVO) COM PREPARO EM BETONERA 400L, AF_06/2014	m²	2,16	R\$ 7,34	R\$ 15,85	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,85	0,01%
1.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO, AF_06/2017	m³	0,72	R\$ 401,11	R\$ 288,80	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,80	0,10%
1.2.5	REATERRO MANUAL DE VILAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	m³	0,04	R\$ 37,88	R\$ 1,52	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,52	0,001%
1.2.6	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), PCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	0,29	R\$ 2.567,32	R\$ 744,52	0,29	R\$ 744,52	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.3	SUBTOTAL				R\$ 1.072,28					
	PINTURA									
1.3.1	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONERA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	2,16	R\$ 2672	R\$ 5771	2,16	R\$ 5771	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.3.2	Preparo de superfície com liamento de paredes e tetos	m²	346,04	R\$ 2,90	R\$ 1.002,37	346,04	R\$ 1.002,37	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.3.3	Pintura de acabamento com liamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Svinil ou similar)	m²	41,14	R\$ 18,37	R\$ 756,66	41,14	R\$ 756,66	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	346,04	R\$ 15,19	R\$ 5.256,00	346,04	R\$ 5.256,00	R\$ -	R\$ -	0,00%

Bruno de Matos Santos
Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


1.3.5	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m²	346,04	R\$ 9,41	R\$ 3.257,00	346,04	R\$	3.257,00	R\$	3.257,00	R\$	0,00%
1.3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	177,56	R\$ 17,31	R\$ 3.072,76	177,56	R\$	3.072,76	R\$	3.072,76	R\$	0,00%
1.4	SUBTOTAL				R\$ 13.401,50							
1.4.1	Piso alta resistência para piso ou parede, 60 x 60 cm, Pulpê Bege Brilhante, Pointer ou similar, argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	32,20	R\$ 61,66	R\$ 1.985,47	0,00	R\$	-	R\$	1.985,47	R\$	0,68%
1.4.2	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	32,20	R\$ 21,12	R\$ 679,91	0,00	R\$	-	R\$	679,91	R\$	0,23%
1.4.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, Pulpê Bege Brilhante, Pointer ou similar, aplicado com argamassa industrializada aci, rejuntado, exclusive regularização do base ou emboco	m2	92,80	R\$ 69,22	R\$ 6.330,60	0,00	R\$	-	R\$	6.330,60	R\$	0,00%
1.5	SUBTOTAL				R\$ 8.995,98							
1.5.1	Condição de vedação em silicone	m	66,47	R\$ 1,45	R\$ 96,45	66,47	R\$	96,45	R\$	96,45	R\$	0,00%
1.5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2015	UN	2	R\$ 1.106,81	R\$ 2.213,61	2,00	R\$	2.213,61	R\$	2.213,61	R\$	0,00%
1.5.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2015	UN	4	R\$ 1.155,06	R\$ 4.620,24	4,00	R\$	4.620,24	R\$	4.620,24	R\$	0,00%
1.5.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2015	UN	4	R\$ 1.233,38	R\$ 4.933,52	4,00	R\$	4.933,52	R\$	4.933,52	R\$	0,00%
1.5.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIÇA E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2018	M2	5,25	R\$ 246,51	R\$ 1.284,18	0,00	R\$	-	R\$	1.284,18	R\$	0,44%
1.6	SUBTOTAL				R\$ 13.161,00							
1.6.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	R\$ 43,10	R\$ 86,20	2,00	R\$	86,20	R\$	86,20	R\$	0,00%
1.6.2	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/ caixa de descarga de sobrep, AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embufe e enjate plástico - Rev 03	un	2	R\$ 405,69	R\$ 811,37	2,00	R\$	811,37	R\$	811,37	R\$	0,00%
1.6.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	17,40	R\$ 31,65	R\$ 550,52	17,40	R\$	550,52	R\$	550,52	R\$	0,00%
1.6.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	44,77	R\$ 61,43	R\$ 2.749,84	44,77	R\$	2.749,84	R\$	2.749,84	R\$	0,00%
1.6.5	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com lâmpa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	2	R\$ 51,33	R\$ 102,65	2,00	R\$	102,65	R\$	102,65	R\$	0,00%
1.6.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	UN	3	R\$ 8,20	R\$ 24,60	3,00	R\$	24,60	R\$	24,60	R\$	0,00%
1.6.7	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	2	R\$ 14,45	R\$ 28,90	2,00	R\$	28,90	R\$	28,90	R\$	0,00%
1.6.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	UN	6	R\$ 20,45	R\$ 122,71	6,00	R\$	122,71	R\$	122,71	R\$	0,00%

Bruno


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

BRUNO DE MATOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA Nº 051888958-0


1.8.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM FRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_122014	UN	9	R\$ 7,48	R\$ 67,30	9,00	R\$	R\$	87,30	R\$	R\$	0,00%
1.8.10	Caixa de inspeção, 0,60 x 0,60 x 0,80mm	un	3	R\$ 588,97	R\$ 1.760,90	3,00	R\$	R\$	1.760,90	R\$	R\$	0,00%
1.8.11	Junção simples pvc rígido soldável para esgoto secundário ø 150x100mm	un	2	R\$ 99,73	R\$ 199,47	2,00	R\$	R\$	199,47	R\$	R\$	0,00%
1.8.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	5	R\$ 23,77	R\$ 118,86	5,00	R\$	R\$	118,86	R\$	R\$	0,00%
1.8.13	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro = 50mm	un	2	R\$ 12,62	R\$ 25,25	2,00	R\$	R\$	25,25	R\$	R\$	0,00%
1.8.14	Caixa de gordura, 0,60 x 0,60 x 0,80mm	un	1	R\$ 588,97	R\$ 588,97	1,00	R\$	R\$	588,97	R\$	R\$	0,00%
1.8.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	M	22,61	R\$ 19,70	R\$ 445,23	22,61	R\$	R\$	445,23	R\$	R\$	0,00%
1.8.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	M	41,89	R\$ 23,31	R\$ 976,77	41,89	R\$	R\$	976,77	R\$	R\$	0,00%
1.8.17	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	M	9,88	R\$ 33,32	R\$ 332,50	9,88	R\$	R\$	332,50	R\$	R\$	0,00%
1.8.18	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_122014	M	11,03	R\$ 23,35	R\$ 257,41	11,03	R\$	R\$	257,41	R\$	R\$	0,00%
1.8.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	1	R\$ 7,89	R\$ 7,89	1,00	R\$	R\$	7,89	R\$	R\$	0,00%
1.8.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	24	R\$ 9,43	R\$ 226,29	24,00	R\$	R\$	226,29	R\$	R\$	0,00%
1.8.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	4	R\$ 13,16	R\$ 52,66	4,00	R\$	R\$	52,66	R\$	R\$	0,00%
1.8.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_122014	UN	2	R\$ 11,21	R\$ 22,43	2,00	R\$	R\$	22,43	R\$	R\$	0,00%
1.8.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	7	R\$ 19,51	R\$ 136,54	7,00	R\$	R\$	136,54	R\$	R\$	0,00%
1.8.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	15	R\$ 9,25	R\$ 138,69	15,00	R\$	R\$	138,69	R\$	R\$	0,00%
1.8.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM FRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	2	R\$ 20,76	R\$ 41,52	2,00	R\$	R\$	41,52	R\$	R\$	0,00%
1.8.26	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	1	R\$ 10,96	R\$ 10,96	1,00	R\$	R\$	10,96	R\$	R\$	0,00%
1.8.27	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	1	R\$ 6,81	R\$ 6,81	1,00	R\$	R\$	6,81	R\$	R\$	0,00%
1.8.28	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	1	R\$ 11,50	R\$ 11,50	1,00	R\$	R\$	11,50	R\$	R\$	0,00%
1.8.29	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM FRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	1	R\$ 10,05	R\$ 10,05	1,00	R\$	R\$	10,05	R\$	R\$	0,00%
1.8.30	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, AF_092016	UN	2	R\$ 132,70	R\$ 265,40	2,00	R\$	R\$	265,40	R\$	R\$	0,00%
1.8.31	REGISTRO DE SANETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", CCM ACABAMENTO E CAIXOLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_122014	UN	10	R\$ 98,39	R\$ 983,88	10,00	R\$	R\$	983,88	R\$	R\$	0,00%
1.8.32	HIDRÔMETRO DN 25 (P), 5,0 MPH FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_112016	UN	1	R\$ 223,36	R\$ 223,36	1,00	R\$	R\$	223,36	R\$	R\$	0,00%
1.7	SUBTOTAL											
1.7.1	Luminária fluorescente de embutir c/ abajur 2 x 20 w (letrinox ref:lf-6440 ou o similar), completa	un	18	R\$ 242,24	R\$ 4.360,24	18,00	R\$	R\$	4.360,24	R\$	R\$	0,00%


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

1.7.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	13	R\$ 24,24	R\$ 315,18	13,00	R\$	315,18	13,00	R\$	315,18	R\$	315,18	R\$	-	0,00%
1.7.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1	R\$ 29,18	R\$ 29,18	1,00	R\$	29,18	1,00	R\$	29,18	R\$	29,18	R\$	-	0,00%
1.7.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	3	R\$ 25,55	R\$ 76,64	3,00	R\$	76,64	3,00	R\$	76,64	R\$	76,64	R\$	-	0,00%
1.7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	16,78	R\$ 11,59	R\$ 194,43	16,78	R\$	194,43	16,78	R\$	194,43	R\$	194,43	R\$	-	0,00%
1.7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	120,60	R\$ 9,51	R\$ 1.147,12	120,60	R\$	1.147,12	120,60	R\$	1.147,12	R\$	1.147,12	R\$	-	0,00%
1.7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	450,30	R\$ 4,27	R\$ 1.921,07	450,30	R\$	1.921,07	450,30	R\$	1.921,07	R\$	1.921,07	R\$	-	0,00%
1.8	SUBTOTAL				R\$ 8.043,88											
1.8.1	Revisão em cobertura com selo cerâmica tipo colônial, cor clara, 1", lã mineral ou similar, com respigado de 30% do material - Rev 04	m²	355,11	R\$ 96,42	R\$ 34.950,42	0,00	R\$		355,11	R\$	34.950,42	R\$	34.950,42	R\$	-	0,00%
1.8.2	Forno de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob coberturas, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m²	355,11	R\$ 40,57	R\$ 14.406,95	106,54	R\$	4.322,37	355,11	R\$	14.406,95	R\$	14.406,95	R\$	-	0,00%
1.9	SUBTOTAL SERVIÇOS FINAIS				R\$ 49.357,38											
1.9.1	Limpeza geral	m²	355,11	R\$ 2,25	R\$ 798,75	355,11	R\$	798,75	355,11	R\$	798,75	R\$	798,75	R\$	-	0,00%
2.0	SUBTOTAL BIBLIOTECA															
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
2.1.1	Demolição de piso de alta resistência	m²	87,20	R\$ 17,84	R\$ 1.568,63	0,00	R\$		87,20	R\$	1.568,63	R\$	1.568,63	R\$	-	0,00%
2.1.2	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_122017	m²	191,66	R\$ 4,92	R\$ 943,33	0,00	R\$		191,66	R\$	943,33	R\$	943,33	R\$	-	0,00%
2.2	SUBTOTAL INFRAESTRUTURA				R\$ 2.141,96											
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_062017	m³	0,30	R\$ 97,14	R\$ 29,14	0,00	R\$		0,00	R\$	29,14	R\$	29,14	R\$	-	0,01%
2.2.2	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_062017	m²	0,49	R\$ 20,51	R\$ 10,05	0,00	R\$		0,00	R\$	10,05	R\$	10,05	R\$	-	0,003%
2.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLÔ PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_062014	m²	4,32	R\$ 7,34	R\$ 31,70	0,00	R\$		0,00	R\$	31,70	R\$	31,70	R\$	-	0,01%
2.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERVADE, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_062017	m³	1,44	R\$ 401,11	R\$ 577,59	0,00	R\$		0,00	R\$	577,59	R\$	577,59	R\$	-	0,20%
2.2.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_042016	m³	0,06	R\$ 37,89	R\$ 3,03	0,00	R\$		0,00	R\$	3,03	R\$	3,03	R\$	-	0,001%
2.2.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_012017	m³	0,58	R\$ 2.897,32	R\$ 1.680,05	0,00	R\$		0,00	R\$	1.680,05	R\$	1.680,05	R\$	-	0,51%
2.3	SUBTOTAL PINTURA				R\$ 2.140,56											
2.3.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_062014	m²	4,32	R\$ 26,72	R\$ 115,42	4,32	R\$	115,42	4,32	R\$	115,42	R\$	115,42	R\$	-	0,00%
2.3.2	Preparo de superfície com liamento de paredes e tetos	m²	692,07	R\$ 2,90	R\$ 2.004,72	692,07	R\$	2.004,72	692,07	R\$	2.004,72	R\$	2.004,72	R\$	-	0,00%
2.3.3	Pintura de acabamento com liamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre massa (Suvitli ou similar)	m²	82,28	R\$ 18,37	R\$ 1.511,31	82,28	R\$	1.511,31	82,28	R\$	1.511,31	R\$	1.511,31	R\$	-	0,00%
2.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_062014	m²	692,07	R\$ 15,19	R\$ 10.511,85	692,07	R\$	10.511,85	692,07	R\$	10.511,85	R\$	10.511,85	R\$	-	0,00%


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

2.3.5	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, boamento e retoques - R1	m²	892,07	R\$ 9,41	R\$ 6.513,90	892,07	R\$ 6.513,90	892,07	R\$ 6.513,90	0,00%
2.3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_09/2014	M2	389,69	R\$ 17,31	R\$ 6.743,78	389,69	R\$ 6.743,78	389,69	R\$ 6.743,78	0,00%
2.4	SUBTOTAL PISO				R\$ 27.400,88					
2.4.1	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, corum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	67,23	R\$ 61,86	R\$ 4.143,80	0,00	R\$ 4.143,80	0,00	R\$ 4.143,80	1,42%
2.4.2	Poinmento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	67,20	R\$ 21,12	R\$ 1.418,84	0,00	R\$ 1.418,84	0,00	R\$ 1.418,84	0,49%
2.4.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, Pulpis Bege Brillhante, Pontes ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou esboço	m2	238,75	R\$ 68,22	R\$ 16.286,89	0,00	R\$ 16.286,89	238,75	R\$ 16.286,89	0,00%
2.5	SUBTOTAL ESQUADRIAS				R\$ 21.849,52					
2.5.1	Cordão de vedação em silicone	m	136,84	R\$ 1,45	R\$ 198,81	136,84	R\$ 198,81	136,84	R\$ 198,81	0,00%
2.5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,6CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2015	UN	3	R\$ 1.106,81	R\$ 3.320,42	3,00	R\$ 3.320,42	3,00	R\$ 3.320,42	0,00%
2.5.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,6CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8	R\$ 1.155,06	R\$ 9.240,49	8,00	R\$ 9.240,49	8,00	R\$ 9.240,49	0,00%
2.5.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,6CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9	R\$ 1.233,38	R\$ 11.100,42	9,00	R\$ 11.100,42	9,00	R\$ 11.100,42	0,00%
2.5.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E PERGAMINIS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M2	10,5	R\$ 246,51	R\$ 2.588,36	0,00	R\$ 2.588,36	0,00	R\$ 2.588,36	0,85%
2.6	SUBTOTAL HIDROSSANITÁRIA				R\$ 28.448,64					
2.6.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2020	UN	4	R\$ 43,10	R\$ 172,41	4,00	R\$ 172,41	4,00	R\$ 172,41	0,00%
2.6.2	Visco sanitário convencional, linha popular, c/abaia de descarga do sobrolho AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico - Rev.03	un	4	R\$ 405,69	R\$ 1.622,75	4,00	R\$ 1.622,75	4,00	R\$ 1.622,75	0,00%
2.6.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	34,79	R\$ 31,65	R\$ 1.101,03	34,79	R\$ 1.101,03	34,79	R\$ 1.101,03	0,00%
2.6.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	89,53	R\$ 61,43	R\$ 5.499,68	89,53	R\$ 5.499,68	89,53	R\$ 5.499,68	0,00%
2.6.5	Cuba sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	4	R\$ 51,33	R\$ 205,31	4,00	R\$ 205,31	4,00	R\$ 205,31	0,00%
2.6.6	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	R\$ 8,20	R\$ 49,20	6,00	R\$ 49,20	6,00	R\$ 49,20	0,00%
2.6.7	RALO SFONADO PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	R\$ 14,45	R\$ 57,80	4,00	R\$ 57,80	4,00	R\$ 57,80	0,00%
2.6.8	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	11	R\$ 20,45	R\$ 224,96	11,00	R\$ 224,96	11,00	R\$ 224,96	0,00%
2.6.9	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	18	R\$ 7,48	R\$ 134,61	18,00	R\$ 134,61	18,00	R\$ 134,61	0,00%


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

2.8.10	Caixa de inspeção 0,80x0,60x0,60mm	un	6	R\$ 986,97	R\$ 3.521,81	R\$ 6,00	R\$ 3.521,81	R\$ 6,00	R\$ 3.521,81	R\$ -	0,00%
2.8.11	Junção simples pvc rígido soldável para esgoto secundário ø 150x100mm	un	3	R\$ 99,73	R\$ 299,20	3,00	R\$ 299,20	3,00	R\$ 299,20	R\$ -	0,00%
2.8.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	9	R\$ 23,77	R\$ 213,94	9,00	R\$ 213,94	9,00	R\$ 213,94	R\$ -	0,00%
2.8.13	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro = 5 0mm	un	3	R\$ 12,82	R\$ 37,87	3,00	R\$ 37,87	3,00	R\$ 37,87	R\$ -	0,00%
2.8.14	Caixa de gordura 0,60 x 0,60 x 0,60mm	un	1	R\$ 586,97	R\$ 586,97	1,00	R\$ 586,97	1,00	R\$ 586,97	R\$ -	0,00%
2.8.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	M	45,21	R\$ 19,70	R\$ 890,45	45,21	R\$ 890,45	45,21	R\$ 890,45	R\$ -	0,00%
2.8.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	M	83,79	R\$ 23,31	R\$ 1.953,54	83,79	R\$ 1.953,54	83,79	R\$ 1.953,54	R\$ -	0,00%
2.8.17	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	M	19,95	R\$ 33,32	R\$ 664,89	19,95	R\$ 664,89	19,95	R\$ 664,89	R\$ -	0,00%
2.8.18	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA FLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_122014	M	22,05	R\$ 23,35	R\$ 514,82	22,05	R\$ 514,82	22,05	R\$ 514,82	R\$ -	0,00%
2.8.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	1	R\$ 7,89	R\$ 7,89	1,00	R\$ 7,89	1,00	R\$ 7,89	R\$ -	0,00%
2.8.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	48	R\$ 9,43	R\$ 452,58	48,00	R\$ 452,58	48,00	R\$ 452,58	R\$ -	0,00%
2.8.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	8	R\$ 13,16	R\$ 105,31	8,00	R\$ 105,31	8,00	R\$ 105,31	R\$ -	0,00%
2.8.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA FLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_122014	UN	4	R\$ 11,21	R\$ 44,85	4,00	R\$ 44,85	4,00	R\$ 44,85	R\$ -	0,00%
2.8.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	14	R\$ 19,51	R\$ 273,07	14,00	R\$ 273,07	14,00	R\$ 273,07	R\$ -	0,00%
2.8.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	28	R\$ 9,25	R\$ 258,14	28,00	R\$ 258,14	28,00	R\$ 258,14	R\$ -	0,00%
2.8.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM FRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	4	R\$ 20,76	R\$ 83,03	4,00	R\$ 83,03	4,00	R\$ 83,03	R\$ -	0,00%
2.8.26	LUA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	1	R\$ 10,96	R\$ 10,96	1,00	R\$ 10,96	1,00	R\$ 10,96	R\$ -	0,00%
2.8.27	LUA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	2	R\$ 6,81	R\$ 13,63	2,00	R\$ 13,63	2,00	R\$ 13,63	R\$ -	0,00%
2.8.28	LUA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	1	R\$ 11,50	R\$ 11,50	1,00	R\$ 11,50	1,00	R\$ 11,50	R\$ -	0,00%
2.8.29	LUA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM FRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	1	R\$ 10,05	R\$ 10,05	1,00	R\$ 10,05	1,00	R\$ 10,05	R\$ -	0,00%
2.8.30	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, AF_06/2016	UN	4	R\$ 132,70	R\$ 530,80	4,00	R\$ 530,80	4,00	R\$ 530,80	R\$ -	0,00%
2.8.31	REGISTRO DE GAVETABRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANGOLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_122014	UN	19	R\$ 96,39	R\$ 1.860,38	19,00	R\$ 1.860,38	19,00	R\$ 1.860,38	R\$ -	0,00%
2.8.32	HIDRÔMETRO DN 25 (ø), 5,0 MPH FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	UN	1	R\$ 223,36	R\$ 223,36	1,00	R\$ 223,36	1,00	R\$ 223,36	R\$ -	0,00%
SUBTOTAL											
INSTALAÇÕES ELÉTRICA											
2.7.1	Luminária fluorescente de embutir c/ abajur 2 x 20 w (tecnologia ref:flp-6440 ou similar), completa	un	69,00	R\$ 242,24	R\$ 16.714,25	69,00	R\$ 16.714,25	69,00	R\$ 16.714,25	R\$ -	0,00%
2.7.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	28,00	R\$ 24,24	R\$ 630,35	28,00	R\$ 630,35	28,00	R\$ 630,35	R\$ -	0,00%
2.7.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	2,00	R\$ 29,18	R\$ 58,37	2,00	R\$ 58,37	2,00	R\$ 58,37	R\$ -	0,00%

Bruno

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

BRUNO DE MATOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA Nº 051888958-0

2.7.4	TOMADA BAIXA DE EMBUIR (1 MÓDULO), 2P+1T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	6,00	R\$ 25,55	R\$ 153,28	6,00	R\$	153,28	6,00	R\$	153,28	R\$	0,05%
2.7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM, ANTI-CHAMA 0,671,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	33,56	R\$ 11,59	R\$ 388,85	33,56	R\$	388,85	33,56	R\$	388,85	R\$	0,00%
2.7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	181,94	R\$ 9,51	R\$ 1.540,34	181,94	R\$	1.540,34	181,94	R\$	1.540,34	R\$	0,00%
2.7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	1516,51	R\$ 4,27	R\$ 6.469,73	1516,51	R\$	6.469,73	1516,51	R\$	6.469,73	R\$	0,00%
2.8	SUBTOTAL				R\$ 26.965,14								
	COBERTURA												
2.8.1	Revestimento em cobertura com telha cerâmica tipo colonial, cor clara, 1ª, laticinialina ou similar, com reposição de 8% de material. - Rev 04	m²	389,69	R\$ 96,42	R\$ 39.353,84	0,00	R\$	-	389,69	R\$	38.353,84	R\$	0,00%
2.8.2	Fôrro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m²	389,69	R\$ 40,57	R\$ 15.809,88	389,69	R\$	15.809,88	389,69	R\$	15.809,88	R\$	0,00%
2.8.3	Pringedor metálico em Perfil Alumínio U=25,4mm x 3,2mm x 0,604kg/m	m	55,00	R\$ 45,87	R\$ 2.522,62	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.522,62
2.9	SUBTOTAL				R\$ 56.686,30								
2.9.1	Serviços finais	m²	389,69	R\$ 2,25	R\$ 876,53	389,69	R\$	876,53	389,69	R\$	876,53	R\$	0,00%
	Limpeza geral												
	TOTAL GERAL				292.114,08			165.534,96			275.014,87	R\$	4,41%

Bruno

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO – Reforma da Secretaria de Educação e a Biblioteca.

Contrato de Manutenção de Prédios Público, Conforme Contrato nº 036/2022, Licitação nº 013/2022, no Município de Santaluz - BA.


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/02/2023	Santaluz	Reforma da Secretaria de Educação e biblioteca



Foto 01 – Fachada Principal BIBLIOTECA. (ANTES)



Foto 02 – Pintura da Fachada Principal BIBLIOTECA. (DEPOIS)


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA




DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
28/02/2023	Santaluz	Reforma da Secretaria de Educação e biblioteca




Foto 03 – Ambiente Interno BIBLIOTECA.



Foto 04 – Ambiente Interno BIBLIOTECA (ILUMINAÇÃO AMBIENTE PRINCIPAL)


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
28/02/2023	Santaluz	Reforma da Secretaria de Educação e biblioteca

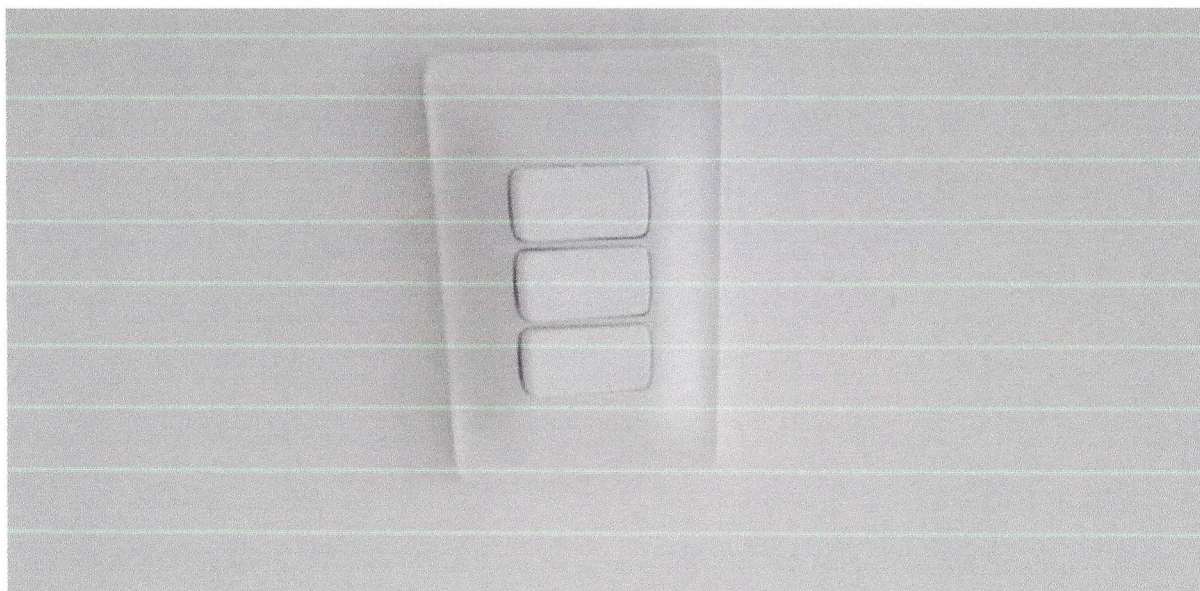


Foto 05 – Interruptor BIBLIOTECA.



Foto 06 – Tomada BIBLIOTECA.

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Foto 07 – Iluminação Salas BIBLIOTECA.

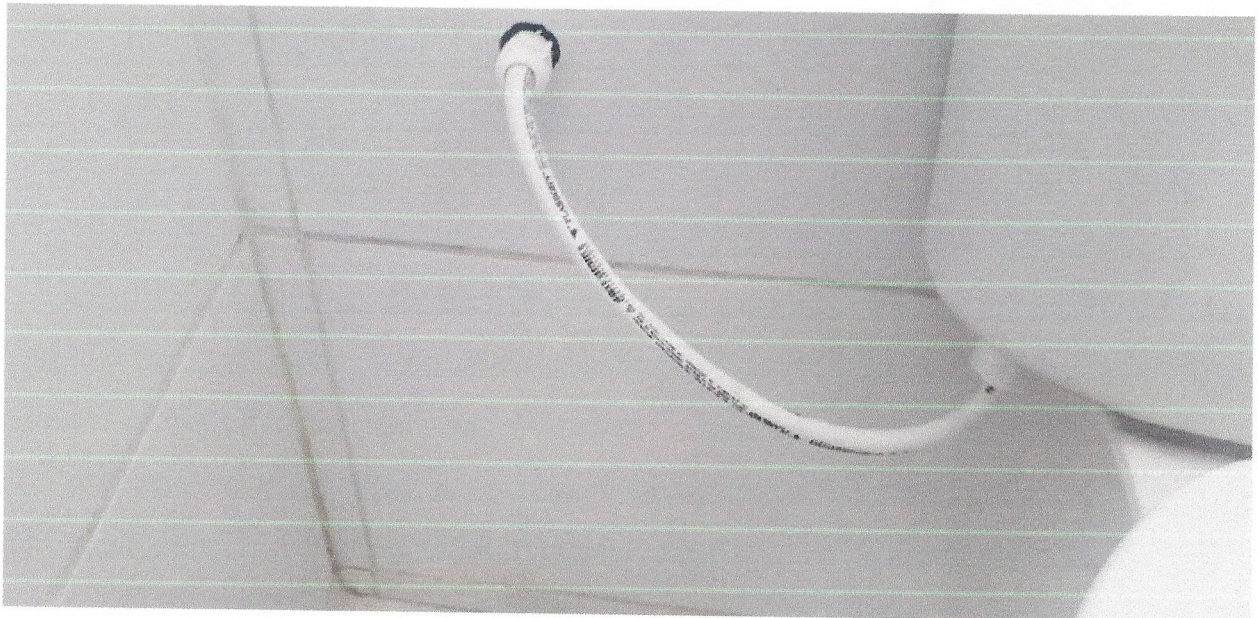


Foto 08 – Instalação Hidraulica BIBLIOTECA

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/02/2023	Santaluz	Reforma da Secretaria de Educação e biblioteca

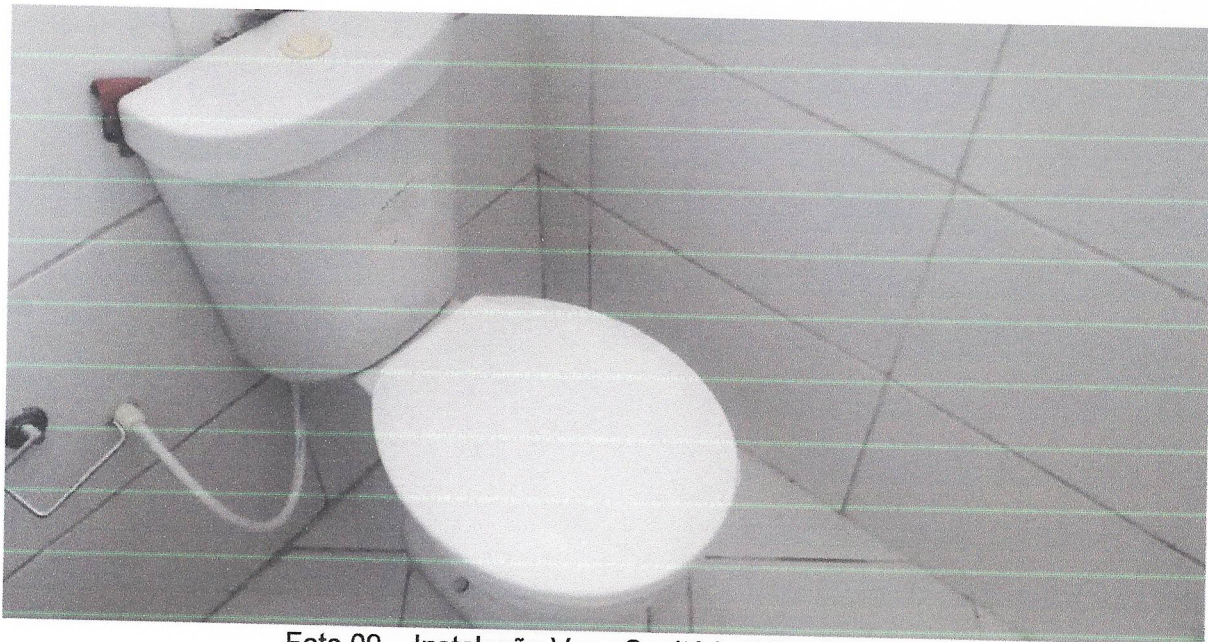


Foto 09 – Instalação Vaso Sanitário BIBLIOTECA.

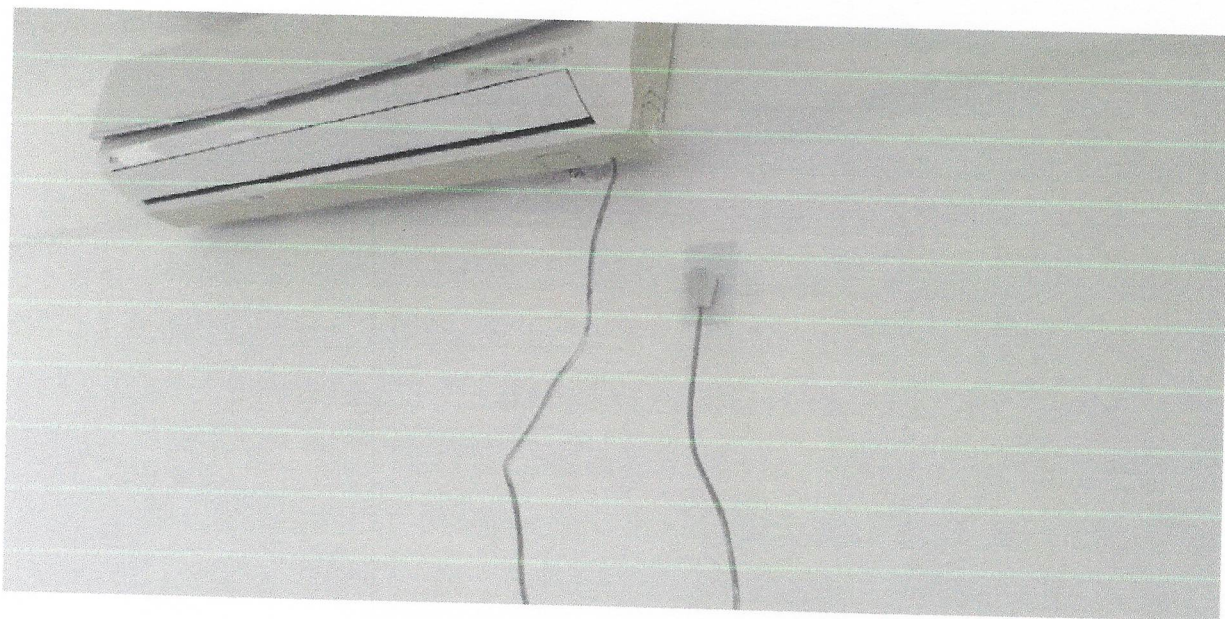


Foto 10 – Instalação Tomada BIBLIOTECA.


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



SANTALUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
28/02/2023




Foto 11 – Instalação Porta de Alumínio BIBLIOTECA.



Foto 12 Pintura e instalação de novos pontos de iluminação - Cinema BIBLIOTECA.


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0




Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Foto 13 – Fachada Principal SECRETARIA. (ANTES)



Foto 14 – Pintura da fachada da SECRETARIA. (DEPOIS)


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

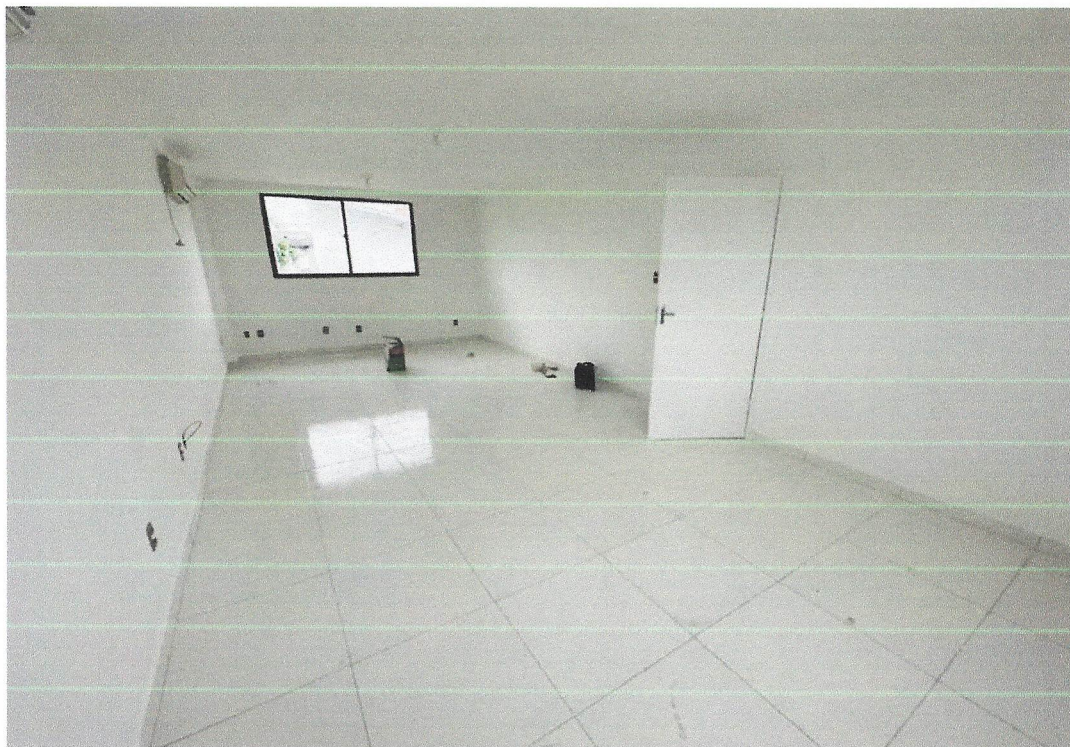


Foto 17 – Pintura de Paredes e Portas SECRETARIA.



Foto 18 – Parede de Gesso. SECRETARIA (Instalação e Pintura).

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



Foto 19 – Pintura escada e guarda-corpo - SECRETARIA.



Foto 20 – Instalação Porta de Alumínio Banheiro, SECRETARIA.


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0






Foto 21 – Instalação Sanitário SECRETARIA.

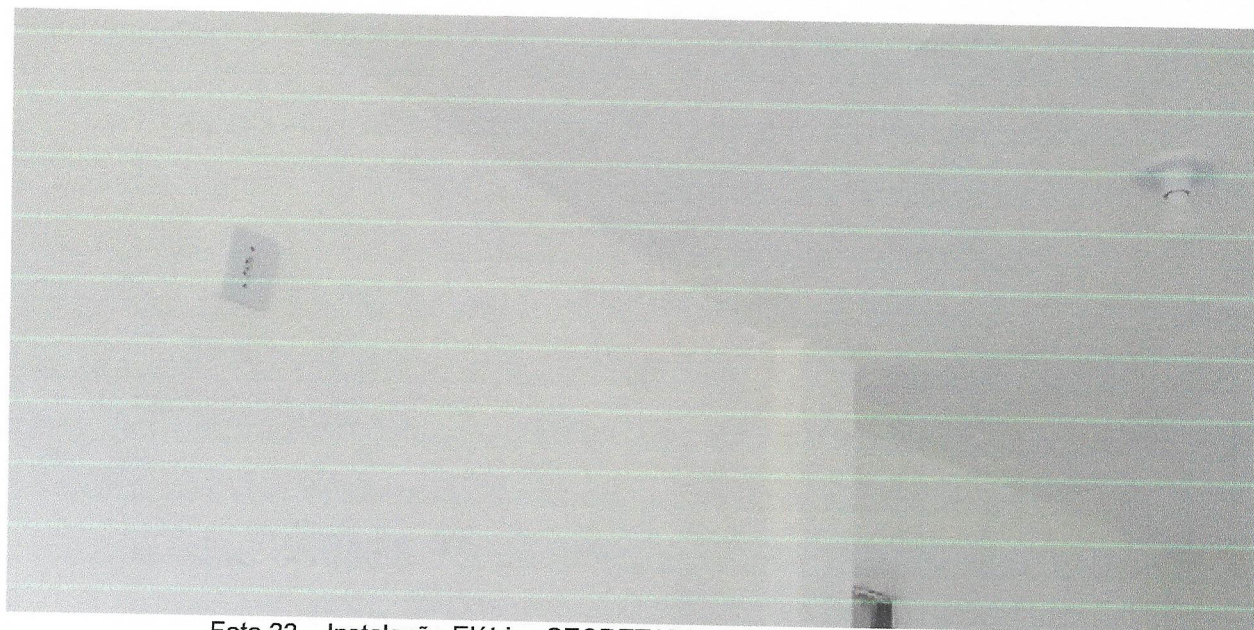


Foto 22 – Instalação Elétrica SECRETARIA (Tomada e Iluminação).

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



Foto 23 – Instalação Elétrica SECRETARIA.

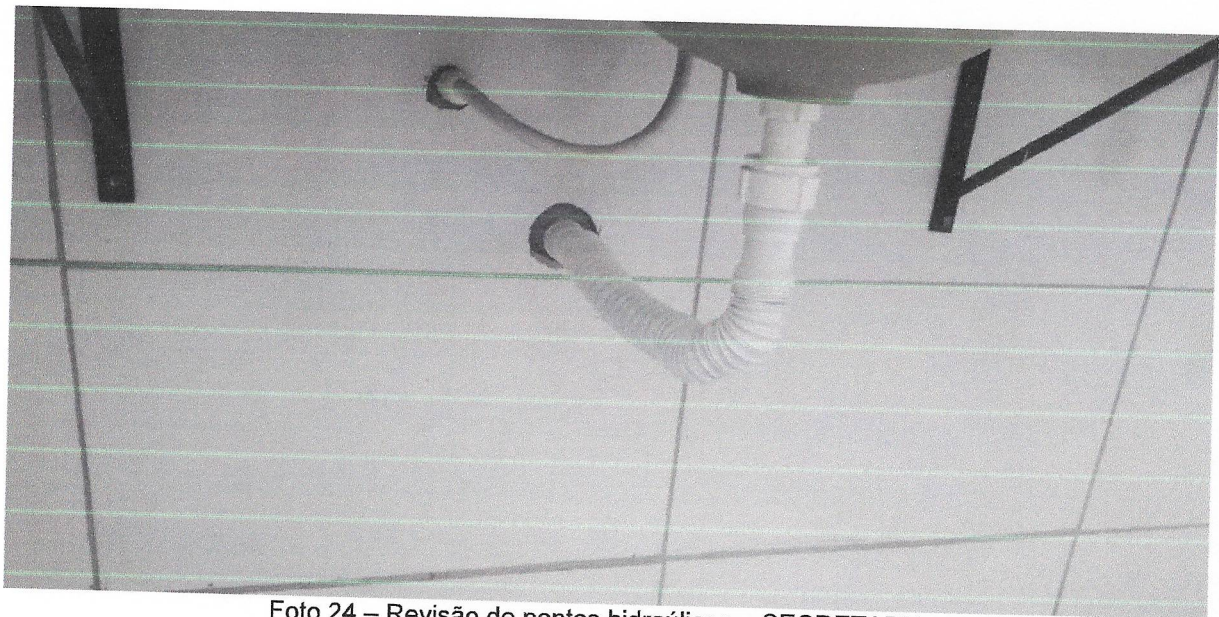




Foto 24 – Revisão de pontos hidráulicos - SECRETARIA

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 011.2022 RPO: 47		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA QTDE						
SEM ATIVIDADE SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 1 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA: Data: 11/09/2022		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Trator Vitrada Trator Vitrada						
FISCALIZAÇÃO: Data: 11/09/2022								


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA

CONTRATO Nº 036-2022

LICITAÇÃO Nº 013-2022

RDC: 48

Data: X
S T Q Q S S D

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

CATEGORIA

OTDF

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

2

Ajudante Geral

1

Calçeteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Serralheiro

Hh DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

RETRADA DE DIVISÓRIAS

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 12/09/2022


Data: 12/09/2022


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CARILTON
CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	X						
OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA				S	T	Q	Q	S	S	D	
CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RND: 49				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				OTIM			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1							
RETIRADA DE DIVISÓRIAS				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
				Ajudante Geral 2							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
CONSIDERAÇÕES				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 300											
Placa Vibratória											
Data: 13/09/2022				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/09/2022											


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
					S	T	Q	Q	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA			EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 036.2022		LICITAÇÃO Nº 043.2022									
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		CATEGORIA		OTIM	
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA			
RETIDADA DE DIVISÓRIAS RETIRADA DE FORRO DE GESSO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra			
								Engenheiro			
								Tec. de Segurança			
								Aux Adm			
								Mestre de obra			
								Encarregado geral			
								Hh DO DIA			
								MÃO DE OBRA DIRETA			
								Topografo			
								Auxiliar de topografia			
								Pedreiro			
								Ajudante Geral			
								Calceteiro			
								Carpinteiro			
								Operador de Motosserra			
								Motorista			
								Montador			
								Montador/Eletricista			
								Electricista			
								Operador de Patrol			
								Operador de Escavadeira			
								Operador de Pá carregadeira			
								Motorista de caçamba			
								Pintor			
								Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO			
								EFETIVO DO DIA			
								JORNADA DE TRABALHO			
								Hh DO DIA			
								Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS			
								TIPO		QTDE.	
								Veículo Leve			
								Caminhão Munck			
								Caminhão Toco			
								Escavadeira			
								Pá carregadeira			
								Caçamba			
								Patrol			
								PC 200			
								Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:		SIGILIZAÇÃO:									
Data: 16/09/2022		Data: 16/09/2022									



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA

CONTRATO Nº 036-2022

LICITAÇÃO Nº 012-2022

RDO: 03

Data							X
S	T	Q	Q	S	S	D	

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

2

Ajudante Geral

1

Calçeteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Hh DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veiculo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Traca Vibratória

Condições Climáticas:

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva si cond. Trab.

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

SEM ATIVIDADE

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 17/09/2022

FISCALIZAÇÃO:


Data: 17/09/2022


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


CHIEF OF PROJECT
SUPERVISOR
MUNICIPALITY OF SANTALUZ
BAHIA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	X
OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 036.2022 LICITAÇÃO Nº 012.2022 RPO: 54				CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				OTDF						
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1						
SEM ATIVIDADE				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA		
Topografo										
Auxiliar de topografia										
Pedreiro 2										
Ajudante Geral 1										
Calçeteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
Hh ACUMULADO										
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Trator										
Trator										
Data: 18/09/2022				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/09/2022				Data: 18/09/2022						

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																														
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 47				<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td><td></td> </tr> </table>									X							S	T	Q	Q	S	S	D								
						X																												
S	T	Q	Q	S	S	D																												
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Escavadeira geral 1 Hh DO DIA																														
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA																														
RETIRADA DE DIVISÓRIAS RETIRADA DE FORRO DE GESSO				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 1 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA																														
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																										
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																										
								EFETIVO EQUIPAMENTOS																										
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munc</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Traca Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munc		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Traca Vibratória	
								TIPO	QTDE.																									
								Veículo Leve																										
				Caminhão Munc																														
				Caminhão Toco																														
				Escavadeira																														
Pá carregadeira																																		
Caçamba																																		
Patrol																																		
PC 200																																		
Traca Vibratória																																		
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																														
Data: 21/09/2022				Data: 21/09/2022																														



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 EMPRESA
 CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data												
						S	T	Q	Q	S	S	D	X					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		CONTRATO Nº 036-2022			LICITAÇÃO Nº 012-2022			RPO: 64		EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: REFORMA DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA		Manhã: (1)			Tarde: (1)			Noite: ()		CATEGORIA			OTDF					
Condições Climáticas:		1- Tempo Bom			2 - Chuva c/ cond. Trab.			3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										Gerente de Obra						
SEM ATIVIDADE												Engenheiro		1				
												Tec. de Segurança						
												Aux Adm						
												Mestre de obra						
												Encarregado geral		1				
												Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES												MÃO DE OBRA DIRETA						
												Topografo						
												Auxiliar de topografia						
												Pedreiro		3				
												Ajudante Geral		4				
												Calceteiro						
												Carpinteiro						
												Operador de Motosserra						
												Motorista						
												Montador						
OBSERVAÇÕES												Montador/Eletricista						
												Eletricista						
												Operador de Patrol						
												Operador de Escavadeira						
												Operador de Pá carregadeira						
												Motorista de caçamba						
												Pintor						
												Hh DO DIA						
GERENTE DE OBRA:												RESUMO DO EFETIVO						
												EFETIVO DO DIA						
												JORNADA DE TRABALHO						
												Hh DO DIA						
Data: 25/09/2022												Hh ACUMULADO						
												EFETIVO EQUIPAMENTOS						
												TIPO		QTDE.				
												Veículo Leve						
Data: 25/09/2022												Caminhão Munck						
												Caminhão Toco						
												Escavadeira						
												Pá carregadeira						
										Caçamba								
										Patrol								
										PC 200								
										Placa Vibrodota								
										Placa Vibrodota								





Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: RA				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA OTDF										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CIMENTO				Hh DO DIA										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
				Hh DO DIA										
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
								EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				GERENTE DE OBRA: Data: 28/09/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 28/09/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CREA-BA nº 051888958-0
 BRUNO DE MATOS SANTOS

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS -CENTRO EDUCACIONAL NILTON OLIVEIRA SANTOS CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RPO: 65				S T Q Q S S D						
				ELETIVO PESSOAL				CATEGORIA		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CIMENTO				Gerente de Obra			1			
				Engenheiro			1			
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro			2			
				Ajudante Geral			1			
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Friticista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 29/09/2022				Data: 29/09/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA										
	CONTRATO Nº 036-2022	LICITAÇÃO Nº 013-2022	RPO: 66	CATEGORIA							
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CIMENTO				MÃO DE OBRA DIRETA			
Topografo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro											
Ajudante Geral											
Calçeteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE.
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
Caminhão Toco											
Escavadeira											
Pá carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/09/2022				Data: 30/09/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036.2022 LICITAÇÃO Nº 013.2022		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
SEM SERVIÇO - FIM DE SEMANA		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 1 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/10/2022		Data: 02/10/2022						




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	X	S	S	D		
OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA				EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 036 2022 LICITAÇÃO Nº 013 2022 RDO: 70				CATEGORIA				QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CIMENTO				Gerente de Obra									
				Engenheiro								1	
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral								1	
												Hh DO DIA	
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro								2	
				Ajudante Geral								1	
				Calçeteiro									
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
OBSERVAÇÕES				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor									
												Hh DO DIA	
				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO								QTDE.	
				Veículo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
Placa Vibratória													
Data: 13/10/2022				FISCALIZAÇÃO:									
				Data: 13/10/2022									


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 026/2022 LICITAÇÃO Nº 013/2022 RDC: 30							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA DIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 1 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CIMENTO											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/10/2022				Data: 14/10/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA

Data	X								
	S	T	Q	Q	S	S	D		

CONTRATO Nº 038 2022 LICITAÇÃO Nº 019 2022 RDO: 03

Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()
 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA	QTDE
MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1
Hh DO DIA	

REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CIMENTO

MÃO DE OBRA DIRETA	
Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	2
Ajudante Geral	1
Calceteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	
Hh DO DIA	

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Muncck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 17/10/2022

Data: 17/10/2022

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	X							
OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA				S	T	Q	Q	S	S	D		
CONTRATO Nº 038 2022 LICITAÇÃO Nº 012 2022 RDO: 04				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE				
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA								
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1								
REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CIMENTO				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
								MÃO DE OBRA DIRETA				
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 1								
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTDE.								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 18/10/2022				Data: 18/10/2022								


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data	X								
	S	T	Q	Q	S	S	D		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA

CONTRATO Nº 026 2022

LICITAÇÃO Nº 010 2022

RDO: 00

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

CATEGORIA

QTDE

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

MÃO DE OBRA INDIRETA

RETIRADA DE FORRO DE GESSO
REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CIMENTO

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	1
Ajudante Geral	2
Calceteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 24/10/2022

Data: 24/10/2022

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data		X							
	S	T	Q	Q	S	S	D		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA

CONTRATO Nº 036 2022

LICITAÇÃO Nº 010 2022

RDO: 01

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

CATEGORIA

QTDE

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

1

Ajudante Geral

2

Calceteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Hh DO DIA

RETIRADA DE FURRO DE GESSO
REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CIMENTO

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:


FISCALIZAÇÃO:

Data: 25/10/2022

Data: 25/10/2022


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051838958-0

CREA-BA
LTC-BA
MÉ-BA
CNPJ 27.240.000-00

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	X	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO N° 026 2022 LICITAÇÃO N° 012 2022 RDO: 02		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA QTDE										
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS RETIRADA DE FORRO DE GESSO REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CIMENTO		Gerente de Obra										
		Engenheiro		1								
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		encarregado geral		1								
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
Pedreiro		1										
Ajudante Geral		2										
Calceiteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO		QTDE.								
		Veiculo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 26/10/2022		Data: 26/10/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CARLA...
 Engenheira Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036 2022 LICITAÇÃO Nº 010 2022 RDO: 04 Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CIMENTO		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/10/2022		Data: 28/10/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036 2022 LICITAÇÃO Nº 042 2022 RDO: 05		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CIMENTO		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 1 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 29/10/2022		Data: 29/10/2022										




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				X	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 026 2022 LICITAÇÃO Nº 043 2022 RDO: 07		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CIMENTO APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZADA NA MARQUISE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 31/10/2022		Data: 31/10/2022								


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
 DE BARRA DO VALE DO RIO
 NOROCCIDENTAL DO PARANÁ

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036 2022 LICITAÇÃO Nº 040 2022 RDO: 00				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CIMENTO APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZADA NA MARQUISE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 01/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 01/11/2022						
OBSERVAÇÕES										


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data		X							
S	T	Q	Q	S	S	D			

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA

CONTRATO Nº 036 2022

LICITAÇÃO Nº 042 2022

RDO: 05

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

CATEGORIA

QTDE

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

MÃO DE OBRA DIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

2

Ajudante Geral

2

Calçeteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Plintor

Hh DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CIMENTO

APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZADA NA MARQUISE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 02/11/2022

Data: 02/11/2022

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051838958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data						
S	T	Q	Q	X	S	D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA

CONTRATO Nº 036 2022

LICITAÇÃO Nº 012 2022

RDO: 100

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

CATEGORIA

QTDE

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

2

Ajudante Geral

3

Calceteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200


Placa Vibratória


GERENTE DE OBRA:


FISCALIZAÇÃO:

Data: 03/11/2022

Data: 03/11/2022


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051886958-0


CAMPESINA DE SANTALUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E BIBLIOTECA

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
						S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA		CONTRATO Nº 036-2022				LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 105		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: ()		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE								
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA								
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO RETIRADA DE DIVISÓRIAS RETIRADA DE LUMINÁRIAS						Gerente de Obra										
						Engenheiro		1								
						Tec. de Segurança										
						Aux Adm										
						Mestre de obra										
						Encarregado geral		1								
						Hh DO DIA										
						MÃO DE OBRA DIRETA										
						Topografo										
						Auxiliar de topografia										
						Pedreiro		1								
						Ajudante Geral		2								
						Calçeteiro										
						Carpinteiro										
						Operador de Motosserra										
Motorista																
Montador																
Montador/Eletricista																
Eletricista																
Operador de Patrol																
Operador de Escavadeira																
Operador de Pá carregadeira																
Motorista de caçamba																
Pintor																
Hh DO DIA																
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO										
						EFETIVO DO DIA										
						JORNADA DE TRABALHO										
						Hh DO DIA										
Hh ACUMULADO																
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS										
						TIPO		QTDE.								
						Veículo Leve										
						Caminhão Muncck										
						Caminhão Toco										
						Escavadeira										
						Pá carregadeira										
						Caçamba										
						Patrol										
PC 200																
Placa Vibratória																
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:														
Data: 08/11/2022		Data: 08/11/2022														


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
 do Estado da Bahia - CREA-BA
 Rua... nº...
 CEP...



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA

CONTRATO Nº 036-2022

LICITAÇÃO Nº 013-2022

RDO: 106

Data						
S	T	Q	Q	S	S	D

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

SIMBOLOGIA

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.

CATEGORIA

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	1
Ajudante Geral	2
Calceteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	

Hh DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO
RETIRADA DE DIVISÓRIAS
RETIRADA DE LUMINÁRIAS

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES


GERENTE DE OBRA:

Data: 09/11/2022


FISCALIZAÇÃO:

Data: 09/11/2022

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 107				S	T	Q	Q	S	S	D
							X			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond, Trab. 3- Chuva s/ cond, Trab.				EFETIVO PESSOAL						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO RETIRADA DE DIVISÓRIAS RETIRADAS DE ELETRODUTOS				CATEGORIA		QTDE				
				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra						
				Engenheiro		1				
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro		2				
				Ajudante Geral		3				
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				Pc 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/11/2022				Data: 10/11/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CARLOS AUGUSTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 Nº 04574 - CREA/BA
 Nº 249734/2019



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA

CONTRATO Nº 036-2022

LICITAÇÃO Nº 013-2022

RDO: 108

Data						
S	T	Q	Q	X	S	D

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

CATEGORIA

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	2
Ajudante Geral	3
Calçeteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	

Hh DO DIA

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO
RETIRADA DE DIVISÓRIAS
RETIRADAS DE ELETRODUTOS

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA
Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:


FISCALIZAÇÃO:

Data: 11/11/2022


Data: 11/11/2022


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAVALARI
LUCAS
MPO CONSULTORES E ENR
CNPJ 08.073.000/0001-00


 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 109				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO RETIRADA DE DIVISÓRIAS RETIRADAS DE ELETRODUTOS				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO		
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 12/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 12/11/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDD: 114				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO RETIRADA DE DIVISÓRIAS RETIRADAS DE ELETRODUTOS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/11/2022				Data: 17/11/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 115				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS DEMOLIÇÃO DE PISO RETIRADA DE DIVISÓRIAS RETIRADAS DE ELETRODUTOS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/11/2022				Data: 18/11/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 EMPRESA
 CONSTRUTORA
 M2C SANTALUZ LTDA
 CNPJ 14.088.958/0001-00



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA

Data						
S	T	Q	Q	S	S	D

Condições Climáticas:

CONTRATO Nº 036-2022

LICITAÇÃO Nº 011-2022

RDC: 116

EFETIVO PESSOAL

SIMBOLOGIA

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

CATEGORIA

OTNF

1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

DEMOLIÇÃO DE PISO
RETIRADA DE DIVISÓRIAS
RETIRADAS DE ELETRODUTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	1
Ajudante Geral	3
Calçeteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	1

CONSIDERAÇÕES

Hh DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	7
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veiculo Leve	1
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibração	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 19/11/2022

Data: 19/11/2022

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

DEPARTAMENTO DE
OPERAÇÕES
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
05124-000



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA

CONTRATO Nº 036-2022

LICITAÇÃO Nº 013-2022

RDO: 121

Data						
S	T	Q	Q	S	S	D

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

1

Ajudante Geral

3

Calçeteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

1

Hh DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

7

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veiculo Leve

1

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

Condições Climáticas:

SIMBOLOGIA

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

RETIRADA DE ENTULHO
COMPACTAÇÃO DE SOLO

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 24/11/2022

FISCALIZAÇÃO:

Data: 24/11/2022

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA

CONTRATO N° 036-2022

LICITAÇÃO N° 013-2022

RDO: 125

Data	X								
	S	T	Q	Q	S	S	D		

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

CATEGORIA QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

INSTALAÇÃO DE MALHA POP E LONA PLASTICA

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	
Ajudante Geral	2
Calceteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	1
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Plintor	

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	5
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	2
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	1
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:


FISCALIZAÇÃO:

Data: 28/11/2022

Data: 28/11/2022


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

BRUNO DE MATOS SANTOS
CREA-BA nº 051888958-0
CPF nº 24.523.449/21-59

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDC: 130				S	T	Q	Q	S	S	X	D
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (2)		Noite: ()		EFETIVO PESSOAL					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE	
CONCRETAGEM DE PISO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA					
								Gerente de Obra					
								Engenheiro					
								Tec. de Segurança					
								Aux Adm					
								Mestre de obra					
								Encarregado geral					
								Hh DO DIA					
CONSIDERAÇÕES								MÃO DE OBRA DIRETA					
								Topografo					
								Auxiliar de topografia					
								Pedreiro					
								Ajudante Geral					
								Calceteiro					
								Carpinteiro					
								Operador de Motoserra					
								Motorista					
								Montador					
OBSERVAÇÕES								Montador/Eletricista					
								Eletricista					
								Operador de Patrol					
								Operador de Escavadeira					
								Operador de Pá carregadeira					
								Motorista de caçamba					
								Hh DO DIA					
								RESUMO DO EFETIVO					
								EFETIVO DO DIA					
								JORNADA DE TRABALHO					
								Hh DO DIA					
								Hh ACUMULADO					
								EFETIVO EQUIPAMENTOS					
								TIPO					
								QTDE.					
								Veículo Leve					
								Caminhão Munck					
								Caminhão Toco					
								Escavadeira					
								Pá carregadeira					
								Caçamba					
								Patrol					
GERENTE DE OBRA:								PC 200					
Data: 03/12/2022								Meca Vibratória					
FISCALIZAÇÃO:													
Data: 03/12/2022													



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0


 CARLOS...
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA Nº 05188958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 012-2022 RPO: 133		EFETIVO PESSOAL							CATEGORIA: QTNF			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÁO DE OBRA INDIRETA							Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1			
CONCRETAGEM DE PISO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		MÁO DE OBRA DIRETA							Hh DO DIA			
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba							Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Marca Vibratória			
GERENTE DE OBRA: Data: 06/12/2022		FISCALIZAÇÃO: Data: 06/12/2022										


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 BRUNO DE MATOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA Nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
		S	T	Q	Q	X	S	S	D					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 012-2022 RPO- 136		EFETIVO PESSOAL												
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA					QTDE							
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA												
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Escarregado geral 1 Hh DO DIA												
CONCRETAGEM DO PISO DA BIBLIOTECA		MÃO DE OBRA DIRETA												
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba												
		Hh DO DIA												
		RESUMO DO EFETIVO												
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO												
		EFETIVO EQUIPAMENTOS												
		TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Máquina Vibratória												
		Hh DO DIA												
		CONSIDERAÇÕES												
		OBSERVAÇÕES												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 09/12/2022		Data: 09/12/2022												



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA

CONTRATO Nº 016.2022

LICITAÇÃO Nº 019.2022

RNN: 137

Data						
S	T	Q	Q	S	S	D

Condições Climáticas:

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

EFETIVO PESSOAL

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

CATEGORIA

QTMF

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro 1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral 1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro 2

Ajudante Geral 4

Calçeteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Hh DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO QTDE.

Veiculo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Máca Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 10/12/2022

Data: 10/12/2022

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA

CONTRATO Nº 016-2022

LICITAÇÃO Nº 013-2022

RPO: 138

Data									X
	S	T	Q	Q	S	S	D		

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

CATEGORIA

QTDE

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

1

1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calceteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

1

2

Hh DO DIA

CONCRETAGEM DO PISO DA BIBLIOTECA
ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Muncck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 11/12/2022

Data: 11/12/2022

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA

CONTRATO Nº 036-2022

LICITAÇÃO Nº 013-2022

PDO: 142

Data						
S	T	Q	Q	X	S	D

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calçeteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Gesseiro

Pintor

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Hh DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Moto Vibratória

Condições Climáticas:

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO - BIBLIOTECA
INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES


GERENTE DE OBRA:

Data: 15/12/2022

FISCALIZAÇÃO:

Data: 15/12/2022

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 146							
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTD							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO - BIBLIOTECA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO INSTALAÇÃO NOVOS PONTOS DE TOMADAS INSTALAÇÃO DE DRENOS DE AR CONDICIONADO				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Gesseiro 1 Pintor Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTD. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Páca Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 19//2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 19//2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA

CONTRATO Nº 036-2022

LICITAÇÃO Nº 013-2022

RDO: 150

Data					X			
	S	T	Q	Q	S	S	D	

Condições Climáticas:

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

1

Ajudante Geral

3

Calçeteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

1

Gesselro

1

Pintor

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Hh DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

INSTALAÇÃO DE DRENOS DE AR CONDICIONADO
REVISÃO DE PONTOS ELÉTRICOS
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 23/12/2022

Data: 23/12/2022

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
						X									
						S	T	Q	Q	S	S	S	D		
MP2 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETIVO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 059-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 153 Mês: (1) Ano: (1) Fim: () 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.						EPETIVO PESSOAL CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM SERVIÇOS						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Motorista de caminhão Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA RESUMO DO EPETIVO JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Escavadeira Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Pisca Vibratória									
CONSIDERAÇÕES															
OBSERVAÇÕES															
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 28/12/2022						Data: 28/12/2022									


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
<p>EMPRESA: FUNDACÃO MUNICIPAL DO CANTALDO</p> <p>OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA</p> <p>CONTRATO Nº: 636-2022 LICITAÇÃO Nº: 013-2022 RDO: 153</p> <p>Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: ()</p> <p>1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.</p> <p>SEMILOGIA</p>				<p>EFEKTIVO PESSOAL</p> <p>CATEGORIA</p> <p>MÃO DE OBRA INDIRETA</p> <p>Gerente de Obra</p> <p>Especialista</p> <p>Tec. de Segurança</p> <p>Aux. Ajm</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Escarregado geral</p> <p>Hr DO DIA</p> <p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Operário</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro</p> <p>Ajudante Geral</p> <p>Calçeteiro</p> <p>Carpinteiro</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motoforista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Patrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Motolista de caçamba</p> <p>Pinor</p> <p>Serralheiro</p> <p>HR DO DIA</p> <p>RESUMO DO EFETIVO</p> <p>EFEKTIVO PESSOAL</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hr DO DIA</p> <p>Hr ACUMULADO</p> <p>EFEKTIVO EQUIPAMENTOS</p> <p>TIPO</p> <p>QTD</p> <p>Volcões Lote</p> <p>Caminhão Mercedes</p> <p>Escavadeira</p> <p>PA carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p> <p>Placa Vibratória</p>							
SEM SERVIÇOS											
CONSIDERAÇÕES											
OBSERVAÇÕES											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/12/2022				Data: 27/12/2022							

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA
MONTANARI
MONTANARI

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
<p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA</p> <p>OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA</p> <p>CONTRATO Nº 038-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 154</p> <p>Manhã (1) Tarde (1) Noite ()</p> <p>1- Tempo Rom 2 - Chuva af. cond. Trab. 3- Chuve af. cond. Trab.</p> <p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p>				<p>EFETIVO PESSOAL</p> <p>CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE</p> <p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro</p> <p>Téc. de Segurança</p> <p>Aux. Adm</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Encarregado geral</p> <p>Hr DO DIA</p> <p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topógrafo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro</p> <p>Ajudante Geral</p> <p>Calceiteiro</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motocista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Elétricista</p> <p>Elétricista</p> <p>Operador de Patrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pá carregadeira</p> <p>Operador de empilhadeira</p> <p>Pistoneiro</p> <p>Serralheiro</p> <p>Hr DO DIA</p> <p>RESUMO DO EFETIVO</p> <p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hr DO DIA</p> <p>Hr ACUMULADO</p> <p>EFETIVO EQUIPAMENTOS</p> <p>TIPO QTDE</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Manch</p> <p>Caminhão Toro</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pá carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p> <p>ALISADOR DE CONCRETO</p>							
CONSIDERAÇÕES											
OBSERVAÇÕES											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/12/2022				Data: 28/12/2022							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	S	X	S	D
 <p> OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO N°: 026-2022 LICITAÇÃO N°: 010-2022 RDO: 167 </p>		EFETIVO PESSOAL							
CONDICÕES CLÁSSICAS Maná: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA				QTDE			
SÍMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS (Empty space for service details)		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
		(Empty space for indirect labor)							
CONSIDERAÇÕES (Empty space for observations)		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Estencista Operador de Pánel Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Mecânico de veículos Pintor Serralheiro							
OBSERVAÇÕES (Empty space for observations)		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hn DO DIA Hn ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA: Data: 31/12/2022		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TPC QTDE. Veículo Leve Caminhão Manick Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Escavto Pánel PC 200 (Empty space for equipment details)							
FISCALIZAÇÃO: Data: 31/12/2022									



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
<p>MP2 MUNICÍPIO DE SANTALUZ</p> <p>OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA</p> <p>CONTRATO Nº 936-2022 LICITAÇÃO Nº 913-2022</p> <p>Marca: (1) Tenda: (1) RDO: 191</p> <p>1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.</p> <p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p>				<p>EFETIVO PESSOAL</p> <p>CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE</p> <p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Téc. de Segurança</p> <p>Aux. Alum</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Encarregado geral 1</p> <p>PH DO DIA</p> <p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topógrafo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro 1</p> <p>Ajudante Geral 2</p> <p>Calçeteiro</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motorista</p> <p>Montador 4</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Patrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pia carregadeira</p> <p>Pinçador de torçoes</p> <p>Pinçador</p> <p>Borracheiro</p> <p>PH DO DIA</p> <p>RESUMO DO EFETIVO</p> <p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>PH DO DIA</p> <p>PH ACUMULADO</p> <p>EFETIVO EQUIPAMENTOS</p> <p>TIFO QTDE</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Musck</p> <p>Caminhão Toco</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pia carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p>							
<p>INSTALAÇÃO DE FUNDO DE MESSO</p> <p>INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO</p>											
CONSIDERAÇÕES											
OBSERVAÇÕES											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/01/2023				Data: 04/01/2023							

Bruno

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


[Circular Stamp]

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	X	S	D
<p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ</p> <p>OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA</p> <p>CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 019-2022 RDO: (63)</p> <p>Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()</p> <p>SAIBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of. com. Trab. 3- Chuva af. com. Trab.</p> <p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p>				<p>EFETIVO PESSOAL</p> <p>CATEGORIA</p> <p>MÃO DE OBRA INDIRETA</p> <p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro</p> <p>Téc. de Segurança</p> <p>Aux. Adm.</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Encarregado geral</p> <p>Topógrafo</p> <p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topógrafo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro</p> <p>Ajudante Geral</p> <p>Capoteiro</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motorista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Patrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pa carregadeira</p> <p>Operador de segadora</p> <p>Pinçoteiro</p> <p>Pinçoteiro</p> <p>Serralheiro</p>						
<p>INSTALAÇÃO DE PARRUS DE GESSO</p> <p>INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO</p>				<p>QTDE</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p>						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				<p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>HR DO DIA</p> <p>HR ACUMULADO</p>						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				<p>TIPO</p> <p>QTDE</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Munck</p> <p>Caminhão Toco</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pa carregadeira</p> <p>Capoteiro</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p> <p>Pinçoteiro</p>						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 06/01/2022				Data: 06/01/2022						

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
<p>EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ</p> <p>OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA</p> <p>CONTRATO Nº 006-2023 LICITAÇÃO Nº 913-2022 RDO: 164</p> <p>Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()</p> <p>SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva cf. cond. Trab.</p> <p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p>				<p>EFETIVO PESSOAL</p> <p>CATEGORIA</p> <p>MÃO DE OBRA INDIRETA</p> <p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Téc. de Segurança</p> <p>Aux. Adm.</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Carregador geral</p> <p>1</p> <p>HR DO DIA</p> <p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topógrafo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro</p> <p>Ajudante Geral</p> <p>Calçeteiro</p> <p>Operário</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motosserra</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Patrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pa carregadeira</p> <p>Operador de empilhadeira</p> <p>Pinçador</p> <p>Serralheiro</p> <p>HR DO DIA</p> <p>RESUMO DO EFETIVO</p> <p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>HR DO DIA</p> <p>HR ACUMULADO</p> <p>EFETIVO EQUIPAMENTOS</p> <p>TIFO</p> <p>QTDE.</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Manuck</p> <p>Caminhão Toco</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pa carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p> <p>Empilhadeira</p>							
<p>INSTALAÇÃO DE FURADO DE MEDIDA</p> <p>INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO</p>											
CONSIDERAÇÕES											
OBSERVAÇÕES											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 07/01/2023				Data: 07/01/2023							


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	S	S	X	D				
	OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022			RDO: 166		EFETIVO PESSOAL									
	Condições Climáticas SIMBOLOGIA	Marca: (1)	Tarefa: (1)	Hora: ()	CATEGORIA			QTD							
1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA											
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral											
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topógrafo Auxiliar de Topografia Pedreiro Ajudante Geral Escoveiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Pátio Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Mecânico de Setaquia Pintor Serralheiro											
				Hrs DO DIA											
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO			
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
								Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Pátio PC 200							
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
				Data: 08/01/2023				Data: 08/01/2023							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
 <p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 166</p>				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Tralh. 3- Chuva sf cond. Tralh.				CATEGORIA				MÃO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMPORRAMENTO DE FERRUGEM EXTERNA E INTERNA LIXAMENTO DE PAREDES EXTERNA PINTURA ACRÍLICA DE PAREDES INTERNAS ASSENTAMENTO DE PORTAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 Hrs DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Caldebeiro Serralheiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Operadora de compactadora Pintor Serralheiro Hrs DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TPC QTD. Veículo Leve Caminhão Mercedes Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Compactadora Patrol PC 200 Serrador								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 05/01/2023				Data: 05/01/2023								



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




BRUNO DE MATOS SANTOS
 CREA-BA Nº 051888958-0
 05/01/2023

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		DATA						
		S	X	T	Q	Q	S	S
MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZIA OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 016-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 167		EFETIVO PESSOAL						
Município: (1) Estado: (1) Nota: () 1- Tempo Bom 2- Chuva af cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS CARRAMINHOS DE PANEDES CALÇADA E ENFERMIA LIXAMENTO DE PAREDES EXTERNA PINTURA ACRÍLICA DE PANEDES INTERNAS ASSENTAMENTO DE PORTA EM MADEIRA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
CONSIDERAÇÕES OBSERVAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Encarregado de segurança Pintor Serralheiro						
		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Canteiro de obras						
GERENTE DE OBRA: Data: 10/01/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 10/01/2023						





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
<p>MP2 MUNICÍPIO DE SANTALUZ</p> <p>OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA</p> <p>CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022</p> <p>Localidade: <u>Mantã</u> (1)</p> <p>RDD: 168</p> <p>1 - Tempo Bom 2 - Chuva of. cond. Trab. 3 - Chuva af. cond. Trab.</p> <p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p>				<p>EFETIVO PESSOAL</p> <p>CATEGORIA</p> <p>MÃO DE OBRA INDIRETA</p> <p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Téc. de Segurança</p> <p>Aux. Adm.</p> <p>Mestre de obra</p> <p>estricar/regiao geral 1</p> <p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topografo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro 1</p> <p>Ajudante Geral 2</p> <p>Calceiteiro</p> <p>Operador de Motocerra</p> <p>Motorista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Patrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pá carregadeira</p> <p>Operador de caminhão</p> <p>Pinheiro</p> <p>Serralheiro</p>							
<p>CONDICIONAMENTO DE PAREDES EXTERNA E INTERNA</p> <p>LIXAMENTO DE PAREDES EXTERNA</p> <p>PINTURA ACRÍLICA DE PAREDES INTERNAS</p> <p>ASSENTAMENTO DE PORTAS EM MADEIRA</p>				<p>RESUMO DO EFETIVO</p> <p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>Hh ACUMULADO</p> <p>EFETIVO EQUIPAMENTOS</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Manuk</p> <p>Caminhão Toco</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pá carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p>							
<p>CONSIDERAÇÕES</p>				<p>GERENTE DE OBRA:</p> <p>Data: 11/01/2023</p> <p>FISCALIZAÇÃO:</p> <p>Data: 11/01/2023</p>							
<p>OBSERVAÇÕES</p>											



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 SANTALUZ
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
 Nº 013-2022

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																												
				S	T	Q	X	S	S	D																						
 <p>OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 169</p>				EFETIVO PESSOAL																												
SIMBOLOGIA Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva al. cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE																									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS CRONOMETRAGEM DE FUNDOS EXTERNA E INTERNA LISAMENTO DE PAREDES EXTERNA PINTURA ACRÍLICA DE PAREDES INTERNAS ASSENTAMENTO DE PORTAS EM MADEIRA				MÃO DE OBRA INDIRETA																												
				Engenheiro de Obra 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1																												
				MÃO DE OBRA DIRETA																												
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Operador de Lazer Pintor Serralheiro																												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																												
				EFETIVO DO DIA																												
				JORNADA DE TRABALHO																												
				Hh DO DIA																												
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Capumba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Trator</td><td></td></tr> <tr><td>Trator</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Capumba		Patrol		PC 200		Trator		Trator	
				TIPO	QTDE																											
				Veículo Leve																												
				Caminhão Munck																												
				Caminhão Toco																												
				Escavadeira																												
				Pá carregadeira																												
Capumba																																
Patrol																																
PC 200																																
Trator																																
Trator																																
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																												
Data: 12/01/2023				Data: 12/01/2023																												



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
<p>MP2</p> <p>OBJETO: REFORMA MUNICIPAL DE DANÇARUM</p> <p>OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA</p> <p>CONTRATO Nº 026-2022</p> <p>LISTAÇÃO Nº 019-2022</p> <p>RDO: 173</p> <p>Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (2) Noite ()</p> <p>Simbologia: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva cf. cond. Trab.</p>				<p>EFETIVO PESSOAL</p> <p>CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTD</p> <p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Tec. de Segurança</p> <p>Aux. Adm.</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Encarregado geral 1</p> <p>HR DO DIA</p> <p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topografo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro 2</p> <p>Ajudante Geral 4</p> <p>Calceiro</p> <p>Empilhador</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motorista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Bombrista</p> <p>Operador de Patrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pá carregadeira</p> <p>Operador de Locomotiva</p> <p>Pinheiro 3</p> <p>Serralheiro</p> <p>HR DO DIA</p> <p>RESUMO DO EFETIVO</p> <p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>HR DO DIA</p> <p>HR ACUMULADO</p> <p>EFETIVO EQUIPAMENTOS</p> <p>TIPO QTD</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Manick</p> <p>Caminhão Toco</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pá carregadeira</p> <p>Capacim</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p> <p>Trator Vitor</p>								
<p>CONSIDERAÇÕES</p> <p>CONDOMÍNIO DE PARQUE CAIENNA</p> <p>LIXAMENTO DE PAREDES EXTERNA</p>												
<p>OBSERVAÇÕES</p>												
<p>GERENTE DE OBRA:</p> <p>Data: 16/01/2023</p>				<p>FISCALIZAÇÃO:</p> <p>Data: 16/01/2023</p>								

Bruno

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	X							
				S	T	Q	Q	S	S	S	D	
<p>SECRETARIA MUNICIPAL DE BASTAPOS</p> <p>OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA</p> <p>CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 174</p> <p>Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()</p> <p>SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab.</p> <p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p>				<p>EFETIVO PESSOAL</p> <p>CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTD</p> <p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Téc. de Segurança</p> <p>Ass. Edm.</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Encarregado geral</p>								
<p>CONDIÇÕES DE PAREDES EXTERNA E INTERNA</p> <p>LIXAMENTO DE PAREDES EXTERNA E INTERNA</p>				<p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topógrafo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro 2</p> <p>Ajudante Geral 4</p> <p>Calceiro</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motorista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Patrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pia carregadeira</p> <p>Motorista de Logística</p> <p>Pintor 3</p> <p>Serralheiro</p>								
				<p>Hh DO DIA</p>								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				<p>TIPO QTD</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Muncck</p> <p>Caminhão Toco</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pia carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p>								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 17/01/2023				Data: 17/01/2023								




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
<p>MP2</p> <p>OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA</p> <p>CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 175</p> <p>Condições Climáticas Manhã (1) Tarde (1) Noite ()</p> <p>1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab.</p> <p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p>				<p>EFETIVO PESSOAL</p> <p>CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE</p> <p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Téc. de Segurança</p> <p>Aux. Adm.</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Encarregado geral</p> <p>1</p> <p>18/01/2022</p> <p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topógrafo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro 2</p> <p>Ajudante Geral 4</p> <p>Calçateiro</p> <p>Operador de Motocerra</p> <p>Motorista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Patrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pá carregadeira</p> <p>Plator</p> <p>Serralheiro 3</p> <p>18/01/2022</p> <p>RESUMO DO EFETIVO</p> <p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>18/01/2022</p> <p>18/01/2022</p> <p>EFETIVO EQUIPAMENTOS</p> <p>TFC QTDE</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Maultch</p> <p>Caminhão Toco</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pá carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p>							
<p>CONSIDERAÇÕES</p>											
<p>OBSERVAÇÕES</p>											
<p>GERENTE DE OBRA:</p> <p>Data: 18/01/2022</p>				<p>FISCALIZAÇÃO:</p> <p>Data: 18/01/2022</p>							

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
 <p>RESENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-0022 RDO: 179</p>				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS LIXAMENTO DE PAREDES EXTERNA						MÃO DE OBRA DIRETA					
						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 4 Calceteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Motorista de Locomotiva Pintor 3 Serralheiro					
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO					
				Hh DO DIA		Hh ACUMULADO					
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				PA carregadeira							
				Cacama							
				Patrol							
				PC 300							
				Locomotiva							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/01/2023				Data: 15/01/2023							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	X	S	D
<p>MP2</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPITAL DE TRÁFEGO</p> <p>OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA</p> <p>CONTRATO Nº 026/2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 177</p> <p>Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()</p> <p>SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Tráb. 3- Chuva cf cond. Tráb. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p>				<p>EFETIVO PESSOAL</p> <p>CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTD</p> <p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Téc. de Segurança</p> <p>Aux. Adm.</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Encarregado geral 1</p> <p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topógrafo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro 2</p> <p>Ajudante Geral 4</p> <p>Calceiteiro</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Mecânico</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Elétricista</p> <p>Elétricista</p> <p>Operador de Patiol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pá carregadeira</p> <p>Pinçador de resíduo sólido</p> <p>Pinçador</p> <p>Serralheiro 3</p>						
<p>CRASSAMEN U UC PANCUDA CAIENVA</p> <p>LIXAMENTO DE PAREDES EXTERNA</p> <p>LIXAMENTO DE PAREDES INTERNA</p>				<p>RESUMO DO EFETIVO</p> <p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>Hh ACUMULADO</p>						
<p>CONSIDERAÇÕES</p>				<p>EFETIVO EQUIPAMENTOS</p> <p>T.F.U. QTD</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Basculante</p> <p>Caminhão Terc</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pá carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p> <p>Trator Serralheiro</p>						
<p>OBSERVAÇÕES</p>										
<p>GERENTE DE OBRA:</p> <p>Data: 20/01/2022</p>				<p>FISCALIZAÇÃO:</p> <p>Data: 20/01/2022</p>						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
<p>MP2</p> <p>MUNICÍPIO DE CAVALARI</p> <p>OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA</p> <p>CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 179</p> <p>Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()</p> <p>SIMBOLÓGICA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.</p> <p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p>				<p>EFETIVO PESSOAL</p> <p>CATEGORIA</p> <p>MÃO DE OBRA INDIRETA</p> <p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Téc. de Segurança</p> <p>Aux. Adm.</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Encarregado geral 1</p> <p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topógrafo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro</p> <p>Ajudante Geral</p> <p>Calçeteiro</p> <p>Operador de Motoperra</p> <p>Motofista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Patrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pá carregadeira</p> <p>Operário de limpeza</p> <p>Pinor</p> <p>Serralheiro</p>							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/01/2023				Data: 22/01/2023							


Bruno

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0

CAMILLA
 GERENTE DE OBRA
 MÃO DE OBRA INDIRETA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
<p>OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA</p> <p>CONTRATO Nº 016-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 100</p> <p>Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()</p> <p>1- Tempo Bom 2 - Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sf. cond. Trab.</p> <p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p>		<p>EFETIVO PESSOAL</p> <p>CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTOE</p> <p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Tec. de Segurança</p> <p>Aux. Adm.</p> <p>Mestre de obra</p> <p>carregador geral 1</p> <p>Hs DO DIA</p> <p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topógrafo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro 1</p> <p>Ajuntador Geral 2</p> <p>Calçateiro</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motorista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Pátio</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pá carregadeira</p> <p> Pintor 4</p> <p>Serralheiro</p> <p>Hs DO DIA</p> <p>RESUMO DO EFETIVO</p> <p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hs DO DIA</p> <p>Hs ACUMULADO</p> <p>EFETIVO EQUIPAMENTOS</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Muncie</p> <p>Caminhão Teço</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pá carregadeira</p> <p>Calçamba</p> <p>Pátio</p> <p>PC 200</p>						
<p>REVISÃO DE CALIBRAÇÃO E FALTA DE</p> <p>LIXAMENTO DE PAREDES INTERNA</p>								
CONSIDERAÇÕES								
OBSERVAÇÕES								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/01/2023		Data: 23/01/2023						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
 EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA MP2 CONSULTORIA	MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRISTALINO OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 026.2022			LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 191							
	Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()	1- Tempo Bom 2 - Chuva et cond. Trtb. 3- Chove et cond. Trtb.			CATEGORIA				QTDE		
SÍMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
PINTURA DE EXTERNA DA FACHADA EMASSAMENTO DE PORTAS				Mão de obra indireta							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
OBSERVAÇÕES				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceiro Empilhador Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Mecânico Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Operadora de guindaste Pintor 4 Serralheiro							
RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
EFETIVO EQUIPAMENTOS				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toce Escavadeira Pá carregadeira Guindaste Patrol PC 200							
GERENTE DE OBRA: Data: 24/01/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 24/01/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	S	S	Q	
 MUNICÍPIO DE MONTALVÃO GOVERNADOR CARLOS DE ALMEIDA OBJETIVO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 038-2022 LICITAÇÃO Nº 015-0922 RDO: 182				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA					QTDE
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral							1
PINTURA DE EXTERNA DA FACHADA				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Alpendre Geral Calçoteiro Serralheiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Operador de caminhão Pintor Serralheiro							4
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TPC QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capanga Patrol PC 200							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 25/01/2023				Data: 25/01/2023							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																																																										
				S	T	Q	X	S	S	D																																																				
<p>  MPZ <small>MUNICÍPIO DE PALMARES</small> </p> <p> <small>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</small> OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 183 </p> <p> <small>Condições Climáticas</small> Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () </p> <p> <small>SIMBOLOGIA</small> 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva cf. cond. Trans. </p> <p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p>				<p>EFETIVO PESSOAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORIA</th> <th>QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">MÃO DE OBRA INDIRETA</td> </tr> <tr> <td>Gerente de Obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Engenheiro</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tec. de Segurança</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aux. Adm.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mestre de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carregador geral</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MÃO DE OBRA DIRETA</td> </tr> <tr> <td>Topógrafo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Auxiliar de topografia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pedreiro</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ajudante Geral</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Calceiteiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Motocerra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador/Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Faltol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Escavadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Pá carregadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorista de Locomotiva</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pinheiro</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Serralheiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hh DO DIA</td> </tr> </tbody> </table>							CATEGORIA	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA		Gerente de Obra		Engenheiro	1	Tec. de Segurança		Aux. Adm.		Mestre de obra		Carregador geral	1	MÃO DE OBRA DIRETA		Topógrafo		Auxiliar de topografia		Pedreiro	1	Ajudante Geral	2	Calceiteiro		Operador de Motocerra		Motorista		Montador		Montador/Eletricista		Eletricista		Operador de Faltol		Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira		Motorista de Locomotiva		Pinheiro	4	Serralheiro		Hh DO DIA	
CATEGORIA	QTDE																																																													
MÃO DE OBRA INDIRETA																																																														
Gerente de Obra																																																														
Engenheiro	1																																																													
Tec. de Segurança																																																														
Aux. Adm.																																																														
Mestre de obra																																																														
Carregador geral	1																																																													
MÃO DE OBRA DIRETA																																																														
Topógrafo																																																														
Auxiliar de topografia																																																														
Pedreiro	1																																																													
Ajudante Geral	2																																																													
Calceiteiro																																																														
Operador de Motocerra																																																														
Motorista																																																														
Montador																																																														
Montador/Eletricista																																																														
Eletricista																																																														
Operador de Faltol																																																														
Operador de Escavadeira																																																														
Operador de Pá carregadeira																																																														
Motorista de Locomotiva																																																														
Pinheiro	4																																																													
Serralheiro																																																														
Hh DO DIA																																																														
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																																																										
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																																																										
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																																																										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Faltol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Faltol		PC 200																																			
TIPO	QTDE																																																													
Veículo Leve																																																														
Caminhão Munck																																																														
Caminhão Toco																																																														
Escavadeira																																																														
Pá carregadeira																																																														
Caçamba																																																														
Faltol																																																														
PC 200																																																														
GERENTE DE OBRA: Data: 26/01/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 28/01/2023																																																										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
<p>MP2</p> <p>OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA</p> <p>CONTRATO Nº 636-2022 LICITAÇÃO Nº 915-2022 RDO: 195</p> <p>Maré: (1) Tide: (1) Nota: ()</p> <p>1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab.</p> <p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p>		<p>EFETIVO PESSOAL</p> <p>CATEGORIA QTDE</p> <p>MÃO DE OBRA INDRETA</p> <p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Téc. de Segurança</p> <p>Aux. Adm</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Carregador geral</p> <p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topógrafo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro</p> <p>Ajudante Geral</p> <p>Calçateiro</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motorista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Eltricista</p> <p>Operador de Pátrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pa carregadeira</p> <p>Montador de Lancha</p> <p>Pinor</p> <p>Serralheiro</p>						
SEM SERVIÇO		<p>RESUMO DO EFETIVO</p> <p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>Hh ACUMULADO</p>						
CONSIDERAÇÕES		<p>EFETIVO EQUIPAMENTOS</p> <p>TIFO QTDE</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Manck</p> <p>Caminhão Toco</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pa carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p>						
OBSERVAÇÕES								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 26/01/2023		Data: 28/01/2023						

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CANCELADO
CDD-0
RDO Nº 195-2022
DATA: 28/01/2023


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	X	Q	Q	S	S	D
<p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATÁZUL</p> <p>OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA</p> <p>CONTRATO Nº 038-2022</p> <p>LICITAÇÃO Nº 613-0922</p> <p>Marçá: (1)</p> <p>Tudo: (1)</p> <p>RDO: 198</p> <p>Nota: ()</p> <p>1- Tempo Bom 2- Chuva ef. cont. Trab. 3- Chuva ef. cont. Trab.</p> <p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p>		<p>EFETIVO PESSOAL</p> <p>CATEGORIA</p> <p>QTDE</p> <p>MÃO DE OBRA INDIRETA</p> <p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro</p> <p>Téc. de Segurança</p> <p>Aux. Adm.</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Carregador geral</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topógrafo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro</p> <p>Ajudante Geral</p> <p>Calçateiro</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motorista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Patrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pá carregadeira</p> <p>Operador de varrição</p> <p>Pintor</p> <p>Serralheiro</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>RESUMO DO EFETIVO</p> <p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>Hh ACUMULADO</p> <p>EFETIVO EQUIPAMENTOS</p> <p>TIPO</p> <p>QTDE.</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Truck</p> <p>Caminhão Toco</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pá carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p>						
<p>PRÉLIMINA DE CANCELAMENTO E/OU ALTERAÇÃO</p> <p>INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE MADEIRA</p>								
CONSIDERAÇÕES								
OBSERVAÇÕES								
GERENTE DE OBRA:		RECUPERAÇÃO:						
Data: 31/01/2023		Data: 31/01/2023						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data																																																												
		S	T	X	Q	S	S	D																																																						
<p>EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ</p> <p>OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA</p> <p>CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 189</p> <p>Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()</p> <p>1- Tempo Bom 2- Chuva et cond. Trab. 3- Chuva et cond. Trab.</p> <p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p>		<p>EFETIVO PESSOAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORIA</th> <th>QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">MÃO DE OBRA INDIRETA</td> </tr> <tr> <td>Gerente de Obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Engenheiro</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Téc. de Segurança</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aux. Adm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mestre de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Encarregado geral</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MÃO DE OBRA DIRETA</td> </tr> <tr> <td>Topógrafo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Auxiliar de topografia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pedreiro</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ajudante Geral</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Caldeiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Soldador</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Motosserra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador/Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Patrol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Escavadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Pá carregadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de betoneira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de betoneira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plintor</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Serralheiro</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							CATEGORIA	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA		Gerente de Obra		Engenheiro	1	Téc. de Segurança		Aux. Adm		Mestre de obra		Encarregado geral	1	MÃO DE OBRA DIRETA		Topógrafo		Auxiliar de topografia		Pedreiro	1	Ajudante Geral	2	Caldeiro		Soldador		Operador de Motosserra		Motorista		Montador		Montador/Eletricista		Eletricista		Operador de Patrol		Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira		Operador de betoneira		Operador de betoneira		Plintor	4	Serralheiro	
CATEGORIA	QTDE																																																													
MÃO DE OBRA INDIRETA																																																														
Gerente de Obra																																																														
Engenheiro	1																																																													
Téc. de Segurança																																																														
Aux. Adm																																																														
Mestre de obra																																																														
Encarregado geral	1																																																													
MÃO DE OBRA DIRETA																																																														
Topógrafo																																																														
Auxiliar de topografia																																																														
Pedreiro	1																																																													
Ajudante Geral	2																																																													
Caldeiro																																																														
Soldador																																																														
Operador de Motosserra																																																														
Motorista																																																														
Montador																																																														
Montador/Eletricista																																																														
Eletricista																																																														
Operador de Patrol																																																														
Operador de Escavadeira																																																														
Operador de Pá carregadeira																																																														
Operador de betoneira																																																														
Operador de betoneira																																																														
Plintor	4																																																													
Serralheiro																																																														
<p>PINTURA DE EXTERNA DA FACHADA</p> <p>INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE MADEIRA</p> <p>PINTURA ACRÍLICA DE PAREDES INTERNA</p>																																																														
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EPETIVO																																																												
OBSERVAÇÕES		<p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>Hh ACUMULADO</p>																																																												
		<p>EPETIVO EQUIPAMENTOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TPO</th> <th>QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veículo Leve</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caminhão Manick</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caminhão Toco</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Escavadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pá carregadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caçamba</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PC 200</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							TPO	QTDE	Veículo Leve		Caminhão Manick		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200																																					
TPO	QTDE																																																													
Veículo Leve																																																														
Caminhão Manick																																																														
Caminhão Toco																																																														
Escavadeira																																																														
Pá carregadeira																																																														
Caçamba																																																														
Patrol																																																														
PC 200																																																														
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																																																												
Data: 01/02/2023		Data: 01/02/2023																																																												

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

Carla de Matos Santos
 Engenheira Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X	S	S	D
 <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETIVO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 613-2022 RDO: 190</p>	EFETIVO PESSOAL							
	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	CATEGORIA	MÃO DE OBRA INDIRETA					
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA DE EXTERNA DA FACHADA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE MADEIRA PINTURA ACRÍLICA DE PAREDES INTERNA	Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Carregador geral 1							
	MÃO DE OBRA DIRETA							
Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Caldeiro Limpamante Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Mecânico Operador de Pistol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Pintor 4 Serralheiro								
h: DO DIA h: DO DIA h: DO DIA								
REBAMO DO EFETIVO								
EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO h: DO DIA h: ACUMULADO								
EFETIVO EQUIPAMENTOS								
Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Tecco Escavadeira Pá carregadeira Caldeira Pistol PC 200								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/02/2023		Data: 02/02/2023						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	Q	Q	S	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 193				EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Tralh. 3- Chuva of cond. Tralh. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		QTDE							
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA									
				Gerente de Obra								1	
				Engenheiro									
				Téc. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral								1	
Hh DO DIA													
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro									
				Ajudante Geral									
				Saldador									
				Capineiro									
				Operador de Motocerra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Paícol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor									
				Serralheiro									
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO		QTDE.							
				Veículo Leve									
				Caminhão Munk									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Paícol									
				PC 200									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 05/07/2023				Data: 05/03/2022									


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CARILAN...
 CREA-BA nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 016-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 194				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		QTDE				
REVISÃO DE TOMADAS INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO REVISÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA ORETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1 Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Párol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/02/2023				Data: 08/02/2023						



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 196				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Tralh. 3- Chuva af. cond. Tralh. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE			
REVISÃO DE TOMADAS INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO REVISÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Caloteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 4 Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA				JORNADA DE TRABALHO			
				Hh DO DIA				Hh ACUMULADO			
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 07/02/2023				Data: 07/02/2023							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	X	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL CATEGORIA: _____ QTDE: _____ MÃO DE OBRA INDIRETA: _____						
	OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA									
CONTRATO Nº 036-2022				LICITAÇÃO Nº 913-0222			RDO: 188			
Condições Climáticas	Manhã: (1)			Tarde: (1)			Noite: ()			
SIMBIOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva qd cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
CONCRETAGEM DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Auxiliar Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Plator Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO: _____ QTDE: _____ Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/02/2022				Data: 07/02/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 189				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2 - Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva al. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		QTDE				
ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tcc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Escalafão Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve Caminhão Múnick Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 280 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/02/2022				Data: 11/02/2022						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 200				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLÓGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trst. 3- Chuva el cond. Trst. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE			
SEM ATIVIDADE				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 300 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCLETAÇÃO:							
Data: 12/02/2023				Data: 12/02/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		X							
		S	T	Q	Q	S	S	D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015/2022 RDO: 201	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		EFETIVO PESSOAL						
	1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CATEGORIA	MÃO DE OBRA INOBRETA					QTDE
ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE			Gerente de Obra						
			Engenheiro						1
			Téc. de Segurança						
			Aux. Adm.						
			Mestre de obra						
			Encarregado geral						1
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topógrafo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro							
		Ajuntante Geral							
		Caldeirão							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Pátrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de cangamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO					QTDE.		
		Veículo Leve							
		Caminhão Manick							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Cangamba							
		Pátrol							
		PC 300							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:	FISCALIZAÇÃO:								
Data: 13/02/2022	Data: 13/02/2022								


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 BRUNO DE MATOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA Nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO N°: 036-2022 LICITAÇÃO N°: 013-2022 RDO: 202		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hs DO DIA						
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva ef. cond. Trab. 3- Chuva ef. cond. Trab.		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Canteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hs DO DIA						
SIMBOLOGIA REVISÃO DAS TOMADAS - BIBLIOTECA INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - BIBLIOTECA		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Manick Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
OBSERVAÇÕES								
GERENTE DE OBRA: Data: 14/02/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 14/02/2023						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 013-0922 RDO: 204		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CATEGORIA		QTDE				
PERÍODO DE CARNAVAL		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calafeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Palet Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve Caminhão Manick Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Palet PIC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 16/02/2023		Data: 18/02/2023						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CAP: 24507-34420-02

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 016-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 205		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: SMIROLOGIA Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	1- Tempo Bom 2- Chuva af cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PERÍODO DE CARNAVAL		MÃO DE OBRA INDRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro Tcn. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Encarregado geral					1 1	
Hs DO DIA		MÃO DE OBRA DIRETA						
CONSIDERAÇÕES		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Pátrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capamba Pintor Serralheiro						
		Hs DO DIA						
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA: Data: 17/02/2023		FISCALIZAÇÃO:		Data: 17/02/2023				
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve Caminhão Mtnck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capamba Pátrol PC 200 Placa Vibratória						




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 038-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 206 Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SÍMBOLO/CGM: 1- Tempo Bom 2- Chuva of comd. Trab. 3- Chuva of comd. Trab.				EFETIVO PESSOAL							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE			
				MÃO DE OBRA INDIRETA							
PERÍODO DE CARNAVAL				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA				RESUMO DO EFETIVO			
				MÃO DE OBRA DIRETA							
OBSERVAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/02/2022				Data: 18/02/2022							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 028-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 207		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou cond. Trst. 3- Chuva e/ou cond. Trst. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CATEGORIA		QTDE				
PERÍODO DE CARNAVAL		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mostra de obra Encarregado geral 1						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Cabeleleiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capamba Pintor 4 Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve Câmbio Manck Câmbio Toco Escavadeira Pá carregadeira Capamba Patrol PC 200 Peça Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 18/02/2022		FISCALIZAÇÃO: Data: 18/02/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036-2022				LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 209							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva at. cond. Trab. 3- Chuva at. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL							
PERÍODO DE CARNAVAL				CATEGORIA				QTDE			
				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Mão de obra direta							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 4 Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA HORAS DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Carreta Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/02/2023				Data: 21/02/2023							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CARILTON PEREIRA
 07060
 19245789005-0/0
 CIVIL-BA-00000000


 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	X	A	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA CONTRATO Nº: 016-2022 LICITAÇÃO Nº: 015-2022		RDO: 210						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()		EFETIVO PESSOAL						
SINALOLOGIA:		CATEGORIA: MÃO DE OBRA DIRETA QTDE						
1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trtb. 3- Chuva cf cond. Trtb. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
PERÍODO DE CARNAVAL		Hs DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceafiro Capileiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro 4						
		Hs DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE Veículo Lave Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 100 Placa Vibrotória						
GERENTE DE OBRA: Data: 22/02/2023		REALIZAÇÃO: Data: 22/02/2023						


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
 S.A.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Date																																																																																														
		S	T	X	Q	S	S	D																																																																																								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO N°: 036-2022 LICITAÇÃO N°: 015-0022 RDO: 211		EFETIVO PESSOAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORIA</th> <th>QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">MÃO DE OBRA INDIRETA</td> </tr> <tr> <td>Gerente de Obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Engenheiro</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tec. de Segurança</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aux. Adm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mestre de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Encarregado geral</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MÃO DE OBRA DIRETA</td> </tr> <tr> <td>Topografo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Auxiliar de topografia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pedreiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ajudante Geral</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caldeirao</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carpinteiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Motocicla</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador/Reletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Patrol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Escavadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Pá carregadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorista de caçamba</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pinitor</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Serralheiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESUMO DO EFETIVO</td> </tr> <tr> <td>EFETIVO DO DIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JORNADA DE TRABALHO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hh DO DIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hh ACUMULADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">EFETIVO EQUIPAMENTOS</td> </tr> <tr> <td>TIPO</td> <td>QTDE.</td> </tr> <tr> <td>Veículo Leve</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caminhão Manick</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caminhão Toco</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Escavadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pá carregadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caçamba</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pc 500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Placa Vibratória</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							CATEGORIA	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA		Gerente de Obra		Engenheiro	1	Tec. de Segurança		Aux. Adm		Mestre de obra		Encarregado geral	1	Hh DO DIA		MÃO DE OBRA DIRETA		Topografo		Auxiliar de topografia		Pedreiro		Ajudante Geral		Caldeirao		Carpinteiro		Operador de Motocicla		Motorista		Montador		Montador/Reletricista		Eletricista		Operador de Patrol		Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira		Motorista de caçamba		Pinitor	4	Serralheiro		Hh DO DIA		RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO		Hh DO DIA		Hh ACUMULADO		EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Manick		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		Pc 500		Placa Vibratória	
CATEGORIA	QTDE																																																																																															
MÃO DE OBRA INDIRETA																																																																																																
Gerente de Obra																																																																																																
Engenheiro	1																																																																																															
Tec. de Segurança																																																																																																
Aux. Adm																																																																																																
Mestre de obra																																																																																																
Encarregado geral	1																																																																																															
Hh DO DIA																																																																																																
MÃO DE OBRA DIRETA																																																																																																
Topografo																																																																																																
Auxiliar de topografia																																																																																																
Pedreiro																																																																																																
Ajudante Geral																																																																																																
Caldeirao																																																																																																
Carpinteiro																																																																																																
Operador de Motocicla																																																																																																
Motorista																																																																																																
Montador																																																																																																
Montador/Reletricista																																																																																																
Eletricista																																																																																																
Operador de Patrol																																																																																																
Operador de Escavadeira																																																																																																
Operador de Pá carregadeira																																																																																																
Motorista de caçamba																																																																																																
Pinitor	4																																																																																															
Serralheiro																																																																																																
Hh DO DIA																																																																																																
RESUMO DO EFETIVO																																																																																																
EFETIVO DO DIA																																																																																																
JORNADA DE TRABALHO																																																																																																
Hh DO DIA																																																																																																
Hh ACUMULADO																																																																																																
EFETIVO EQUIPAMENTOS																																																																																																
TIPO	QTDE.																																																																																															
Veículo Leve																																																																																																
Caminhão Manick																																																																																																
Caminhão Toco																																																																																																
Escavadeira																																																																																																
Pá carregadeira																																																																																																
Caçamba																																																																																																
Patrol																																																																																																
Pc 500																																																																																																
Placa Vibratória																																																																																																
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS:		PERÍODO DE CARNAVAL																																																																																														
CONSIDERAÇÕES:																																																																																																
OBSERVAÇÕES:																																																																																																
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																																																																																														
Data: 23/02/2023		Data: 23/02/2023																																																																																														


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Date						
				S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 018-2022				RDO: 212 Nome: ()						
SÍMBOLOGIA: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Climas al. cond. Trab. 3- Climas al. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTD						
PERÍODO DE CARNAVAL				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de cocamba Pintor 4 Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA FORMA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Manck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Cocambas Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/02/2023				Data: 24/02/2023						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS
 CIVIS DO BRASIL
 CREA - BA - 051888958-0
 CNPJ: 24.527.840/0001-02

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/02/2023 a 24/03/2023

Certificação Número: 2023022302151388693725

Informação obtida em 01/03/2023 12:56:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Certidão nº: 4850373/2023
Expedição: 02/02/2023, às 11:20:47
Validade: 01/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:38:20 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2023.

Código de controle da certidão: **0972.9658.2680.FADE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



02/02/2023

006151515

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º
GRAU

CERTIDÃO Nº: 006151515

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 02/02/2023, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 24.597.344/0001-98, estabelecida na edf ceo salvador shopping Torre londres, sala 913, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-021, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023.

PEDIDO Nº:

006151515





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00094027

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 01/03/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Endereço: edf ceo salvador shopping Torre londres, caminho das arvores, cep 41820021

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, quarta-feira, 1 de março de 2023



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20230659356

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/02/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 561.323/001-97
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Contribuinte: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: Avenida Tancredo Neves, Nº 2539
EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913
CAMINHO DAS ÁRVORES
41.820-021

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 13:57:18 horas do dia 06/02/2023.
Válida até dia 07/05/2023.

Código de controle da certidão: **A000.E32E.6E62.13F9.426E.477F.B247.53B4**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/01/2023 11:21:26.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo FIPhdkU42R100002.SFP é:

798d88e1-bdb8-46bb-ba81-9d6161a0e1fd

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 01/2023

NRA: FIPhdkU42R100002

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	MP2 CONSTRUÇOES EIRELI
Conta de débito:	1236 / 003 / 00004717-2

Representação numérica do código de barras:			
858000000445	858001802308	207673180824	459734400018

CNPJ/CEI empresa:	24.597.344/0001-98
Cód. convênio:	0180
Data de validade:	07/02/2023
Competência:	01/2023

Valor recolhido:	4.485,80
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	07/02/2023 17:39:31
Data de Débito:	07/02/2023

Código da operação:	0052112/
Chave de segurança:	KC8J73F046612LC3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2023 - 11:16:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.072,51	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.485,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.485,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858000000445 858001802308 207673180824 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2023 - 11:16:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.072,51	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.485,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.485,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858000000445 858001802308 207673180824 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SÉRIE 8.40 (17/10/2022)

DATA: 31/01/2023
HORA: 11:16:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES ETRELI
COMPTENCIA: 01/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

34

REMUNERAÇÃO

56.072,51

DEPÓSITO

4.485,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECEBER

4.485,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: F1EhdkU42R10000-2
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: A0ozmbK7iGM0000-2

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGUERADO

Empregados/Avulsos	5.152,46	0,00	0,00	0,00	5.152,46
Contribuintes Individuais	143,22	0,00	0,00	0,00	143,22
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.899,72	0,00	0,00	0,00	12.899,72
Contribuintes Individuais	260,40	0,00	0,00	0,00	260,40
RAT	1.934,95	0,00	0,00	0,00	1.934,95
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionalização Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	358,92	0,00	0,00	0,00	358,92
(-) Compensação	20.031,83	0,00	0,00	0,00	20.031,83
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	3.740,92	0,00	0,00	0,00	3.740,92
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.740,92	0,00	0,00	0,00	3.740,92
TOTAL A RECOLHER	3.740,92	0,00	0,00	0,00	3.740,92

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/60.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRATAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPRIMIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	01/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	45839589 / Reinf CP 18497238184 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.334,40	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 15.396,43	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.816,89	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 24.547,72	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
CPF	045.314.075-04
Telefone	9606-2129

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/02/2023 17:29:10
Nº do recibo de entrega	0000050000112964169

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 31/01/2023
HORA: 11:16:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 01/2023

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	20.371,89	20.031,83	340,06

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 13.914,61

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEJ FPAS VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI			24.597.344/0001-98			2119	507
358,92	0,00	3.740,92	358,92	0,00	0,00	3.740,92	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 20.031,83

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA -- RET

3580000000445 858001802308 207673180824 459734400008

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: FIPndkU42R10000-2
 FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 CDD REC: 150 COMP: 01/2023 N° CONTROLE: A9ozmbk71GM0000-2
 TOMADOR/OBRA : MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 900070528179 N° CONTROLE: Jg1GBeOeJgK000-0
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UFF
 TANCREDO NEVES NOVA CANDEIAS CANDEIAS 43815360 BA

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13º SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CÁLC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEFÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTALS DO TOMADOR		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13º SALÁRIO	7.088,63		
REM BASE CÁLC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	596,96	DEFÓSITO	0,00		
VAL DEVIDO PREV SOC	2.638,47	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3		

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

358000000445 858001802308 207673180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: FIPadkU42R10000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 01/2023
N° CONTROLE: A90zmbk71GW0000-2

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO 65.104,94	REV SEM 13º SALÁRIO 63.161,14
REM BASE CALC 13º SAL 695,70	REV 13º SALÁRIO 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 5.295,68	DEFÉBITO 4.485,80
VAL DEVIDO PREV SOC 3.740,92	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 40	TOTAL TRABALHADORES 37
TOTAL A RECOLHER	4.485,80

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
858000000445 858001802308 207673180824 459734400018

DATA: 31/01/2023
HORA: 11:16:42
PÁG : 0001/0014

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAIS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÂL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
BASE CÂL PREV SOCIAL DEPOSITO CBO
JAM
ADEMIR RAMOS DOS SANTOS 0,00 123.98467.24-6 14/09/2022 01 12/12/2022 02 07823
1.797,07 0,00 0,00 143,77

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2023
 HORA: 11:16:42
 PÁG : 0002/00.4

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000445 858001802308 207673180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPA3: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL BASE CÁL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CEO JYM
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	1.724,53	344,90	125.33459,18-8	344,90	25/08/2022	01		25/01/2023	II
VANILDO DE SOUZA DOS SANTOS	714,34	350,80	128.87251,08-4	350,80	08/09/2022	01		17/01/2023	II
					79,88			0,00	0,00

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO EGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000445 858001802308 207673180824 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GBS: 2119 FPA3: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GBS	FPA3	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO	
EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COMP: 01/2023	COD REC:150	COD GBS: 2119	FPA3: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	
Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CHD
			BASE CÁL	PREV SOCIAL	PREV SOC	SEF DEVIDA	SEG DEVIDA				DEPOSITO	JAM
JEFFERSON SANTOS DE JESUS	1.310,22	0,00	149.03088.27-4	0,00	22/09/2022	01	99,73	01		104,81	07170	0,00
JEFFERSON XAVIER FALCAO	1.302,00	0,00	149.71075.27-1	0,00	05/10/2022	01	99,00	01		104,16	07170	0,00
JONATAS SENA DOS SANTOS	1.302,00	0,00	156.78852.12-8	0,00	08/09/2022	01	99,00	01		104,16	07170	0,00
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS	1.302,00	0,00	161.88428.27-1	0,00	13/09/2022	01	99,00	01		104,16	07170	0,00
KLEBERSON EVANGELISTA LUIZ	1.302,00	0,00	164.62429.26-8	0,00	08/09/2022	01	99,00	01		104,16	07170	0,00
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	2.104,77	0,00	126.17799.06-0	0,00	08/09/2022	01	171,24	01		168,39	07170	0,00
LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	1.302,00	0,00	206.81087.27-1	0,00	16/11/2022	01	99,00	01		104,16	07170	0,00
MANOEL DE MATOS OLIVEIRA	1.302,00	0,00	163.50958.62-5	0,00	07/12/2022	01	99,00	01		104,16	07170	0,00
MANOEL REIS DOS ANJOS	2.104,77	0,00	114.35968.94-2	0,00	16/11/2022	01	171,24	01		168,39	07152	0,00
MARCELO FERREIRA DA PAZ	1.302,00	0,00	129.64314.44-8	0,00	08/09/2022	01	99,00	01		104,17	07170	0,00
MARCIO PIRES XAVIER	2.104,77	0,00	165.05257.76-5	0,00	14/09/2022	01	171,24	01		168,38	07152	0,00
MARCOS HENRIQUE DE ALMEIDA VIANA	1.302,00	0,00	203.40989.89-5	0,00	22/09/2022	01	99,00	01		104,16	07170	0,00
MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	2.195,00	0,00	165.03288.13-2	0,00	18/08/2020	01	179,37	01		175,60	041.0	0,00
NICKSON RAFAEL BOMFIM DE SOUZA	1.302,00	0,00	166.31153.86-8	0,00	22/09/2022	01	99,00	01		104,16	07170	0,00
PAULO DOS SANTOS NUNES	1.310,22	0,00	124.29967.98-9	0,00	26/09/2022	01	99,73	01		104,82	07170	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2023
 HORA: 11:16:42
 PÁG: 0005/00:4

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000445 858001802308 207673180324 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES ETRELLI
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES ETRELLI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAF	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CHO
												JAM
TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS					200.22590,25-5			12/09/2022	01			07170
	1.302,00	0,00			0,00			99,00			104,16	0,00
VANEZIO CONCEICAO FREITAS					124.19499,96-6			12/09/2022	01			07170
	1.302,00	0,00			0,00			99,00			104,17	0,00
WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS					139.23081,81-1			08/09/2022	01			07170
	1.302,00	0,00			0,00			99,00			104,16	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SETIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2023
HORA: 11:16:42
PÁG : 0006/00...4

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000445 858001802308 207673180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPA3: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO
CEO
JAM

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA
1.302,00
0,00
131.17567.06-1
0,00
01/07/2020
11
143,22
0,00
025:21
0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
59.813,38

695,70

695,70

4.698,72

4.485,80

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2023
HORA: 11:16:42
PÁG: 0007/00:4

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800000445 858001802308 207673180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES ETRELI N° ARQUIVO: FIPhdku42R10000-2
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES ETRELI N° DE CONTROLE: GCB80AVZY9A0000-0
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	36	56.072,51	0,00	56.714,31	695,70
11	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTALS:	37	57.374,51	0,00	58.016,31	695,70

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº DE CCNTROLE: GCB808VZYGA0000-0
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV EREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.102,45 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.698,72
 SALÁRIO FAMILIAR: 358,92 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,30 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,30 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,30 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,30 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 20.371,89
 VALOR ABATIDO: 20.031,83 VALOR A COMPENSAR: 340,06 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 13.914,61

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 3,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	2	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	0	31:	0	32:	0	33:	0	34:	0	35:	0	36:	0	37:	0	38:	0	39:	0	40:	0	41:	0	42:	0	43:	0	44:	0	45:	0	46:	0	47:	0	48:	0	49:	0	50:	0	51:	0	52:	0	53:	0	54:	0	55:	0	56:	0	57:	0	58:	0	59:	0	60:	0	61:	0	62:	0	63:	0	64:	0	65:	0	66:	0	67:	0	68:	0	69:	0	70:	0	71:	0	72:	0	73:	0	74:	0	75:	0	76:	0	77:	0	78:	0	79:	0	80:	0	81:	0	82:	0	83:	0	84:	0	85:	0	86:	0	87:	0	88:	0	89:	0	90:	0	91:	0	92:	0	93:	0	94:	0	95:	0	96:	0	97:	0	98:	0	99:	0	100:	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	------	---

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS Nº DE CCNTROLE: Jg1GBeOeJqK0000-0
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
 CIDADE: SALVADOR Nº ARQUIVO: F1PhdkU42R10000--2
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 900070528179
 CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	7.088,63	0,00	7.088,63	0,00
TOTAIS:	3	7.088,63	0,00	7.088,63	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº DE CONTROLE: A0ozmbk71GW0000-2
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPA5: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA BAIFRO: CAMINHO DAS ARVORES
 CIDADE: SALVADOR CEP: 41820-021 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	39	55.600,01	695,70	63.802,94	695,70
11	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTALS:	40	66.902,01	695,70	65.104,94	695,70

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: A90zmbk7iGW0000-2
 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: F1phdkU42R10000-2
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
 CIDADE: SAUVADOR

UF: BA

CEP: 41820-021

BARRIO: CAMINHO DAS ARVORES
 TELEFONE: 0071 9878 5510

CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CNAE: 4120400

VALOR DEV FREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.740,92 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.295,68
 SALÁRIO FAMILIA: 358,92 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR PERÍODO FINAL: 20.371,89
 VALOR ABAATIDO: 20.031,83 VALOR A COMPENSAR: 340,06 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 13.914,61

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABAATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECTAL/OCORRÊNCIA VALOR ABAATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	1	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0
