



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO: 515 / 2023

Data do Empenho: 21/07/2023

PROCESSO ADM: 121-2022

FORNECEDOR

Nome: 29 - APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço: R LOMANTO JUNIOR, 6 TRAVESSA, 650
Bairro: CENTRO

CNPJ: 13.200.059/0001-75

Insc. Estadual:

Cidade: SANTALUZ

Tipo Pessoa: Jurídica

Complemento: TERREOSALA 01

Conta Corrente: 20000-0

Agência: 3231-X

CPF:

RG:

Estado: BA

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RL N° Lic.: 002-2022RDC

Convênio: - Contrato: 223-2022

Patrimônio: -

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

44.026,32

43.045,06

981,26

HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME LICITAÇÃO 002-2022RDC, CONTRATO N°223-2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 A 14/07/2023. NF 202332.

Data do Empenho: 21/07/2023

Data do Liquidação: 21/07/2023

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.00.005	ISS - Fonte 1500	1.291,35
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME FONTE 01	2.840,97
## Trinta e oito mil e novecentos e doze reais e setenta e quatro centavos ##		4.132,32
		Valor Retido
		Valor Líquido
		38.912,74

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	17/07/2023	202332	U			43.045,06

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	43.045,06

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 21/07/2023.

NILZÊNE PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Educação
Matrícula: 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 21/07/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

3211177



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 121-2022

EMPENHO: 515 / 2023

Data do Empenho: 21/07/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: **29 - APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**
 Endereço: R LOMANTO JUNIOR, 6 TRAVESSA, 650
 Bairro: CENTRO
 CNPJ: 13.200.059/0001-75 Insc. Estadual: Cidade: SANTALUZ
 Complemento: TERREOSALA 01
 Conta Corrente: 20000-0 Agência: 3231-X CPF: Estado: BA
 RG:
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCALUZ
 Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI Nº Lic.: 002-2022RDC
 Convênio: Contrato: 223-2022
 Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
44.026,32	43.045,06	981,26

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME LICITAÇÃO 002-2022RDC, CONTRATO Nº 223-2022.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	43.045,06	43.045,06

Quarenta e três mil e quarenta e cinco reais e seis centavos

43.045,06

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 21/07/2023.

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
 Secretária de Educação
 Matrícula: 0598

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 21/07/2023

NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula: 6408

3211177



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

Secretaria de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:

202332

Data da Competência:

Julho/2023

Data e Hora da Emissão:

17/07/2023 09:08:00

Código Verificação:

F2C605DFB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
13.200.059/0001-75Telefone:
753265227...Nome/Razão Social:
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA MEEndereço:
RUA RUA LOMANTO JÚNIOR, 6º TRAVESSA, TÉRREO SALA 01 Nº 650 BAIRRO CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA
E-mail:
CONTRATOS.APICE@GMAIL.COMInscrição Municipal:
2811Inscrição Estadual:
101702045MENome Fantasia:
Apice Engenharia

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
13807870000119

Telefone:

Nome/Razão Social:
Prefeitura Municipal de SantaluzEndereço:
AVN GETÚLIO VARGAS Nº S/N PRÉDIO PÚBLICO BAIRRO: CENTRO ADMINISTRATIVO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000
E-mail:
Não InformadoInscrição Municipal:
1

Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
LOCAL: DISTRITO DE SERRA BRANCA
EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CONTRATO: 223/2022 RDC PRESENCIAL 02/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
Período de 01/07/2023 a 14/07/2023

60% MÃO DE OBRA R\$ 25.827,04
40% INSUMOS R\$ 17.218,02

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
 EM 19/07/23 Tony Felix Andrade
 Assinatura

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.000.677.8

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 43.045,06

CNAE - 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTEIORMENTE
Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG

VALOR SERVIÇOS:
R\$ 43.045,06VALOR DEDUÇÃO:
R\$ 0,00DESC. INCOND: BASE DE
R\$ 17.218,02 CÁLCULO:
R\$ 25.827,04ALÍQUOTA:
5%VALOR ISS:
R\$ 0,00VALOR ISS
RETIDO:
R\$ 1.291,35DESC. COND:
R\$ 0,00VALOR PIS:
R\$ 0,00VALOR COFINS:
R\$ 0,00VALOR IR:
R\$ 0,00VALOR INSS:
R\$ 2.840,97VALOR CSLL:
R\$ 0,00OUTRAS RETENÇÕES:
R\$ 0,00VALOR LÍQUIDO:
R\$ 21.694,72

DADOS COMPLEMENTARES

VALORES RETIDO NA NFSE - ISS (5%) R\$ 1.291,35 INSS (11%) 2.840,97 Dados bancários :Bradesco Agência: 3231 Cc: 20.000-0

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS	REGIME TRIBUTAÇÃO	SIMPLES NACIONAL	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO	LOCAL INCIDÊNCIA	ISS Retido
Exigível	Micro Empresário e Empresa de Pequeno Port(ME EPP)	Não	SANTALUZ - BA	SANTALUZ - BA	Sim

Observação:

- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 3772,71 (Alíquota 17,39 IBPT)

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.200.059/0001-75

Razão

Social:

APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME

Endereço:

PRAC DO TETRA 14 / CENTRO / SANTALUZ / BA / 48880-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/06/2023 a 27/07/2023

Certificação Número: 2023062804082442712680

Informação obtida em 04/07/2023 10:38:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.200.059/0001-75

Certidão nº: 4890396/2023

Expedição: 02/02/2023, às 15:13:50

Validade: 01/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.200.059/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 13.200.059/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:04:05 do dia 24/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2023.

Código de controle da certidão: **BA73.A8CC.0321.43FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20233035620

RAZÃO SOCIAL	
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
101.702.045	13.200.059/0001-75

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/05/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3983c16b5b4c0efa30a24434431766ca15ebcd6e457bf5a9d77bb65fd3430399** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **146109** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**30-12-23 Certidão Municipal Apice**", cujo assunto é descrito como "**30-12-23 Certidão Municipal Apice**", faz prova de que em **03/07/2023 13:16:01**, o responsável **Ápice Engenharia e Consultoria Ltda (13.200.059/0001-75)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Ápice Engenharia e Consultoria Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/07/2023 13:18:46** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xdeadf25a0eae92a14b0fc6d6eeb967093699acdeb35f0133c9de6e522a5c67bc**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
SANTALUZ
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 1085/2023

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome Apice Engenharia e Consultoria LTDA ME		C.G.A 2811	C.N.P.J. 13.200.059/0001-75
Endereço: Rua Rua Lomanto Júnior, 6º Travessa, Térreo Sala 01, 650 Sala			
Bairro: Centro	CEP: 48880000	Município: SANTALUZ	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços .
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
03/07/2023

Código de Controle da Certidão:

Certidão Valida até: 30/12/2023

13444.1085.20230703.N40.8168



Leonardo Carlos Sousa
Supervisionado do Departamento de Tributos
Portaria nº 122/2022



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/07/2023 13:19:17 que o documento de hash (SHA-256)
3983c16b5b4c0efa30a24434431766ca15ebcd6e457bf5a9d77bb65fd3430399 foi validado em 03/07/2023 13:18:19 através da transação blockchain
0xdeadf25a0eae92a14b0fc6d6eeb967093699acdeb35f0133c9de6e522a5c67bc e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 146109)





ápíce engenharia

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
LOCAL: DISTRITO DE SERRA BRANCA
EMPRESA: APÍCE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CONTRATO: 223/2022 RDC PRESENCIAL 02/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ BA
Número da obra 011

PERÍODO DE MEDIÇÃO
VALOR CONTRATUAL
VALOR DA MEDIÇÃO
SALDO CONTRATUAL

01/07/2023 a 14/07/2023
R\$ 905.785,11
R\$ 43.045,06
R\$ 882,36

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	BOLETIM DE MEDIÇÃO 10		VALORES				
							Total	ACUMULADO	PERÍODO	SALDO	ACUMULADO	PERÍODO	SALDO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					12.645,05						
1.1	51	ORSE											
1.1	51	ORSE		6	301,02	367,57	2.205,42	6,00	2.205,42	R\$	-	R\$	
1.2	97622	SINAPI	m²	52,26	45,42	55,46	2.898,33	52,26	2.898,34	R\$	-	R\$	
1.3	100938	SINAPI	M3XKM	522,6	3,77	4,60	2.403,96	522,60	2.403,96	R\$	-	R\$	
1.4	97644	SINAPI	m²	39,9	7,62	9,30	371,07	39,90	371,07	R\$	-	R\$	
1.5	97647	SINAPI	m²	10,58	2,92	3,56	37,66	10,58	37,66	R\$	-	R\$	
1.6	97650	SINAPI	m²	468,41	6,27	7,65	3.583,34	468,41	3.583,34	R\$	-	R\$	
1.7	13	ORSE	m3	10,68	255,06	311,45	3.326,28	10,68	3.326,29	R\$	-	R\$	
1.8	2095	ORSE	un	5	11,38	13,90	77,75	5,00	69,50	R\$	-	R\$	
1.9	3262	ORSE	un	3	11,38	13,90	46,65	3,00	41,70	R\$	-	R\$	
1.10	3	ORSE	m2	228	3,82	4,67	1.197,00	228,00	1.064,76	R\$	-	R\$	
16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	269,07	17,25	21,06	5.666,96	269,07	5.666,96	R\$	-	R\$	
12	ORSE	Demolição de forres	m2	468,24	5,29	6,46	3.025,92	468,24	3.025,92	R\$	-	R\$	
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					13.421,00						
2.1	90778	SINAPI	H	100	109,91	134,21	13.421,00	100,00	13.421,00	R\$	-	R\$	
3		SISTEMA DE VEDAÇÃO					44.724,81						

MATEUS MOURA AGUIAR
CREATA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL, SANTARISTA E AMBIENTAL

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

faceb.do
14/07/2023

13.200.059/0001-75
APÍCE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

3.1	87487 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÁO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	433,26	78,04	95,29	41.285,35	433,26	-	R\$	41.285,35	R\$	-	R\$
3.2	9961 ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	105,57	65,29	79,72	8.416,04	105,57	-	R\$	8.416,04	R\$	-	R\$
3.3	Próprio	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	m	200,54	44,46	54,29	10.887,31	200,54	-	R\$	10.887,31	R\$	-	R\$
	SANTICO 103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	10,56	100,58	122,82	1.296,98	10,56	-	R\$	1.296,98	R\$	-	R\$
4		ESQUADRIAS					54.125,27	10,56	-	R\$	1.297,00	R\$	-	R\$
4.1		PORTAS					23.106,80							
4.1.1	90850 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	731,41	893,12	1.786,24	2,00	-	R\$	1.786,24	R\$	-	R\$
4.1.2	90849 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18	679,82	830,12	14.942,16	18,00	-	R\$	1.786,24	R\$	-	R\$
4.1.3	90848 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	662,31	808,74	808,74	1,00	-	R\$	808,74	R\$	-	R\$
4.1.4	90848 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	662,31	808,74	1.617,48	2,00	-	R\$	808,74	R\$	-	R\$
4.1.5	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,15	380,05	464,07	1.461,82	3,15	-	R\$	1.617,48	R\$	-	R\$
	102182 SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UNID	3	749,57	931,26	2.793,79	3,15	-	R\$	1.461,82	R\$	-	R\$
4.2		FERRAGENS E ACESSÓRIOS					3.562,67	3,00	-	R\$	2.793,78	R\$	-	R\$
4.2.1	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE EURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ferroliho ou tarjeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	UN	23	123,10	150,31	3.457,13	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$
4.2.2	1865 ORSE	Gradil para subslabão, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta Fos88	m2	50,78	229,03	279,86	16.450,68	50,78	-	R\$	98,60	R\$	98,60	R\$
4.3		GRADIL					16.450,68	2,00	-	R\$	98,60	R\$	-	R\$
4.3.1	11445 ORSE	Gradil para subslabão, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta Fos88	m2	50,78	229,03	279,86	14.201,13	50,78	-	R\$	14.201,13	R\$	-	R\$

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433936
ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.055.677.8

13.200.059/0001-75
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

4.3.2	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	101,56	18,14	22,15	2.249,55	101,56	-	R\$	2.249,55	R\$	-
4.4			JANELAS											
4.4.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 3 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E	m²	27,75	302,94	369,92	10.065,12	11.005,12	-	R\$	2.249,55	R\$	-
4.4.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 2 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E	m²	1,5	302,94	369,92	564,88	27,75	-	R\$	10.285,28	R\$	-
4.4.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	0,5	302,94	369,92	184,96	1,50	-	R\$	554,88	R\$	-
5			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS											
5.1	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm.	un	18	105,76	129,14	27.203,35	0,50	-	R\$	184,96	R\$	-
5.2	1028	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	100	13,33	16,27	2.324,52	18,00	-	R\$	2.324,52	R\$	-
5.3	89412	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	9,45	11,53	115,30	100,00	-	R\$	1.627,00	R\$	-
5.4	1150	ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	20	4,89	5,97	119,40	10,00	-	R\$	115,30	R\$	-
5.5			CAIXA D'ÁGUA 15.000L											
5.5.1	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8	14,55	17,76	142,08	20,00	-	R\$	119,40	R\$	-
5.5.2	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	68,72	83,91	419,55	8,00	-	R\$	142,08	R\$	-
5.5.3	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	178,37	217,80	435,60	5,00	-	R\$	419,55	R\$	-
5.6			ESGOTO											
5.6.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mistérios, ralos sifonados, etc...)	un	8	60,02	73,29	586,32	2,00	-	R\$	435,60	R\$	-
5.6.2	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	8	85,08	103,89	831,12	8,00	-	R\$	586,32	R\$	-
5.6.3	1712	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	un	1	1.826,14	2.229,89	2.229,89	8,00	-	R\$	831,12	R\$	-
5.6.4	98058	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	1.329,85	1.623,87	1.623,87	1,00	-	R\$	2.229,89	R\$	-
5.6.5	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	2.060,90	2.516,56	2.516,56	1,00	-	R\$	1.623,87	R\$	-
5.6.6	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	138	16,11	20,28	2.798,64	1,00	-	R\$	2.516,56	R\$	-
5.6.7	89857	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10	25,93	31,66	316,60	138,00	-	R\$	2.798,64	R\$	-
5.6.8	4404	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m	UND	6	123,36	150,63	903,78	10,00	-	R\$	316,60	R\$	-
					6,00							R\$		R\$

13.200.059/0001-75
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6° TRAVESSA, Nº 650

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.065.677.8

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL - SANITARISTA E AMBIENTAL

5.7	ACESSÓRIOS										12.735,34									
5.7.1	102113	SINAPI	UN	1	942,30	1.150,64					1.150,64									
5.7.2	100866	SINAPI	UN	4	220,95	269,80					1.079,20									
5.7.3	100874	SINAPI	UN	2	220,95	269,80					539,60									
5.7.4	7180	ORSE	un	2	328,85	401,55					803,10									
5.7.5	86910	SINAPI	UN	8	70,15	85,66					685,28									
5.7.6	100858	SINAPI	UN	2	418,87	511,48					1.022,96									
5.7.7	86932	SINAPI	UN	7	441,52	539,14					3.940,02									
5.7.8	93398	SINAPI	UN	4	404,67	494,14					1.976,56									
5.7.9	93441	SINAPI	UN	2	629,76	768,99					1.537,98									
6																				
6.1	91924	SINAPI	M	249,84	2,24	2,73					36.430,12									
6.2	91926	SINAPI	M	2583,93	3,22	3,93					10.154,84									
6.3	91928	SINAPI	M	114,85	5,15	6,28					721,25									
6.4	91932	SINAPI	M	156	11,50	14,04					2.190,24									
6.5	92984	SINAPI	M	36	20,36	24,86					894,96									
6.6	8896	ORSE	un	4	33,05	40,35					161,40									
6.7	96996	SINAPI	UN	4	98,93	120,80					483,20									
6.8	93633	SINAPI	UN	4	8,57	10,46					41,84									
6.9	93654	SINAPI	UN	11	9,10	11,11					122,21									
6.10	93656	SINAPI	UN	1	10,08	12,30					12,30									

13.200.059/0001-75
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

6.11	101887 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1	739,60	903,12	903,12	1,00	-	R\$	903,12	R\$	-	R\$
6.12	8894 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	4	48,62	59,36	237,44	4,00	-	R\$	237,44	R\$	-	R\$
6.13	9041 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v	un	1	79,36	96,90	96,90	1,00	-	R\$	96,90	R\$	-	R\$
6.14	9050 ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha paralela) SKA	un	3	96,99	118,43	360,96	3,00	-	R\$	360,96	R\$	-	R\$
6.15	93677 SINAPI	DISJUNTOR DR 90 A	UN	1	86,67	108,27	108,27	1,00	-	R\$	108,27	R\$	-	R\$
6.16	91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	468,81	7,22	8,81	4.130,21	468,81	-	R\$	4.130,22	R\$	-	R\$
6.17	91836 SINAPI	PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	38,15	9,25	11,29	430,71	38,15	-	R\$	430,71	R\$	-	R\$
6.18	93008 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	79	11,95	14,59	1.152,61	79,00	-	R\$	1.152,61	R\$	-	R\$
6.19	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	24	11,64	14,21	341,04	24,00	-	R\$	341,04	R\$	-	R\$
6.20	91876 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	5	6,82	8,32	41,60	5,00	-	R\$	41,60	R\$	-	R\$
6.21	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4	11,12	13,57	54,28	4,00	-	R\$	54,28	R\$	-	R\$
6.22	93013 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	4	11,47	14,00	56,00	4,00	-	R\$	56,00	R\$	-	R\$
6.23	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	4	17,38	21,22	84,88	4,00	-	R\$	84,88	R\$	-	R\$
6.24	12228 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	440,94	538,43	538,43	4,00	-	R\$	538,43	R\$	-	R\$
6.25	91955 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	11	23,86	29,13	320,43	1,00	-	R\$	320,43	R\$	-	R\$
6.26	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	23	30,10	36,75	845,25	11,00	-	R\$	845,25	R\$	-	R\$
6.27	91975 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1	55,12	67,30	67,30	23,00	-	R\$	67,30	R\$	-	R\$
6.28	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	49	20,07	24,50	1.200,50	1,00	-	R\$	1.200,50	R\$	-	R\$
6.29	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	8	32,57	39,77	318,16	49,00	-	R\$	318,16	R\$	-	R\$
6.30	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	10	31,35	38,28	382,80	8,00	-	R\$	382,80	R\$	-	R\$
6.31	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2	23,23	28,36	56,72	10,00	-	R\$	56,72	R\$	-	R\$
6.32	10793 ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev01	un	104	12,94	15,80	1.737,84	2,00	-	R\$	1.737,84	R\$	-	R\$
					104,00	129,40	1580,00	104,00		R\$	1.643,20	R\$		R\$

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.065.677.8

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL (SANTARISTA E AMBIENTAL)

13.200.059/0001-75
APICE ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

6.33	9138	ORSE	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "X", com tampa	un	26	21,65	26,43	687,18	26,00	-	R\$	687,18	R\$	-	R\$
6.34	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Nícol com lente para leitura	un	1	566,32	691,53	691,53	1,00	-	R\$	691,53	R\$	-	R\$
6.35	4879	ORSE	Bocal para lâmpada incandescente	un	16	6,94	8,47	135,52	16,00	-	R\$	135,52	R\$	-	R\$
6.36	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	16	23,61	28,83	461,28	16,00	-	R\$	461,28	R\$	-	R\$
6.37	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W, 6500K G- Light ou similar.	un	20	81,09	99,01	1.980,20	20,00	-	R\$	1.980,20	R\$	-	R\$
6.38	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar.	un	20	116,79	142,61	2.852,20	20,00	-	R\$	2.852,20	R\$	-	R\$
6.39	9891	ORSE	Luminária plafonier, sobrepor, em alumínio, com difusor em vidro, p/lâmpada eletrônica, ref. XP-338, de Xoulux ou similar, completa	un	6	94,52	115,41	692,46	6,00	-	R\$	692,46	R\$	-	R\$
7			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
7.1	96623	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMIA. AF_09/2017	m³	21,66	81,28	99,25	2.149,76	21,66	-	R\$	2.149,76	R\$	-	R\$
7.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_09/2016	m³	196,1	89,90	109,78	26.355,84	196,10	-	R\$	21.527,86	R\$	-	R\$
8			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO												
8.1			INFRAESTRUTURA												
8.1.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,5	330,08	403,06	201,53	0,50	-	R\$	201,53	R\$	-	R\$
8.1.2	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	6,26	2.165,91	2.644,79	16.556,39	6,26	-	R\$	16.556,39	R\$	-	R\$
8.1.3	11322	ORSE	Blcco cerâmico tipo "U" (cealha) 9x19x19cm	m	78,4	17,07	20,84	1.633,85	78,40	-	R\$	1.633,86	R\$	-	R\$
8.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,36	443,69	541,78	195,04	0,36	-	R\$	195,04	R\$	-	R\$
8.1.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	70,5	31,51	38,47	2.712,14	70,50	-	R\$	2.712,14	R\$	-	R\$
8.2			SUPERESTRUTURA												
8.2.1	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	11,58	2.165,91	2.644,79	3.808,49	11,58	-	R\$	3.808,49	R\$	-	R\$
9			REVESTIMENTOS												
9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	m²	675,33	3,94	4,81	3.248,34	675,33	-	R\$	3.248,34	R\$	-	R\$
9.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	1289,03	20,95	25,58	32.461,79	1.289,03	-	R\$	32.461,79	R\$	-	R\$
									1.289,03	-	R\$	32.461,79	R\$	-	R\$

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.066.677.8

13.200.059/0001-75
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 61 TRAVESSA, Nº 650

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL - SANITARISTA E AMBIENTAL

11.1.1	94865 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	541,78	14.097,12	26,02								R\$	14.097,12	R\$	
11.1.2	10170 ORSE	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusiva argamassa de regularização	m²	34,50	11.407,08	0				26,02				R\$		R\$	
	4786 SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E = 8" MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	73,08	38.940,39	532,86								R\$		R\$	
11.1.3	2259 ORSE	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	11,32	1.852,01	134,01				532,86				R\$		R\$	
11.1.4	2187 ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	13,82	1.852,01	383,54				134,01				R\$		R\$	
11.1.5	9604 ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha White Home, antiráfida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada aci-1, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	12,02	4.730,35	9,85				134,01				R\$		R\$	
			m²	69,28	17.088,60	56,74				393,54				R\$		R\$	
11.1.6	87257 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	m²	73,05	68.106,70	932,33				246,66				R\$		R\$	
11.1.7	7987 ORSE	Pastilha de vidro, 2,5 x 2,5 cm, cor vermelho, ref: D 4010, linha Cristal, marca Vitrocolori ou similar, aplicada com argamassa industrializada aci-1, rejuntada, exclusiva emboço	m²	194,30	8.999,97	46,32				932,33				R\$		R\$	1.631,21
11.1.8	42 ORSE	Apicamento total de reboco com ponteeiras/lalhadeiras	m³	2,11	2.003,45	949,5				46,32				R\$		R\$	
	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	76,01	410,45	5,4				949,50				R\$		R\$	
11.2		PISOS EXTERNOS															
11.2.1	92394 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	m²	55,35	38.741,52	247,57				5,40				R\$		R\$	
11.2.2	92394 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	m²	55,35	13.702,99	45,33				5,40				R\$		R\$	
11.2.3	2394 ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	55,35	10.491,03	45,33				247,57				R\$		R\$	695,75
11.2.4	98510 SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF_05/2018	m³	83,26	264,76	3,18				189,54				R\$		R\$	
11.2.5	98509 SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA, AF_05/2018	UN	58,69	704,28	48,07				3,18				R\$		R\$	264,77
11.2.6	10234 ORSE	Grma esmeralde em placas, fornecimento e plantio	UN	35,80	250,60	29,32				12,00				R\$		R\$	704,28
11.2.7	94931 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	m²	16,97	540,15	13,90				7,00				R\$		R\$	250,60
			m³	550,72	12.787,71	451,01				31,83				R\$		R\$	540,16
12		PINTURA															
12.1	2344 ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	4,06	17.304,84					23,22				R\$		R\$	12.787,72
12.2	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014	m²	3,32	6.560,11	1.615,79				1.615,79				R\$		R\$	
12.3	88495 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	2,84	4.588,84	1.615,79				1.615,79				R\$		R\$	
12.4	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	11,36	18.355,37	9,31				1.615,79				R\$		R\$	
			m²	13,40	20.609,60	10,98				1.538,03				R\$		R\$	
														R\$		R\$	20.609,60
														R\$		R\$	5.199,60

13.200.059/0001-75

APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6º TRAVESSA, Nº 650

Tony Félix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.066.677.8

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433936
ENGENHEIRO CIVIL / SANITÁRIA E AMBIENTAL

12.5	3733	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref/Deiguard FS ou similar- R1	m2	290,02	13,62	16,63	4.823,03	290,02	90,02	-	R\$ 4.823,03	R\$ 1.497,03	R\$ -
12.6	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO, AF_05/2021	m²	77,72	36,55	44,63	3.468,64	77,72	77,72	-	R\$ 3.468,64	R\$ 3.468,64	R\$ -
12.7	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020_P	m²	105,57	18,14	22,15	2.338,37	105,57	105,57	-	R\$ 2.338,37	R\$ 2.338,38	R\$ -
12.8	3841	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL (piranga ou similar - R1)	m2	318,76	16,42	20,05	6.400,70	318,76	105,57	-	R\$ 6.391,14	R\$ 2.338,38	R\$ -
13			LETREIRO					4.594,77				R\$	R\$	R\$ -
13.1	12053	ORSE	Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	20	49,92	60,95	1.219,00	20,00			R\$ 1.219,00	R\$ -	R\$ -
13.2	12055	ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	15	79,20	96,71	1.450,65	15,00			R\$ 1.450,65	R\$ -	R\$ -
13.3	12057	ORSE	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	14	136,01	166,08	2.325,12	14,00			R\$ 2.325,12	R\$ -	R\$ -
14			CASTELO D'ÁGUA					43.866,02				R\$	R\$	R\$ -
14.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					748,11				R\$	R\$	R\$ -
14.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	m³	5,78	81,28	99,25	573,66	5,78			R\$ 573,67	R\$ -	R\$ -
14.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	m³	1,06	33,73	41,19	92,81	1,06			R\$ 43,66	R\$ -	R\$ -
14.1.3	5103	ORSE	Regularização Manual	m2	12,96	4,59	5,60	81,64	12,96			R\$ 72,58	R\$ -	R\$ -
14.2			FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA					43.117,91				R\$	R\$	R\$ -
14.2.1	101175	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF_05/2020	M	56	108,54	132,53	7.421,68				R\$ 7.421,68	R\$ -	R\$ -
14.2.2	94962	SINAPI	CONCRETO MÁGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	12,86	330,08	403,06	5.223,65	56,00			R\$ 5.223,66	R\$ -	R\$ -
14.2.3	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25.MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	7,2	78,22	95,51	687,67	12,96			R\$ 687,67	R\$ -	R\$ -
14.2.4	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	4,71	2.165,91	2.644,79	12.456,96	7,20			R\$ 12.456,96	R\$ -	R\$ -
14.2.5	Combol	Próprio	CASTELO D'ÁGUA 15.000 L	und	1	14.190,45	17.327,95	17.327,95	4,71			R\$ 17.327,95	R\$ -	R\$ -
15			PARQUE INFANTIL					13.365,55				R\$	R\$	R\$ -
15.1	9165	ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e e=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar	Un	1	2.757,93	3.367,70	3.367,70	1,00			R\$ 17.327,95	R\$ -	R\$ -
15.2	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Alalaia Nova	un	2	1.102,49	1.346,25	2.692,50	1,00			R\$ 3.367,70	R\$ -	R\$ -
15.3	9160	ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	1	2.682,81	3.275,97	3.275,97	2,00			R\$ 2.692,50	R\$ -	R\$ -
									1,00			R\$ 3.275,97	R\$ -	R\$ -

13.200.059/0001-75
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 60 TRAVESSA, Nº 650

Tony Félix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.066.677.8

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 1504433938
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

15.4	9166	ORSE	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/manguieira plástica transp., fixado em tubo ferro galvan.	un	1	3.299,80	4.029,38	4.029,38	4.029,38	1,00	-	R\$	4.029,38	R\$	-	
16			CANTEIROS E BANCOS													
16.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,47	68,04	83,08	12.725,40	371,36	-	-	R\$	371,37	R\$	-	
16.2	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,94	330,06	403,06	378,87	-	4,47	-	R\$	378,88	R\$	-	
16.3	87478	SINAPI	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	59,19	39,34	48,03	2.842,89	-	0,94	-	R\$	378,88	R\$	-	
16.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	118,38	3,94	4,81	569,40	-	59,19	-	R\$	2.842,90	R\$	-	
16.5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	118,38	20,95	25,58	3.028,16	-	118,38	-	R\$	569,41	R\$	-	
16.6	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_09/2014	m²	118,38	9,31	11,36	1.344,79	-	118,38	-	R\$	3.028,16	R\$	-	
16.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	118,38	10,98	13,40	1.586,29	-	118,38	-	R\$	1.344,80	R\$	-	
16.8	198	ORSE	Madeiramento em massarandubá/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	16,21	95,57	116,70	1.891,70	-	118,38	118,38	-	R\$	1.586,29	R\$	-
16.9	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvínil ou similar)	m2	32,42	17,99	21,96	711,94	-	16,21	-	R\$	1.891,71	R\$	-	
17			SERVIÇOS FINAIS													
17.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1751,59	2,15	2,62	4.589,16	-	32,42	-	R\$	711,94	R\$	-	
17.1	11986	ORSE	Placa de maquiagem em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	UM	1	1.054,08	1.054,08	1.054,08	-	1,751,59	1751,59	-	R\$	4.589,17	R\$	-
18			DRENAGEM													
18.1	4404	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m	m²	6,00	123,36	150,63	903,78	-	1,00	-	R\$	1.054,08	R\$	-	
18.2	89890	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO	UN	6,00	14,50	17,71	106,26	-	6,00	-	R\$	903,78	R\$	-	
18.3	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	UN	2,00	8,93	10,90	21,80	-	6,00	-	R\$	106,26	R\$	-	
18.4	C1436	SEINFR	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M²	5,55	127,25	155,38	862,36	-	2,00	-	R\$	21,80	R\$	-	
										5,55	-	R\$	-	R\$	862,36	

13.200.059/0001-75

APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.001/177,8

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL - SANITARISTA E AMBIENTAL

18.5	1027	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	M	11,00	1393,05	126,55				R\$	-	R\$	1.393,05	R\$	-	R\$	-
18.6	2476	ORSE	Resgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1/2"	M	5,57	704,88	126,55				R\$	-	R\$	704,88	R\$	-	R\$	-
18.7	90468	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	5,41	684,64	126,55				R\$	-	R\$	684,64	R\$	-	R\$	-
18.8	89406	SINAPI	CURVA 90 GRAUS; PVC; SOLDÁVEL, DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,35	690,75	45,00				R\$	-	R\$	690,75	R\$	-	R\$	-
18.9	MERCAD	COMP.	CAIXA DE PASSAGEM DRENO AR CONDICIONADO	UN	15,77	236,55	15,00				R\$	-	R\$	236,55	R\$	-	R\$	-
18.10	90227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	70,23	5685,12	80,95				R\$	-	R\$	5.685,12	R\$	-	R\$	-
19			JARDIM DE INVERNO E HORTA															
19.1	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	387,29	R\$ 2.439,90	6,30				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
19.2	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	77,77	R\$ 278,41	3,58		3,58		R\$	-	R\$	278,42	R\$	278,42	R\$	-
19.3	8760	ORSE	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	UN	122,13	R\$ 244,25	2,00		2		R\$	-	R\$	244,26	R\$	244,26	R\$	-
19.4	9868	ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	UN	17,50	R\$ 175,01	10,00		10		R\$	-	R\$	175,00	R\$	175,00	R\$	-
19.5	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	11,27	R\$ 122,88	10,90		10,9		R\$	-	R\$	122,84	R\$	122,84	R\$	-
19.6	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	80,93	R\$ 242,80	3,00				R\$	-	R\$	242,79	R\$	-	R\$	-
TOTAL GERAL										R\$	905.785,11	R\$	43.045,06	R\$	904.922,75	R\$	862,36	

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL (SANTARISTA E AMBIENTAL)
 MATEUS MOURA AGUIAR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA 52230/d ba

af
Tony Félix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.055.677.8

13.200.059/0001-75
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6º TRAVESSA, Nº 650

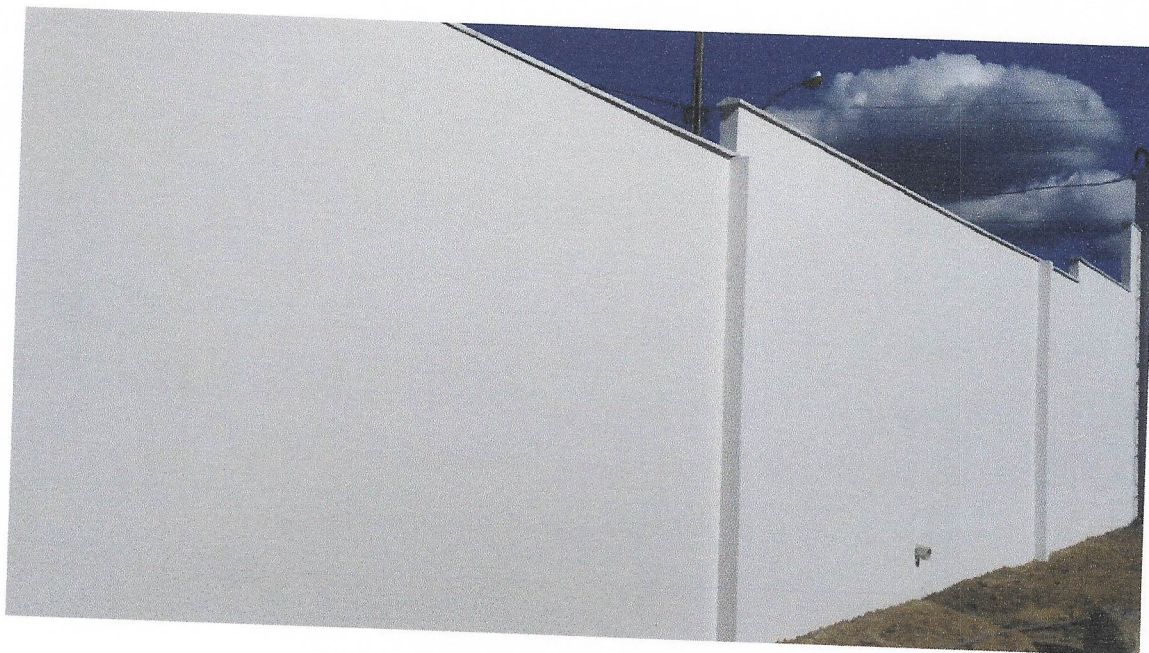


FOTO 01 EXECUÇÃO DE PINTURA EXTERNA

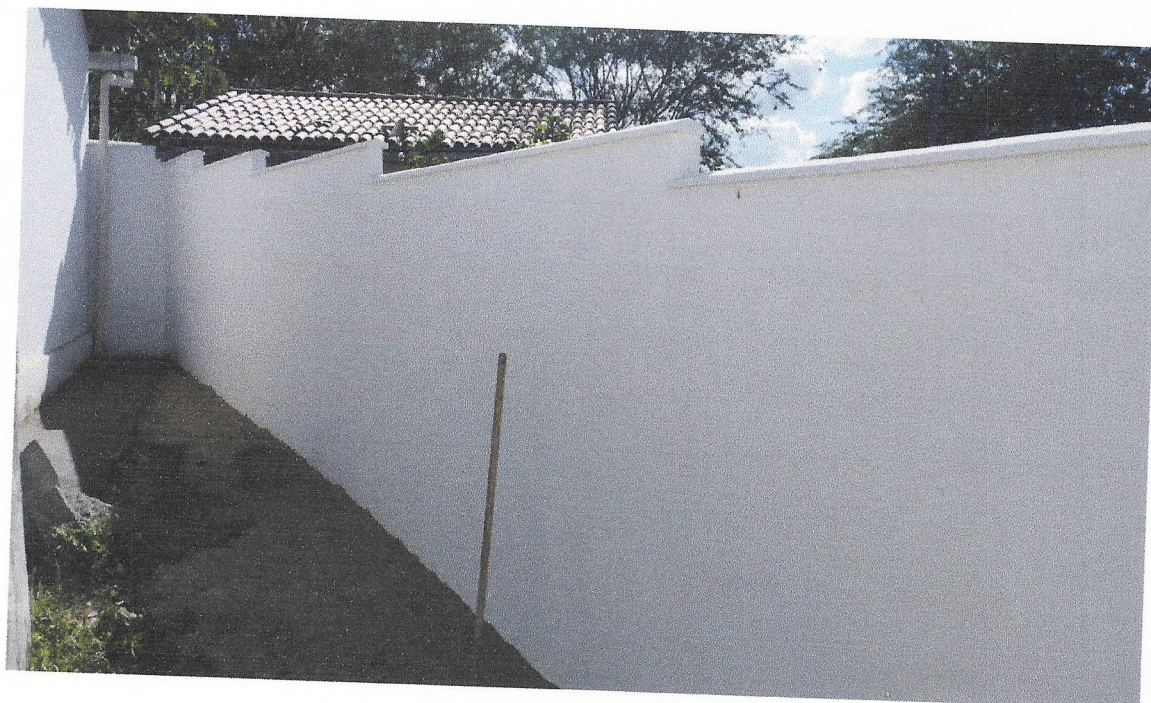


FOTO 02 EXECUÇÃO DE PINTURA EXTERNA

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

13.200.059/0001-75
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8



FOTO 03 EXECUÇÃO DE PINTURA EXTERNA



FOTO 04 EXECUÇÃO DE PASSEIO

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



FOTO 05 EXECUÇÃO DE PASSEIO



FOTO 06 EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.085.677.8

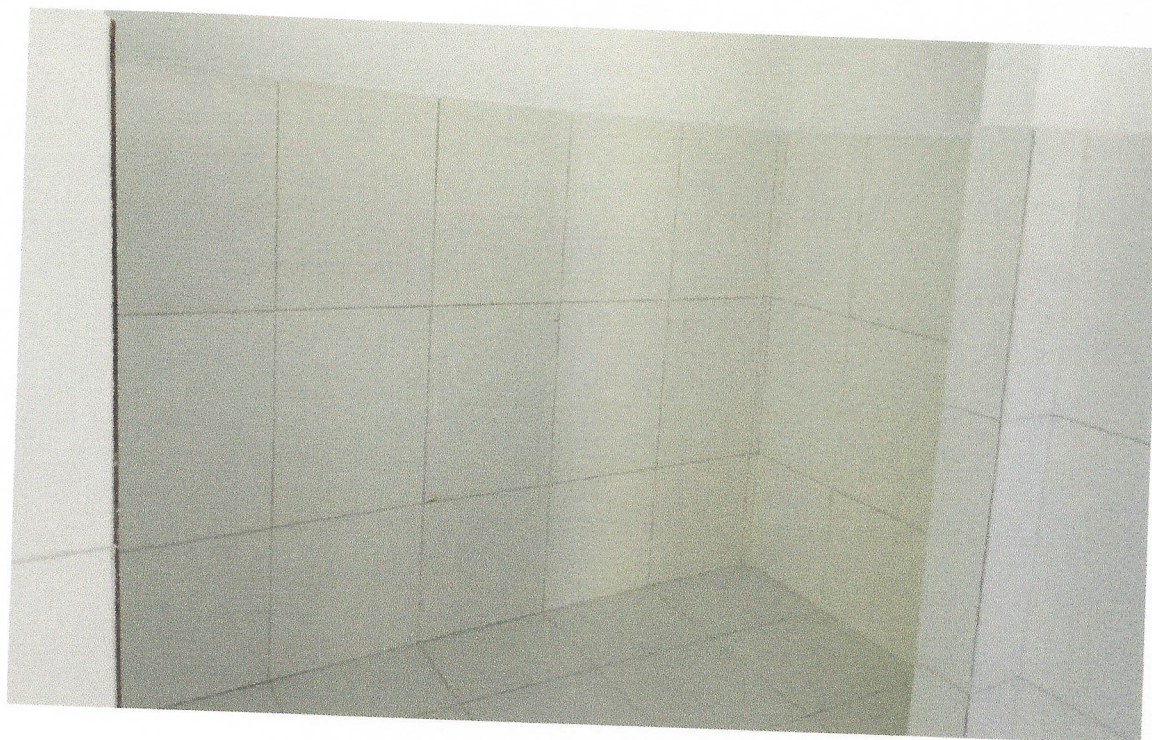


FOTO 07 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO



FOTO 08 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL - SANITARISTA E AMBIENTAL

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



FOTO 09 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM MADEIRA EM CIMA DOS BANCOS



FOTO 10 LIMPEZA FINAL DA OBRA



FOTO 11 LIMPEZA FINAL DE OBRA



FOTO 12 PINTURA EXTERNA



FOTO 13 COLOCAÇÃO DE GRAMA



FOTO 14 COLOCAÇÃO DE GRAMA



FOTO 15 instalação de refletor nos canteiros



FOTO 16 EXECUÇÃO DE JARDINAGEM NA FRENTE DA ESCOLA

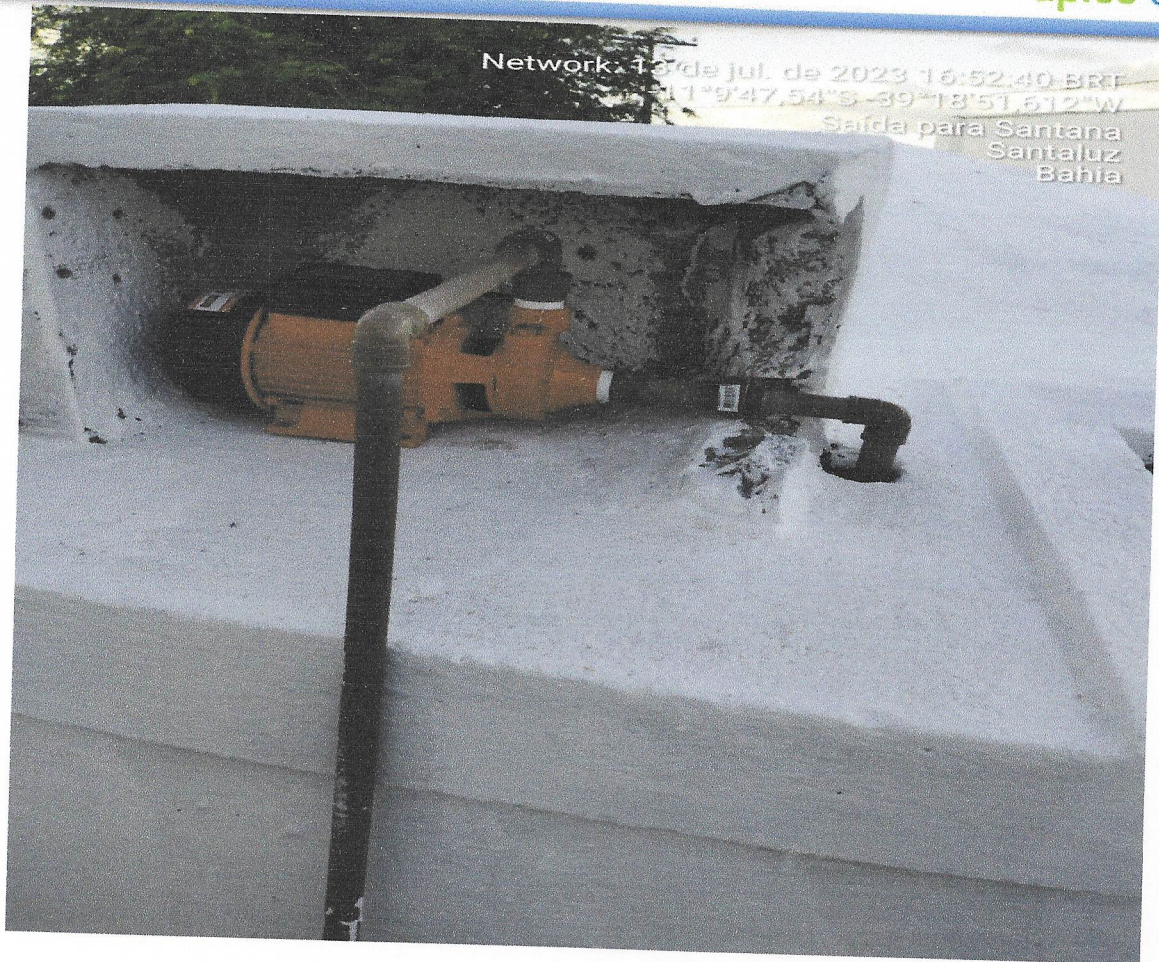


FOTO 17 INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA RESERVATORIO DE AGUA

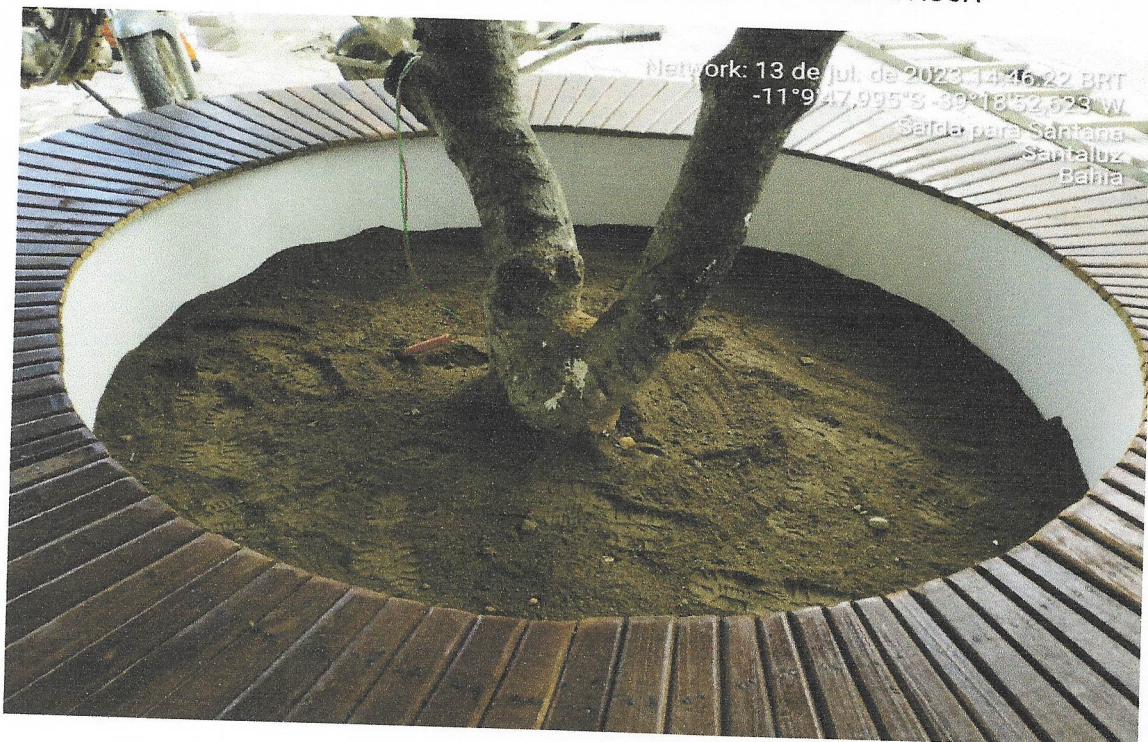


FOTO 18 COLOCAÇÃO DE TERRA VEGETAL PARA PLANTAÇÃO DE GRAMA

RELATORIO FOTOGRAFICO



ápice engenharia



FOTO 19 COLOCAÇÃO DE TERRA VEGETAL PARA PLANTAÇÃO DE GRAMA

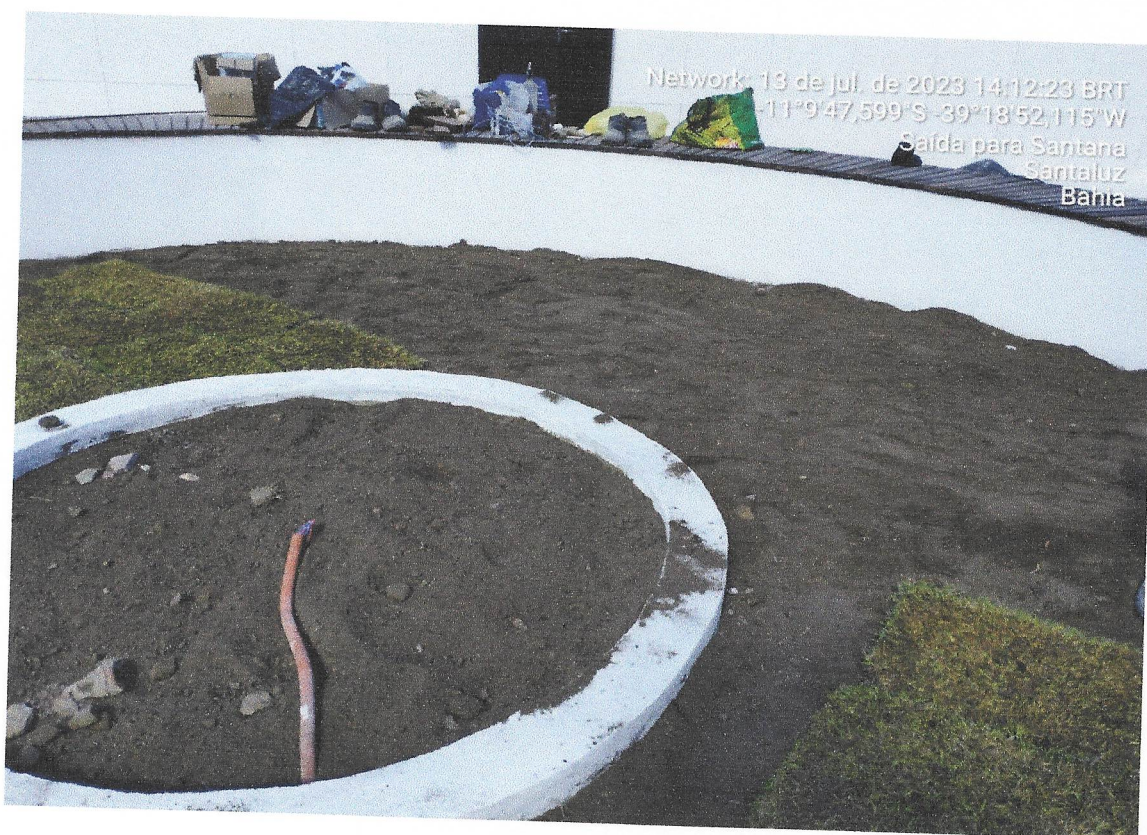


FOTO 20 COLOCAÇÃO DE TERRA VEGETAL PARA PLANTAÇÃO DE GRAMA

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

13.200.059/0001-75

ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

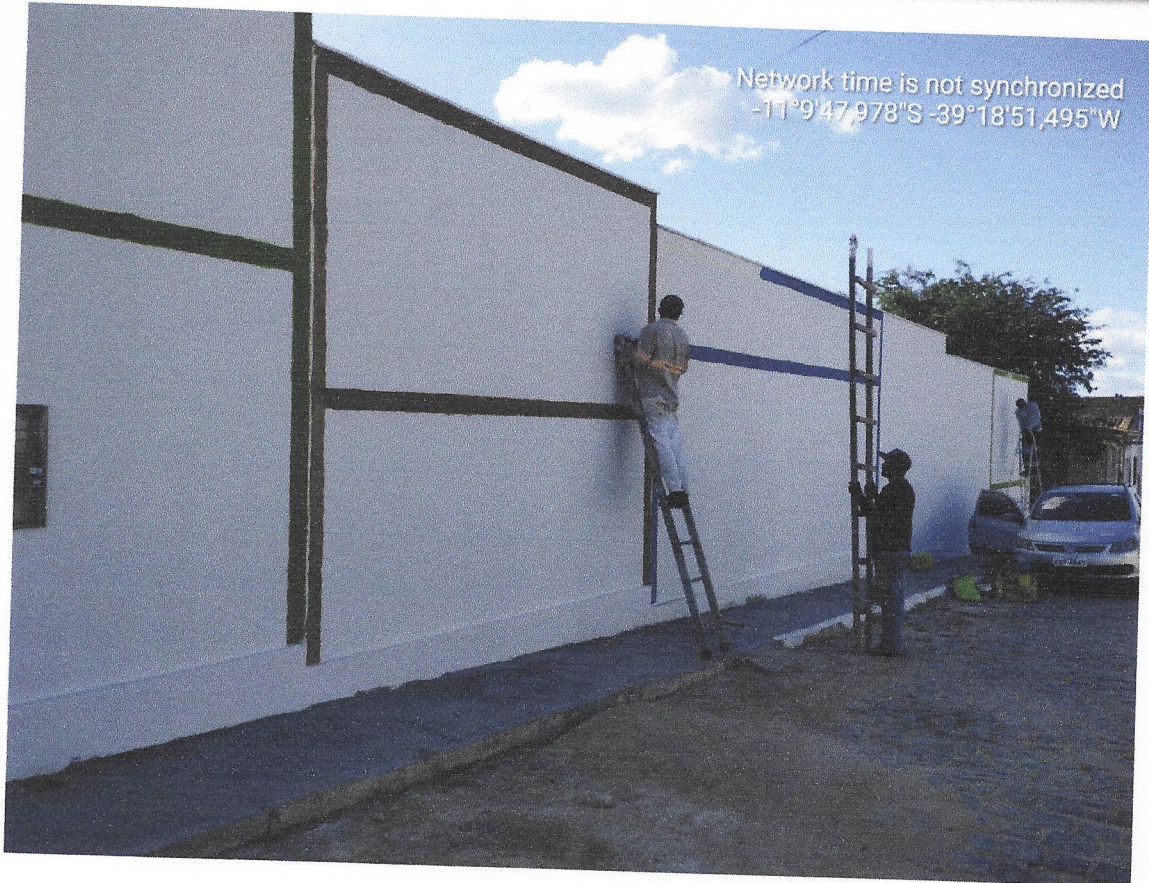


FOTO 21 PINTURA DE FAIXADA LATERAL



FOTO 22 PINTURA DE FAIXADA LATERAL

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA
RUA LOMANTO JUNIOR, 6º TRAVESSA, N. 658

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.877.8

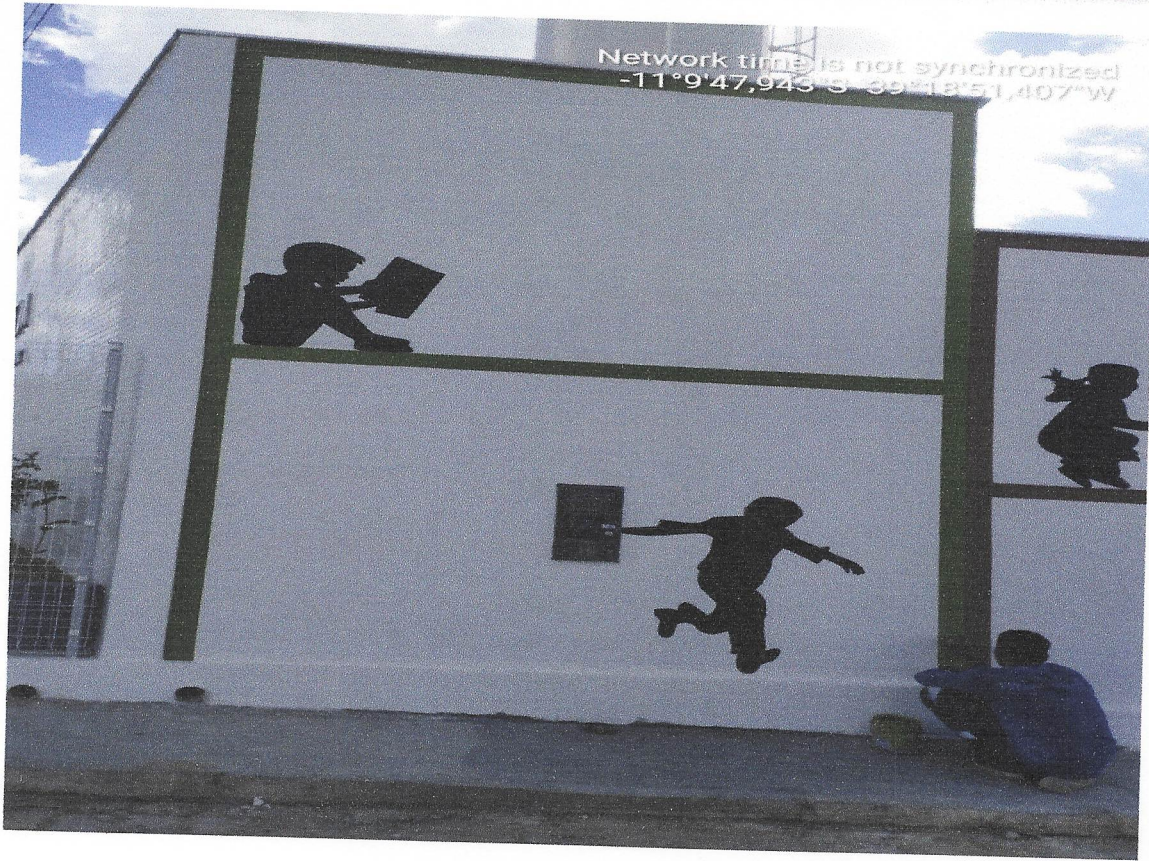


FOTO 23 EXECUÇÃO DE ARTE NA PINTURA DO MURO EXTERNO



FOTO 24 PINTURA EXECUÇÃO DE ARTE NA PINTURA DO MURO EXTERNO

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 8ª TRAVESSA, Nº 650

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.066.677.8



FOTO 25 PINTURA EXECUÇÃO DE ARTE NA PINTURA DO MURO EXTERNO

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL - SANITARISTA E AMBIENTAL

13.200.659/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 303

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**
 CONTRATO: 223/2022
 INÍCIO: 02/08/2022
 PRAZO: 4 MESES
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 52230/D BA
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
22/06/2023



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE MURETA EM BAIXO DO GRADIL
- 3) PAUSA NA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4)
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DO REBOCO DO FUNDO DA ESCOLA
- 7) PAUSA DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75

ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

CONTRATADA


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.089.677.8

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 304

OBRA: **execução de obra na reforma e
ampliação da Escola Senhor do
Bonfim**
ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no
município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
23/06/2023



MANHÃ	X
TARDE	X
NOITE	X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) INICIO DO ASSENTAMENTO DO MEIO FIO PARA EXECUÇÃO DE ÁSSEIO
- 3) PAUSA NA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4)
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DO REBOCO DO FUNDO DA ESCOLA
- 7) PAUSA DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS


- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS
13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

CONTRATADA


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 305

OBRA: execução de obra na reforma e
ampliação da Escola Senhor do
Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no
município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO:MATEUS MOURA AGUIAR
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA:52230/D BA
PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
24/06/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHO

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 306

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 25/06/2023



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHOU

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA

Tony Félix Andrade
Tony Félix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.089.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 306

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 26/06/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO MEIO FIO PARA EXECUÇÃO DE ÁSSEIO
- 3) PAUSA NA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4)
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DO REBOCO DO FUNDO DA ESCOLA
- 7) PAUSA DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)


OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677,8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 306

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA:	27/06/2023						
MANHÃ	X						
TARDE	X						
NOITE	X						

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO MEIO FIO PARA EXECUÇÃO DE ÁSSEIO
- 3) PAUSA NA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4)
- 5)
- 6) CONTINUAÇÃO DO REBOCO DO FUNDO DA ESCOLA
- 7) PAUSA DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JÚNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 308

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 28/06/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- FINALIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO MEIO FIO PARA EXECUÇÃO DE ÁSSEIO
- PAUSA NA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
-
-
- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DO FUNDO DA ESCOLA
- PAUSA DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA





Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 309

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 29/06/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) INICIO DA EXECUÇÃO DO PASSEIO
- 3) PAUSA NA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4)
- 5)
- 6) FINALIZAÇÃO DO REBOCO DO FUNDO DA ESCOLA
- 7) PAUSA DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL E SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 310

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 30/06/2023



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PASSEIO
- 3) PAUSA NA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS E ARESTAMENTOS
- 5)
- 6)
- 7) PAUSA DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8





CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 311

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 01/07/2023    

MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHO

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 61 TRAVESSA, N° 650
CONTRATADA

Tony Félix Andrade
Engenheiro C^o. II
CREA-BA: 052.065.677.8




CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 312

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 02/07/2023    

MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS
13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 8ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 313

OBRA: execução de obra na reforma e
ampliação da Escola Senhor do
Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no
município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
03/07/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PASSEIO
- 3) PAUSA NA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS E ARESTAMENTOS
- 5) INICIO DO ASSENTAMENTO DO MADEIRAMENTO DOS BANCOS
- 6)
- 7) PAUSA DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JÚNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8





CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 315

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 04/07/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PASSEIO
- 3) PAUSA NA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS E ARESTAMENTOS
- 5) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO MADEIRAMENTO DOS BANCOS
- 6)
- 7) PAUSA DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)


OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA


 Tony Felix Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.068.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 316

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
05/07/2023



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PASSEIO
- 3) PAUSA NA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS E ARESTAMENTOS
- 5) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO MADEIRAMENTO DOS BANCOS
- 6)
- 7) PAUSA DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 317

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA
 CONTRATO: 223/2022
 INÍCIO: 02/08/2022
 PRAZO: 4 MESES
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 52230/D BA
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
06/07/2023



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PASSEIO
- 3) PAUSA NA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS E ARESTAMENTOS
- 5) FINALIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO MADEIRAMENTO DOS BANCOS
- 6)
- 7) PAUSA DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.065.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 318

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
07/07/2023



MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PASSEIO
- INICIO DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS E ARESTAMENTOS
- FINALIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO MADEIRAMENTO DOS BANCOS
-
- INICIO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 8ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000.377.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 319

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim

CONTRATO: 223/2022

RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR

INÍCIO: 02/08/2022

CREA-BA: 52230/D BA

ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

PRAZO: 4 MESES

Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 08/07/2023



MANHÃ X

TARDE X

NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHOU

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 51 TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.000.177.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 320

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
09/07/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHOU

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.000.077.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 321

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 10/07/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PASSEIO
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS E ARESTAMENTOS
- FINALIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO MADEIRAMENTO DOS BANCOS
-
- INICIO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 322

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 11/07/2023



MANHÃ X

TARDE X

NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2)
- 3) PAUSA DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS E ARESTAMENTOS
- 5)
- 6)
- 7) INICIO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA

Tony Frick Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.038.677.8
 CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)





Nº 323

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022
 INÍCIO: 02/08/2022
 PRAZO: 4 MESES

RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 52230/D BA
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 12/07/2023

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2)
- 3) FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS E ARESTAMENTOS
- 5)
- 6)
- 7) FINALIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro
 CREA-BA: 052.017.778
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 324

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA
PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA:				
13/07/2023				
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FINALIZAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA
- 2)
- 3) FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- 4) FINALIZAÇÃO DE ACABAMENTOS E ARESTAMENTOS
- 5) INICIO DA LIMPEZA FINAL DA OBRA
- 6) INICIO DA EXECUÇÃO DO PAISAGISMO
- 7) FINALIZAÇÃO DA ARTE DA PINTURA DO MURO EXTERNO
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Aguiar de
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.038/277.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 325

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 14/07/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- ENTREGA DA OBRA AO MUNICIPIO
-
-
-
- FINALIZAÇÃO DA LIMPEZA FINAL DA OBRA
- FINALIZAÇÃO DO PAISAGISMO
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL - SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Almeida
Engenheiro
CREA-BA: 052.000.177.8
CONTRATANTE

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	CNPJ	13.200.059/0001-75
Período apuração	06/2023	Número do Recibo	50000144516740
Data/Hora da Transmissão	03/07/2023 14:55:48	Identificação da Apuração de Débitos	53676373 / Reinf CP 20523481755 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMANTO JUNIOR, 6 TRAVESSA	Número	650
Complemento	TERREOSALA 01	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	Santaluz	UF	BA
CEP	48880000	Telefone	7532652278
Correio Eletrônico	DOCUMENTACAO@CONTABILPEDREIRA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ALISSON DE OLIVEIRA PEDREIRA	CPF	81617445568
Telefone	99977059		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	MICHEL SILVA PEDREIRA		
CPF	99295059549	CRC	-
UF	-	Telefone	7532652278
Correio Eletrônico	documentacao@contabilpedreira.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.844,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.844,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	737,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 737,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.106,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.106,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	147,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 147,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	442,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 442,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.106,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.106,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	14.752,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14.752,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	528,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 528,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	5.863,35		
Deduções	Salário Família: 717,84 Retenção Lei 9711/98: 5.145,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	290,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 290,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	92,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 92,06		
Saldo a Pagar	0,00		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.200.059/0001-75
Nome	APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período de apuração	06/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	53676373 / Reinf CP 20523481755 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 6.153,75	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 16.387,12	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 4.278,26	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 92,06	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 26.911,19	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ALISSON DE OLIVEIRA PEDREIRA
CPF	816.174.455-68
Telefone	9997-7059

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	03/07/2023 14:55:48
Nº do recibo de entrega	0000050000144516740

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	CNPJ	13.200.059/0001-75
Período de Apuração	06/2023	Número do Recibo	0000050000144516740
Data/Hora da Transmissão	03/07/2023 14:55:48	Identificação da Apuração de Débitos	53676373 / Reinf CP 20523481755 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	39.538,45	26.193,35	13.345,10
Salário Família	717,84	717,84	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000593 010701792300 707678050815 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
 INSCRIÇÃO: DEPÓSITO

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	DATA	DEPÓSITO
JUDICAEEL ARAUJO BARBOSA	800,80	660,00	154.45880.36-6	21/09/2021	01	15/06/2023	J	05142
ANTONIO DE OLIVEIRA DULTRA	1.584,00	0,00	161.13216.58-7	21/09/2021	01	116,86		0,00
ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.584,00	0,00	124.60439.22-0	21/09/2021	01	124,38		05142
AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA ASSIS	2.150,93	0,00	160.09036.93-4	01/06/2023	01	124,38		0,00
BRUNO BISPO DE SOUZA	1.584,00	0,00	160.10763.70-4	15/05/2023	01	175,40		07825
CARLOS DOS SANTOS FERREIRA	1.848,00	0,00	162.36819.57-3	21/09/2021	01	124,38		0,00
CARLOS JOILSON MENDES DA SILVA	1.478,40	0,00	129.22905.08-1	21/09/2021	01	148,14		05142
CLAUDIONOR FERREIRA DA CRUZ	1.584,00	0,00	130.28332.06-9	02/05/2022	01	114,87		0,00
CRISTIANO SILVA PAMPONET	3.000,00	0,00	190.11693.84-4	21/09/2021	01	124,38		05142
DIOGO DE JESUS DE OLIVEIRA	2.079,23	0,00	161.13236.89-8	01/02/2022	01	268,99		0,00
ED CARLOS BASTOS DE OLIVEIRA	1.584,00	0,00	161.13239.44-7	21/09/2021	01	168,95		07825
EDISON RIBEIRO SANTANA	1.786,40	0,00	127.46172.07-2	21/09/2021	01	124,38		0,00
ELDER RIOS DE OLIVEIRA	1.584,00	0,00	161.35588.18-5	15/05/2023	01	142,59		05142
ELTON SOUSA DA SILVA	2.229,58	0,00	203.44466.43-9	11/10/2022	01	124,38		05142
EVITIAO DOS SANTOS DE ALMEIDA	2.155,26	0,00	162.63770.97-0	11/10/2022	01	182,48		07152
		0,00	0,00	175,79		178,36		07152
						172,42		0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000593 010701792300 707678050815 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM
MARCELO DE JESUS LIMA	1.900,80	0,00	129.04766.04-0	0,00	21/09/2021	01					05142
MILTON SANTOS DA SILVA	1.584,00	0,00	123.66817.75-6	0,00	21/09/2021	01				152,06	0,00
NORMEIDE SANTOS BRANDAO	1.900,80	0,00	141.29381.27-6	0,00	21/09/2021	01				126,73	0,00
OFLANDO CARDOSO DA SILVA	2.006,40	0,00	236.09975.43-8	0,00	21/09/2021	01				152,06	0,00
PAULO CESAR ANDRADE RIBEIRO	2.006,40	0,00	165.86237.38-7	0,00	21/09/2021	01				160,51	0,00
RAFAEL DE JESUS LIMA	1.584,00	0,00	165.89642.59-2	0,00	15/05/2023	01				160,51	0,00
RAMALHO LIMA DA SILVA	1.900,80	0,00	165.86260.90-7	0,00	21/09/2021	01				126,72	0,00
SILVIO CONCEICAO NEPOMOCENO	1.478,40	0,00	136.36205.27-6	0,00	21/09/2021	01				152,06	0,00
VALDIR PEREIRA DOS SANTOS	1.584,00	0,00	123.88531.86-3	0,00	21/09/2021	01				118,27	0,00
VALMIR DE ASSIS SILVA	1.848,00	0,00	125.55182.42-1	0,00	04/10/2021	01				126,73	0,00
VALNEIDSON ARAUJO PEREIRA MATOS	1.786,40	0,00	165.35752.65-9	0,00	21/09/2021	01				147,85	0,00
					142,59					142,91	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000593 010701792300 707678050815 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	COMP: 06/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75		
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50		
INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTADO: 1,50									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ALISSON DE OLIVEIRA PEDREIRA	2.640,00	0,00	190.10639,77-3	0,00	23/05/2012	11				02521
					290,40					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
75.743,39

660,00

6.227,19

5.901,07

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000593 010701792300 707678050815 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA N° DE CONTROLE: AAeR0KpVLzS0000-0 N° ARQUIVO: Fx8n8cNzBXC0000-6
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
LOGRADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TRAVESSA 650 TERREOSALA 01 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8129000
CIDADE: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880-000 CNAE: 8129000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	41	73.103,39	660,00	73.103,39	660,00
11	1	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
TOTAIS:	42	75.743,39	660,00	75.743,39	660,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000593 010701792300 707678050815 320005900011

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
N° DE CONTROLE: AAeR0KpYLzS0000-0

N° ARQUIVO: Ex8n8cNzBXC0000-6
INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TRAVESSA 650 TERREOSALA 01
CIDADE: SANTALUZ

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREFONDERANTE 8129000
CNAE: 8129000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

73.103,39
660,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

41

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS

5.901,07

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.901,07

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA N° DE CONTROLE: Aaer0KpVlz50000-0 N° ARQUIVO: Fx8n8cNzBXC0000-6
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS:2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TRAVESSA 650 TERREOSALA 01 UF: BA CEP: 48880-000 TELEFONE: 0071 3489 3937 CNAE PREPONDERANTE: 8129000
CIDADE: SANTALUZ CNAE: 8129000
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 26.174,74 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.227,19
SALÁRIO FAMÍLIA: 717,84 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0
