

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO – REFORMA DE POSTO DE SAÚDE DO LIMEIRA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma de posto de saúde do limeira no município de santaluz/bahia.



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Foto 01 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021



Franklin da J. Sêna
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Foto 02 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma de posto de saúde do limeira no município de santaluz/bahia.



Foto 03 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014



Foto 04 – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Francilin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008319-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma de posto de saúde do limeira no município de santaluz/bahia.

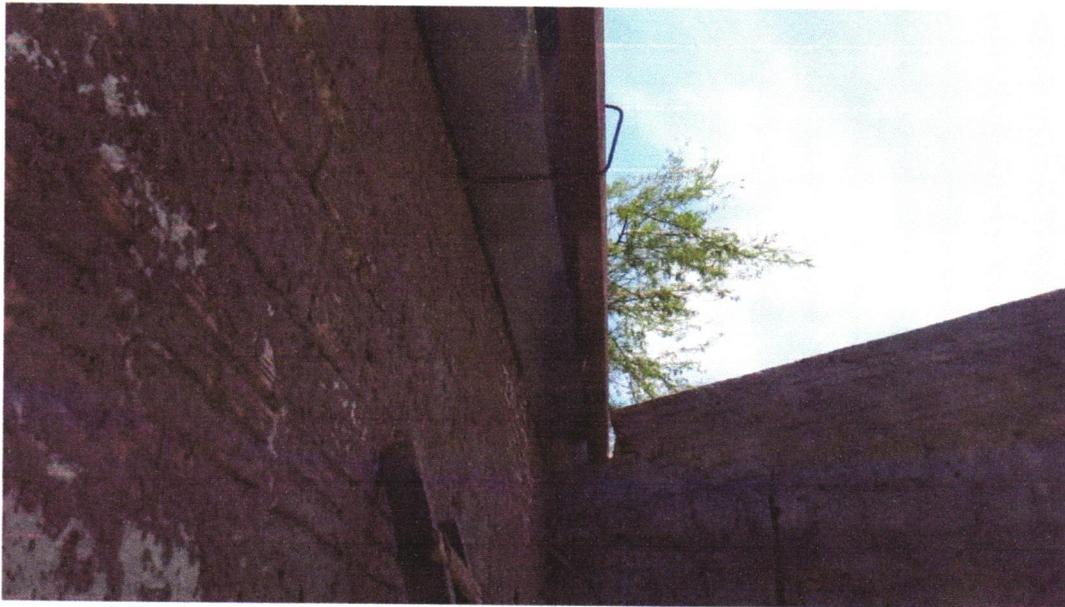


Foto 05- CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019




Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 Crea 052008919-7


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2

Foto 06 - Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo

DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma de posto de saúde do limeira no municipio de santaluz/bahia.

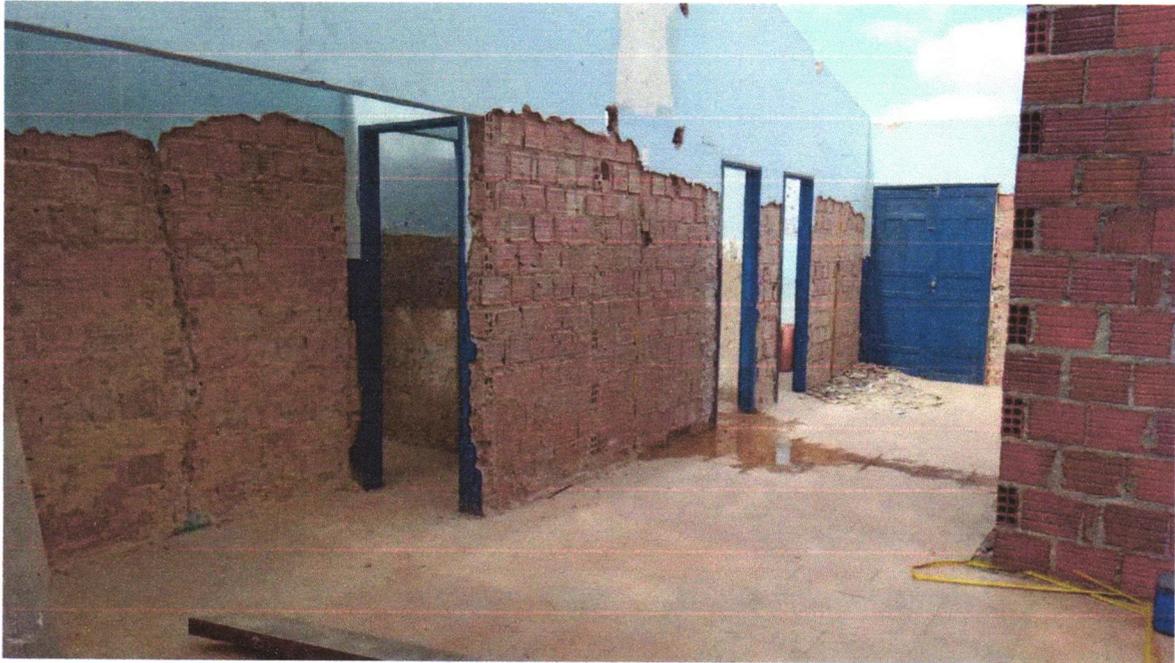


Foto 07 - Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017



Frederico de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052003919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2

Foto 08 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma de posto de saúde do limeira no município de santaluz/bahia.



Foto 09 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016


Francisco de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052603919-7

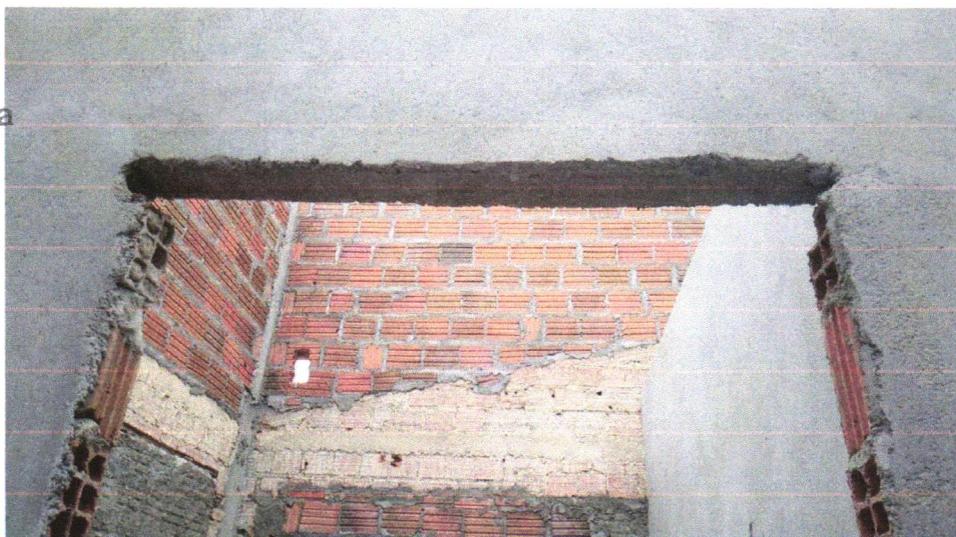


Foto 10 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 051888554-2

DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma de posto de saúde do limeira no município de santaluz/bahia.



Foto 11 - Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017



Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052608919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Foto 12 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/01/2024	Santaluz	Reforma de posto de saúde do limeira no município de santaluz/bahia.



Foto 13 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017


Franklin de J. Serrão
Engenheiro Civil
Crea 052008919-7

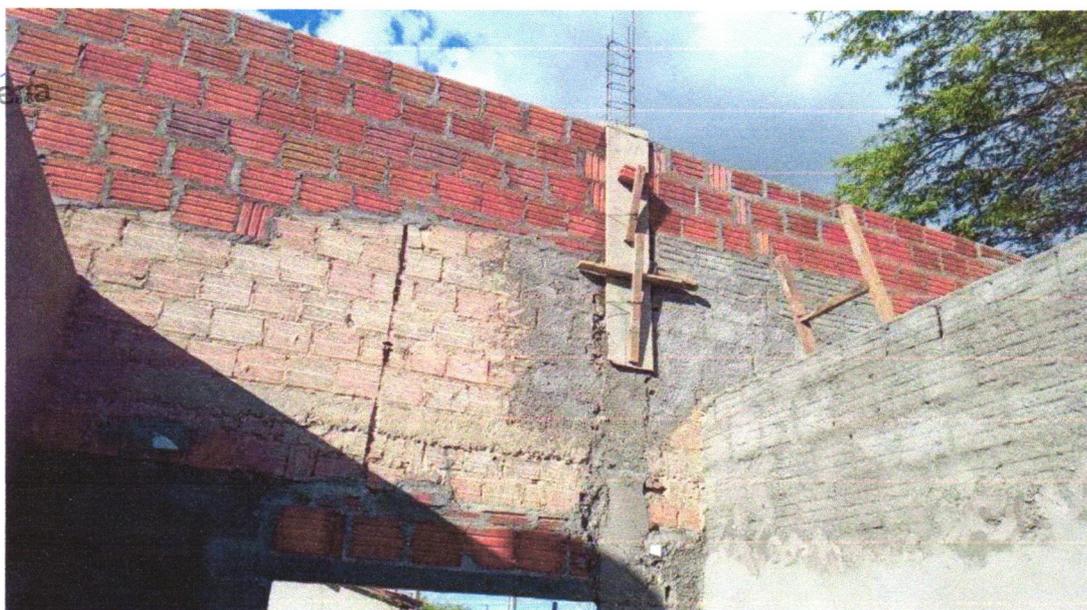


Foto 14 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA+ 051888554-2
