

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 5ª MEDIÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA – LIMEIRA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reparação e Adaptação da Paça da Limeira



FOTO 01 – GRAMA ESMERALDO EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM



FOTO 02 – BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO EM EUCALIPITO TRATADO E FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPITO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 09141V303-3



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reparação e Adaptação da Paça da Limeira



FOTO 03 - Planta - Palmeira Imperial h=4,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio)

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA



FOTO 04 - Fornecimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (L=2,5, H= 1,30)M

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reparação e Adaptação da Paça da Limeira



FOTO 05 – Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051419303-3



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Matenas, Serviço de
Manutenção LTDA.



FOTO 06 – Fornecimento e assentamento de Multiexercitador 7x1

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reparação e Adaptação da Paça da Limeira



FOTO 07 – Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço



FOTO 08 – Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado, Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado e Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reparação e Adaptação da Paça da Limeira



Foto 09 - Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina



Foto 10 - Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Reparação e Adaptação da Paça da Limeira

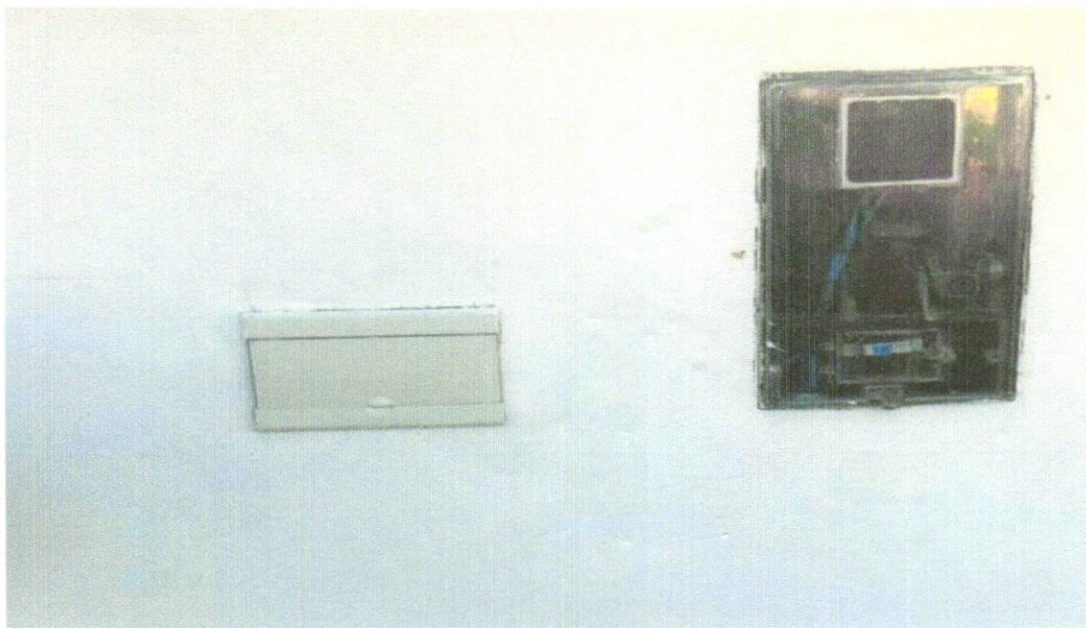


Foto 11 - CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTÁTICAMENTE D=100X60X15 CM e QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA

