

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ª MEDIÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA - POSTO ALGODÕES

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/07/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado do Algodões



FOTO 01 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



Foto 02 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/07/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado do Algodões



Foto 03 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



Foto 04 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2



Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/07/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado do Algodões



Foto 05 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

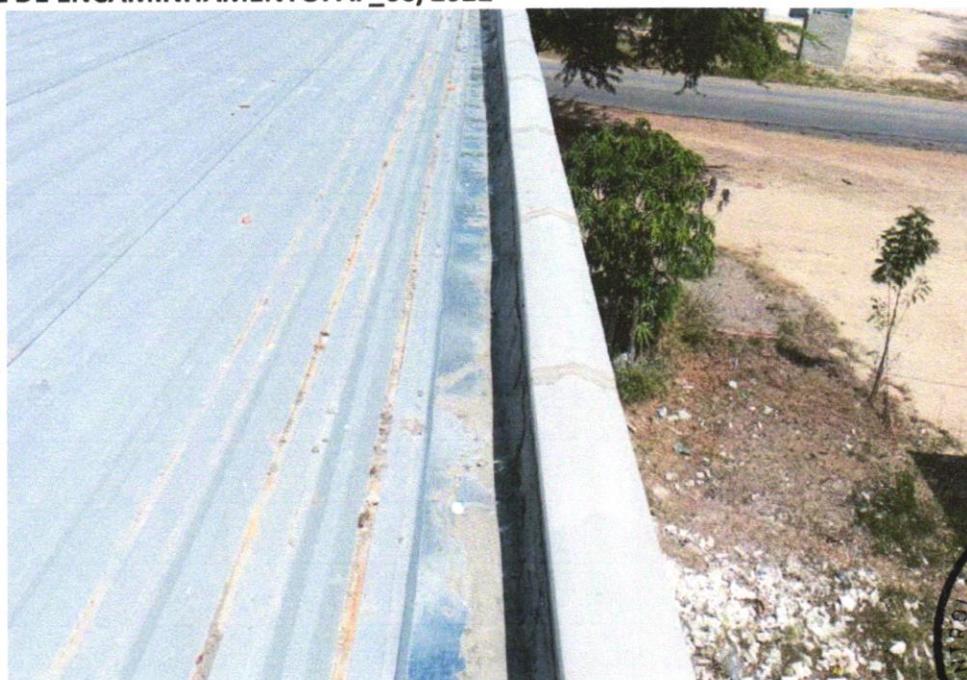


Foto 06 - Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 051888554-2


 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA: 051888554-2



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/07/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado do Algodões



Foto 07 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

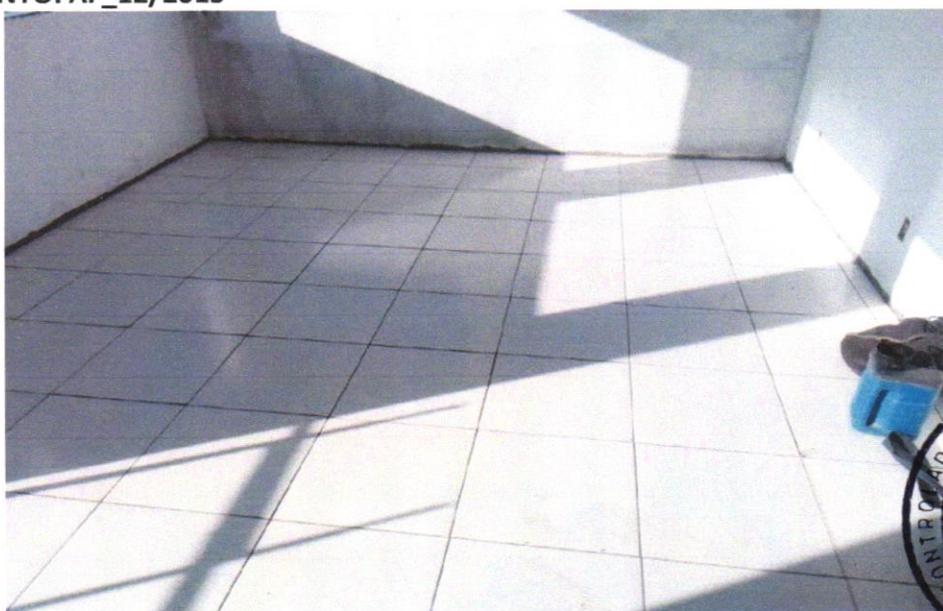


Foto 08 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA nº 051888554-2



Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA nº 051888554-2

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/07/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado do Algodões

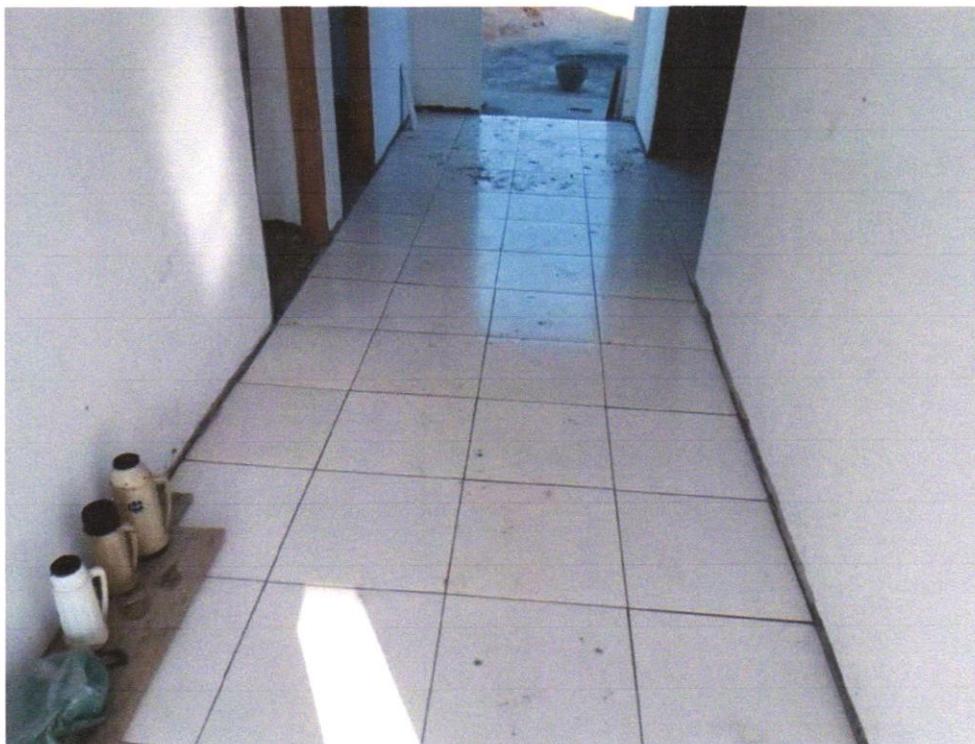


Foto 09 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014



Foto 10 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2




Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/07/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado do Algodões



Foto 11 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

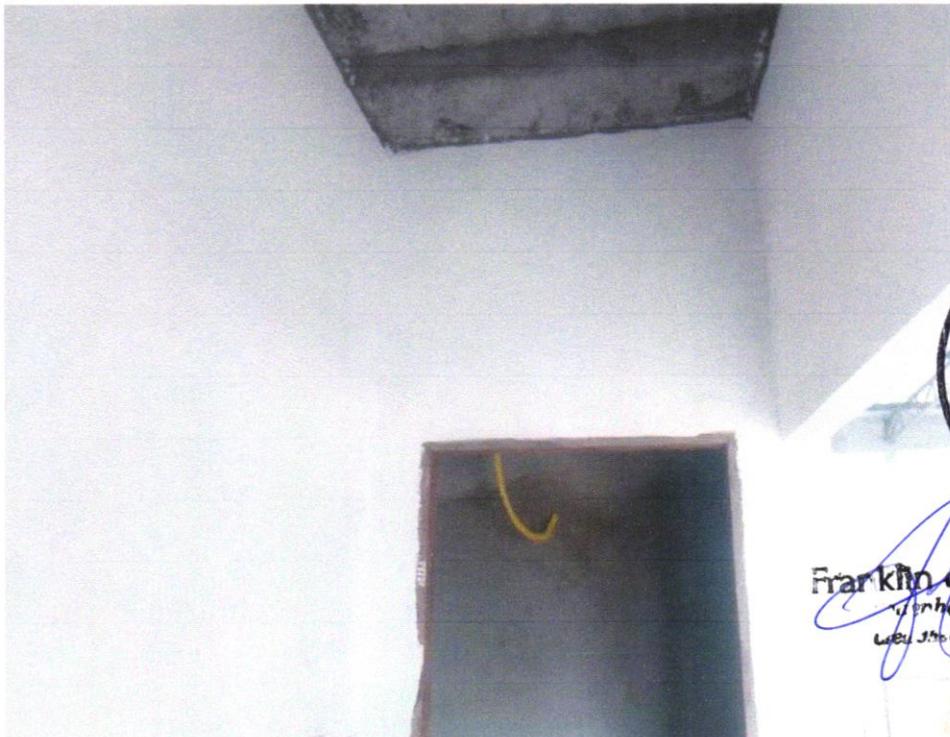

Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA: 05188554-2


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 05188554-2

Foto 12 - Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/07/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado do Algodões



Foto 13 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

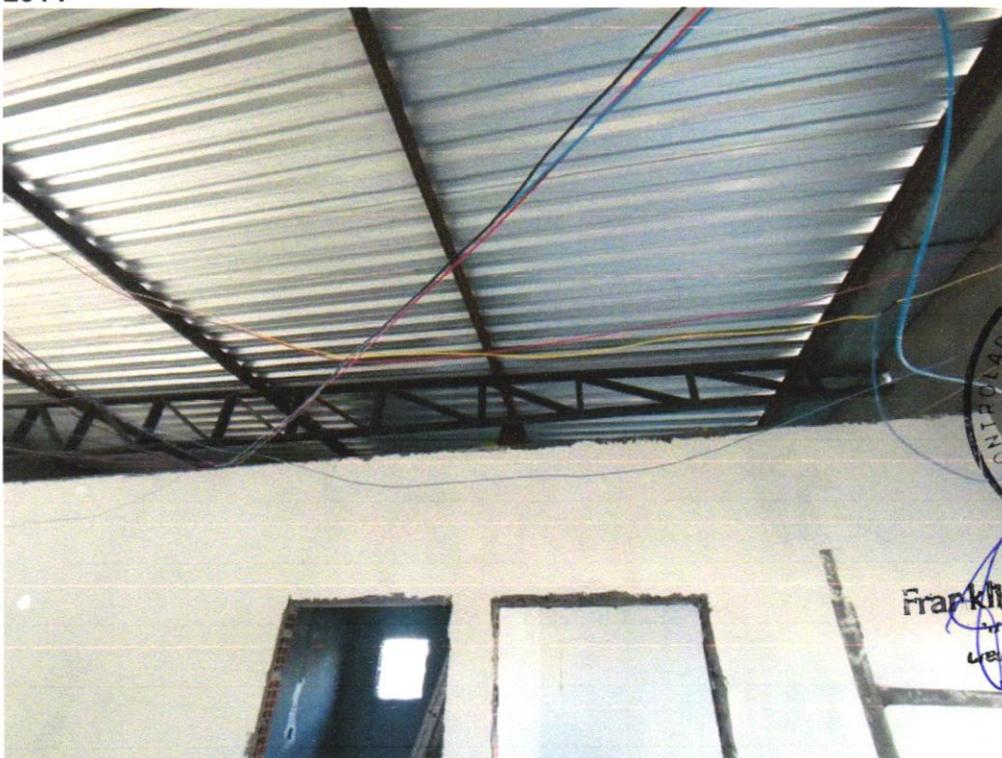


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-2






 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-2

Foto 14 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/07/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado do Algodões



Foto 15 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

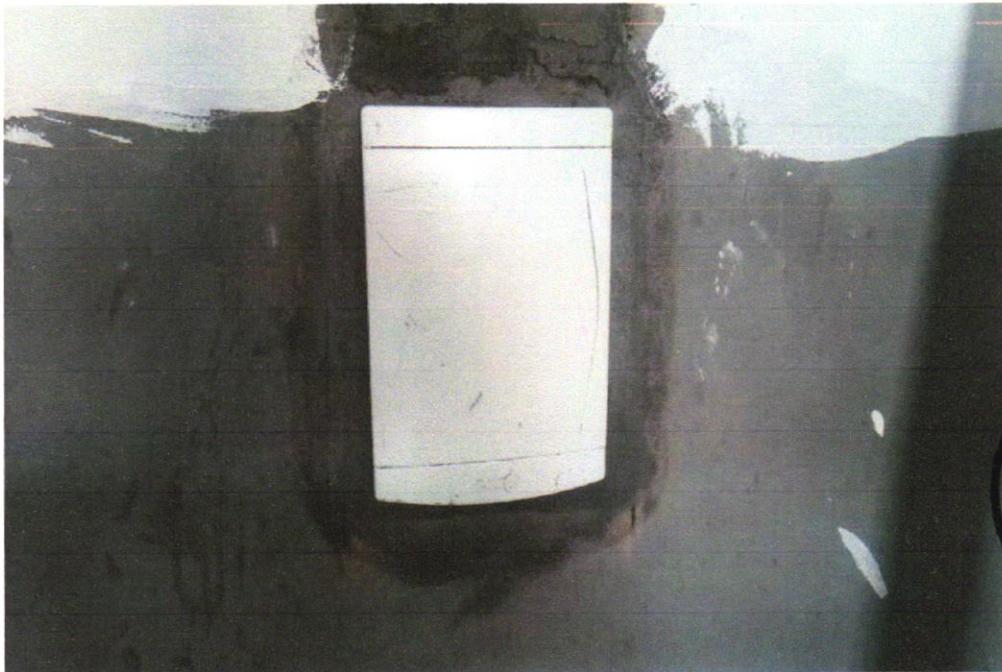


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-2



Foto 16 - Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores


 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-2

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/07/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado do Algodões




Foto 17 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015





 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-2



Foto 18 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021



 Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-2

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/07/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado do Algodões

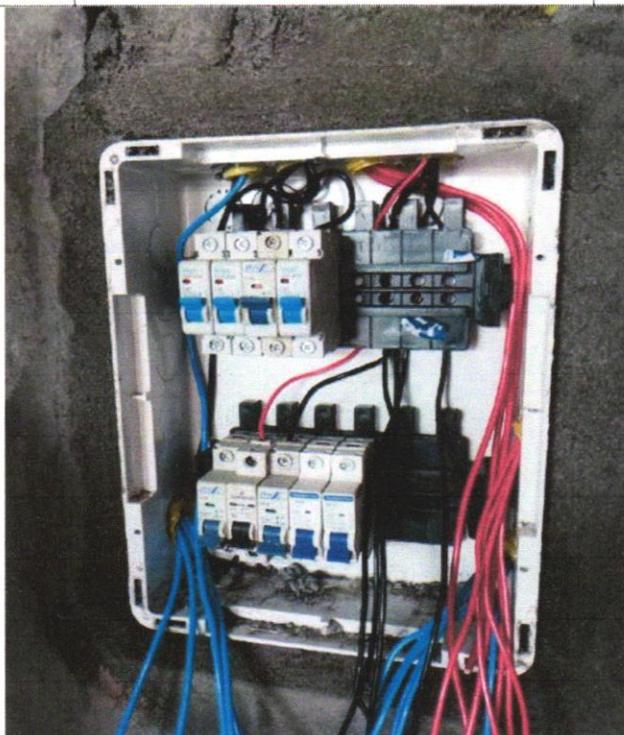

Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 05188554-2

Foto 19 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

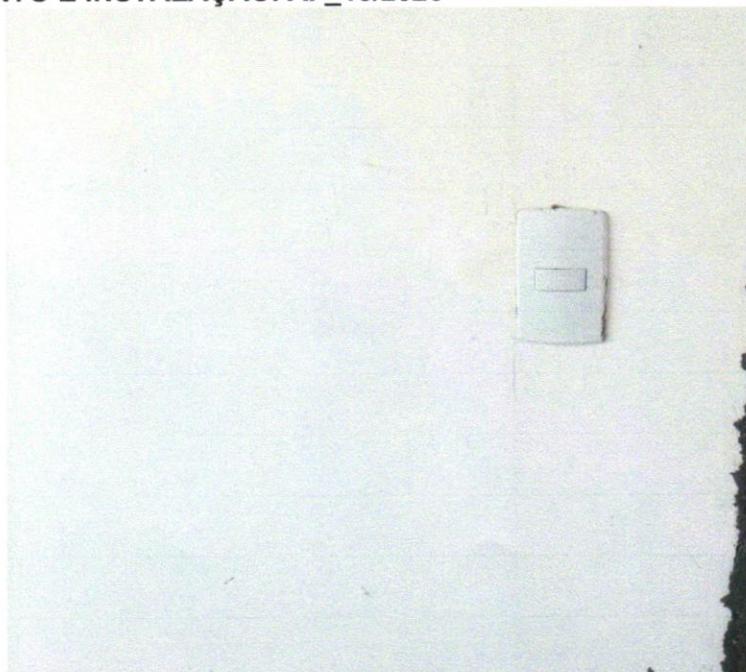

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA+ 05188554-2



Foto 20 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
31/07/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado do Algodões

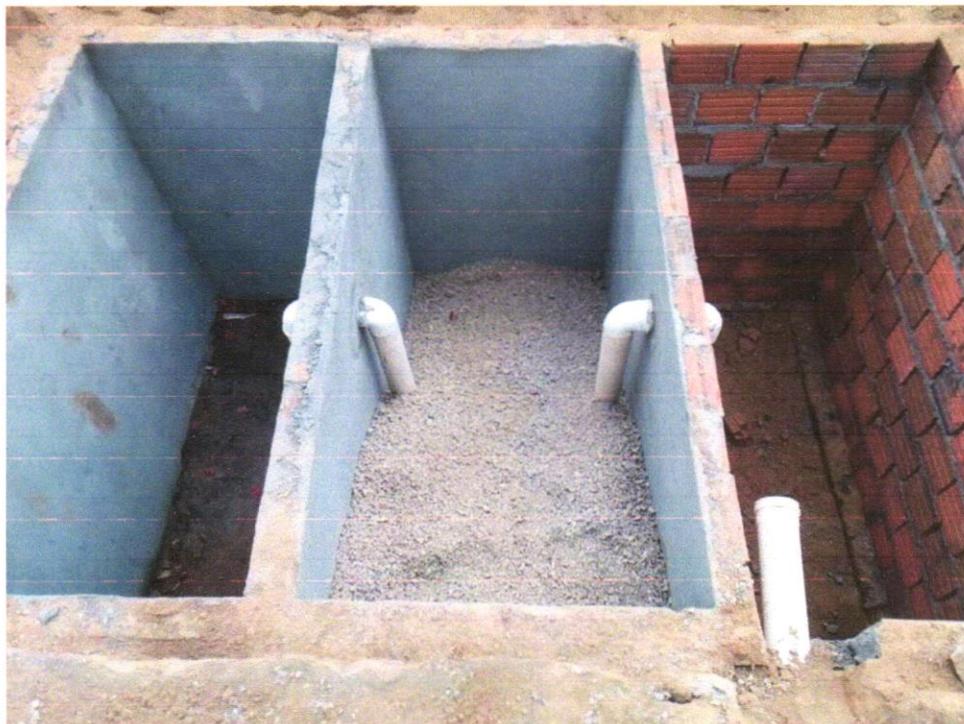


Foto 21 - Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)



Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA 05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 05188554-2



Foto 22 - FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF_12/2020

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/07/2024	Santaluz	Construção do Posto do Povoado do Algodões



Foto 23 - Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,75 x 1,00 x 1,00 m



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA 05041 00000 000-1



Foto 24 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
